

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

03月月會暨第272次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：115 年 03 月 24 日(星期二) 下午 02 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 115 年 3 月 23 日止，使用工期：1159 日曆天(不含免計工期 12 天)，剩餘 720 日曆天(展延工期 29 天)。
- 工程進度截至 115 年 3 月 23 日，預定進度 17.192%，實際進度 35.624%，超前進度：18.432%(約超前 232 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
結構體工程	115/11/20			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 土建工程：3F 南側外牆合模、6F 東側外牆立模、5FL 鋼樑防火被覆噴塗、3F~4F 牆筋及 1F 車道。
 2. 機電工程：B3F 泡沫管路配、2F 空調風/水管配管、B1F 拉線施作、3F 水系統幹管配管。
 3. 安全監測：數據無異常。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。
2. 依 113/09/26 第七次臺中市政府公共藝術審議委員會決議，本案未通過。目前進度：

第五次執行小組會議已於 113/11/14(四)召開，專管單位將依會議決議修正後再行提請院方召開執行小組會議供委員審查。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為 12、13F 塔吊區鋼筋綁紮及 5F~8F 內、外牆牆面鋼筋綁紮及混凝土澆置、西側人行臨時便道施作及第二區人工基樁開挖及地下管路修改，工程進度超前中。
2. 其他：
 - (1) 建照變更：經設計單位說明，本案建照平面圖尚待院方需求確認；另都市設計審議部分，因配合院方其他案件，須一併進行整體檢討。
 - (2) 營養大樓前方雨遮拆除：依施工單位所排定之架空走廊施工作業期程，並依 115/01/05 會勘紀錄辦理，本案須進行營養大樓前方雨遮拆除作業(詳簡報 P.6)，經施工單位說明，預計於 115/04/01 進行圍籬作業並於清明連假期間進行拆除作業，經主席同意。
 - (3) B1F 診間色彩計畫：模擬圖詳後簡報 P.7，討論如下。
 - A. 經主席裁示，外牆配色請使用設計單位建議及使用單位建議二種方案提至院部晨會供院部長官裁決。
 - B. 經提醒，請設計單位調整叫號機大小、桌體仿門診前棟樣式。
 - C. 臨時動議：本案診間叫號機是否由院方自行採購乙案，經醫企部說明院內近期將進行設備費用估算，經主席裁示，待院內完成估算後再行討論。
 - (4) 樓層平面變更：詳後簡報 P.10~P.16，討論如下。
 - A. 經主席裁示，七樓健檢中心請以方案 0(姚顧問同意版本)再行規劃；經設計單位補充，須請使用單位提供完整各空間名稱用途供參。
 - B. 經主席裁示，B1F 請設計單位依簡報 P.15 影像醫學部之需求調整進行修正。
 - C. 經主席裁示，B2F 空間請設計單位將用餐討論室合併並考量影像醫學部及健檢中心使用人數重新檢討空間坪數。
 - (5) 臨時動議：本案變更設計進度及現場施工進度衝突。
 - A. 經施工單位說明，因目前變更設計尚未定案，致設計圖無法提供、施工圖亦無從繪製，連帶影響材料採購及現場工項施作；設計與施工進度未能同步推進，

產生落差，致整體作業無法銜接而陷入中斷。

B. 經主席裁示，請專管單位協助彙整目前尚未定案之處以利檢討後續作為。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

伍、散會(上午 10 時 10 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程


115年3月份工程月會報暨第272次專業技術協調會 會議簽到表

壹、會議時間：115年3月24日(星期二) 下午2時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李副院長 政鴻

肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院			
副院長			
主任秘書			
醫企部	賴銘昌 洪清	醫工部	王聖魁
影像醫學部	陳明至 吳文豪 陳政	健檢中心	楊水信 王雅瑜
工務室	何南訓 張志遠 林明龍 陳熙華 陳明		
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司			
蕭捷柏 陳秋昇 江意萱			
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所			
李之學 廖子奇 楊雅雁			
施工廠商-麗明營造股份有限公司			
蕭明 林志銘 楊雅雁 蘇新厚			

第三醫療大樓新建工程

115年3月月會暨第272次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明

工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.19	目標第一階段開放	115年10月1日
		目標整體完工日期	116年3月19日
使用工期 (截至115.03.23止)	1159日曆天(不含免計工期12天)，剩餘720日曆天(展延工期29天)		
工程進度 (截至115.03.23止)	預計：17.192%	進度差	+18.432% (約超前232天)
	實際：35.624%		
目前工程施作項目	① 土建工程：3F南側外牆合模、6F東側外牆立模、5FL鋼樑防火被覆噴塗、3F～4F牆筋及1F車道 ② 機電工程：B3F泡沫管路配、2F空調風/水管配管、B1F拉線施作、3F水系統幹管配管 ③ 安全監測：數據無異常		



本案三週進度表

業主：臺中榮民總醫院
專案管理：賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造：譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商：麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 網圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 3 ~ 115 / 4																												備註																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		預定進度			上週進度								本週進度								下週進度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	一	二	三	四	五	六	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
一、	地上層裝修及結構工程	開始時間 114/3/27	完成時間 114/11/30	249																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

進度追蹤


事項	辦況說明
建照變更	1. 設計單位已著手準備第四次建照變更相關文件。 2. 第四次建照變更作業資料，院方已用印完成，待施工單位結構體勘驗完成後即可啟動程序。 3. 目前辦況：依衛生局意見需提送差異對照表，預計今日提送；都審部分待平面樓層方案確認後併同修正內容。
部分空間 先行開放	1. 經與都發局詢問後，需先依《建築物部分使用執照核發辦法》第三條第一項第三點：「高度超過三十六公尺或十二層樓以上，或建築面積超過八〇〇〇平方公尺以上之建築物，其中任一樓層至基地地面間各層業經施工完竣。」檢討本案狀況。 2. 院方已於114/03/04發文請示中央機關(內政部國土署)解釋法律定義。 3. 依都發局於114/03/13之公文說明，本案涉及個案事實認定，仍須請建築師依規檢討辦理。 4. 依第221次專技會議，本案將於完成建照變更後依規申請B6F至1F各樓層經施工完竣之部分使用執照。 5. 依第262次專技會議，本案1F以下部分空間開放目標時程延至115年10月1日。 6. 施工單位已於第268次專技會議提報配合部分空間先行開放之工期。
樓層配置 變更	1. 本案樓層配置變更如下： ① 六樓-PAC病房。 ② 七樓改為健檢中心 2. 於今日中午提供需求確認。
手術室 樣品間會勘	1. 已於115/03/18(三) 下午四點半進行3F-4F手術室樣品間會勘，預定於115/03/26(四)下午五點進行研討。

進度追蹤

事項	辦況說明
緊急鈴	1. 依院部晨會紀錄，請參考其他醫院設置經驗，得以電腦系統或無線傳輸等方式避免線路雜亂。 2. 待門診部提供需求確認。
診間門框	1. 依院部晨會紀錄，診間後門門框與診療床隔簾軌道重疊，同意挪移門框10公分。
六樓洗腎區	1. 依院部晨會紀錄，本案六樓原預留洗腎區域應考量相關管路保留以利後續作業。 2. 待院部長官及使用單位商議空間配置。

議題討論-營養大樓前方雨遮拆除

依施工單位所排定之
架空走廊施工作業期
程，並依115/01/05
會勘紀錄辦理，本案
須進行營養大樓前方
雨遮拆除作業。
(如右圖)

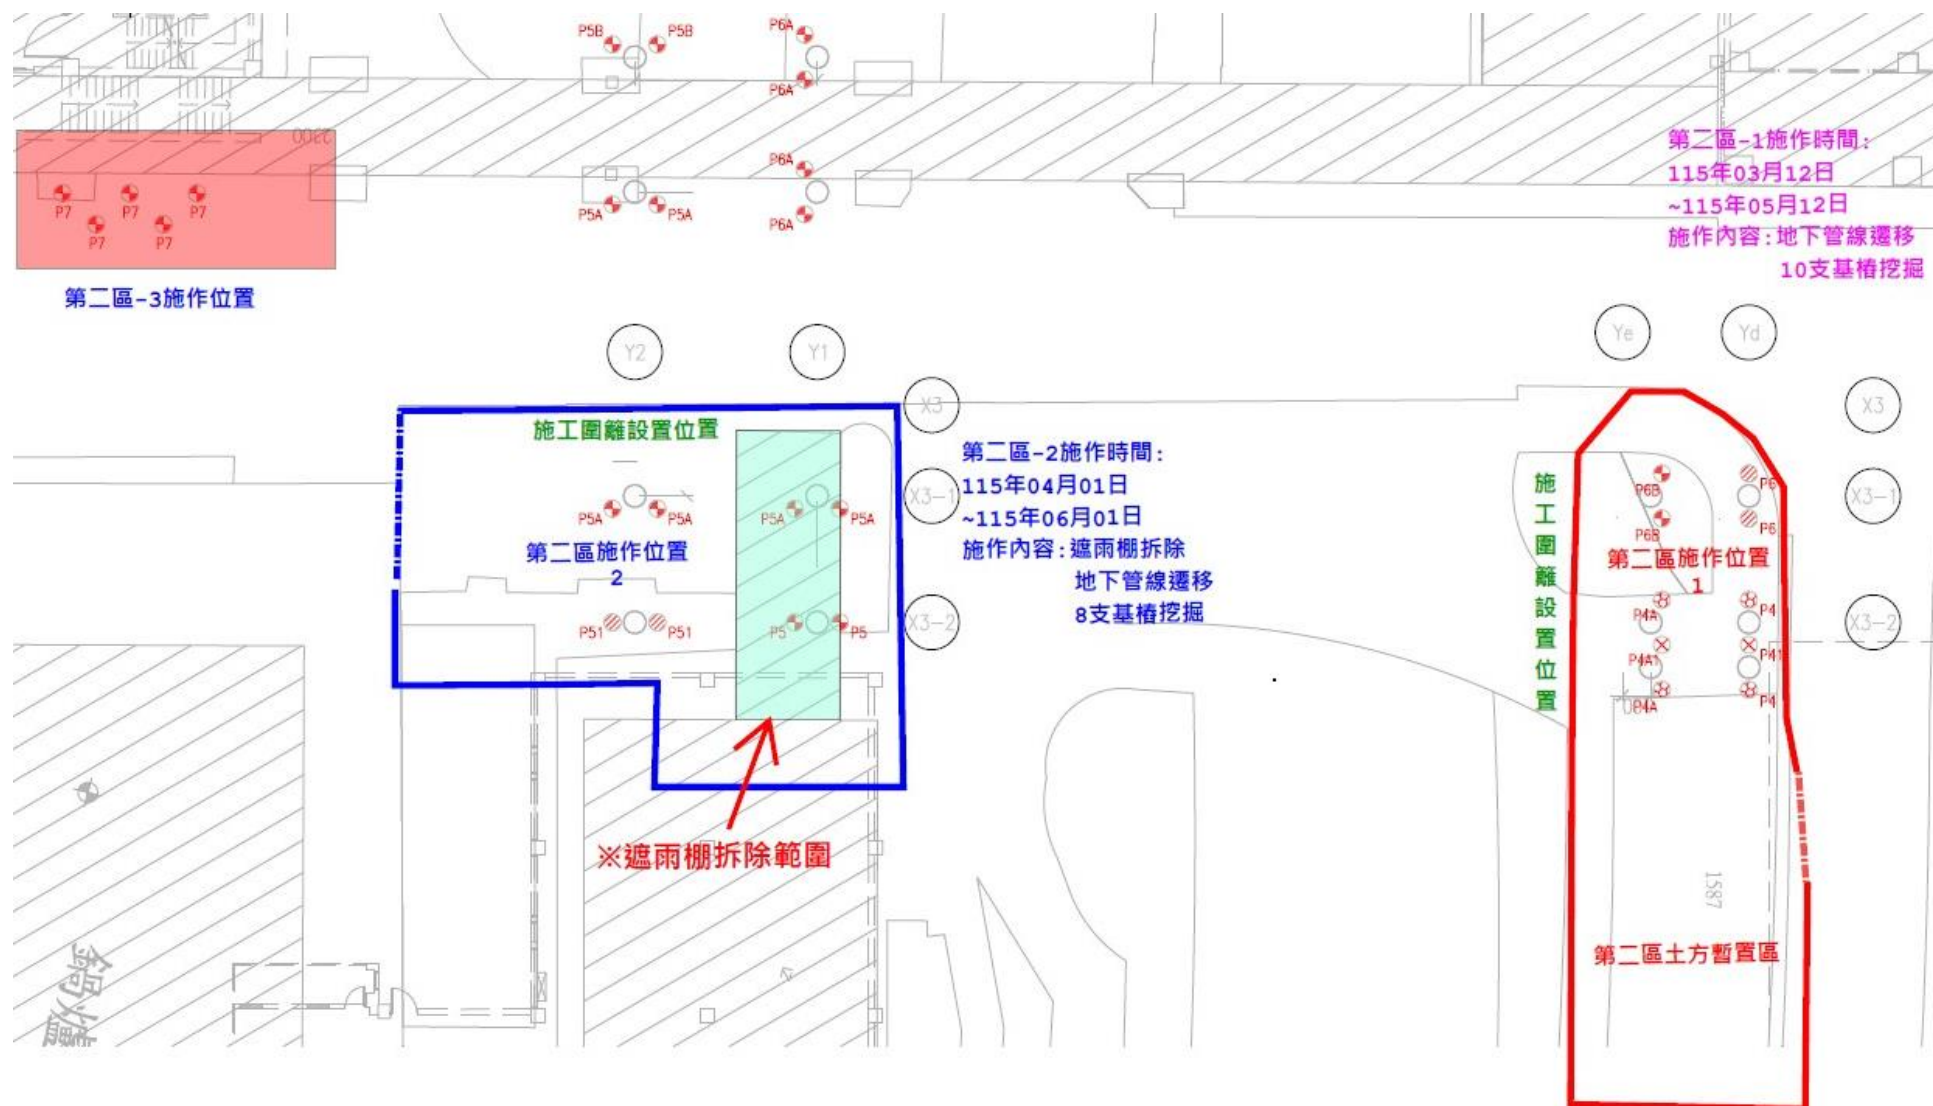

議題討論-B1F診間色彩計畫

◆ 依115/03/12院部晨會紀錄，須請設計單位模擬診間外牆配色供參。



◆ 依115/03/12院部晨會紀錄，櫃體色彩(色號3009)模擬圖。



職安衛安全管理

職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	本工程工區同時多處進行吊掛作業，若受限工區環境無法圈圍管制，仍應設置專人指揮，吊掛作業時應管制吊掛物下方暫停人員通行並避免施工人員於吊掛物下方進行施工作業，確保安全。
4	工區現階段仍存在諸多高架作業之工項及工作面，應持續加強施工人員防墜落之管理，工區內仍偶見施工人員於高處施工移動時未確實將背負式安全帶附掛於安全母索上之危險行為，請施工團隊持續加強宣導及巡檢，確保安全。。
5	工區內已搭設施工架若未經自動檢查合格，應明確標示確保施工人員誤用衍生危害，施工架搭設人員應落實防墜落護具(背負式安全帶)之正確使用，施工架之上下設備、交叉拉桿、腳趾板及防墜網等部件，應依規定完整設置，以符規定並確保使用安全。

請設計監造單位接續簡報~
謝謝

方案0 (3/16姚顧問同意版)

睡眠呼吸檢查
控制室

內視鏡7間

尊榮門診專
區(6間診間、
2間VIP室、
獨立候診區)


單人房
11間

雙人房9間
(18位)


6人房 6間
(36位)

方案0

(建築師彙整版)

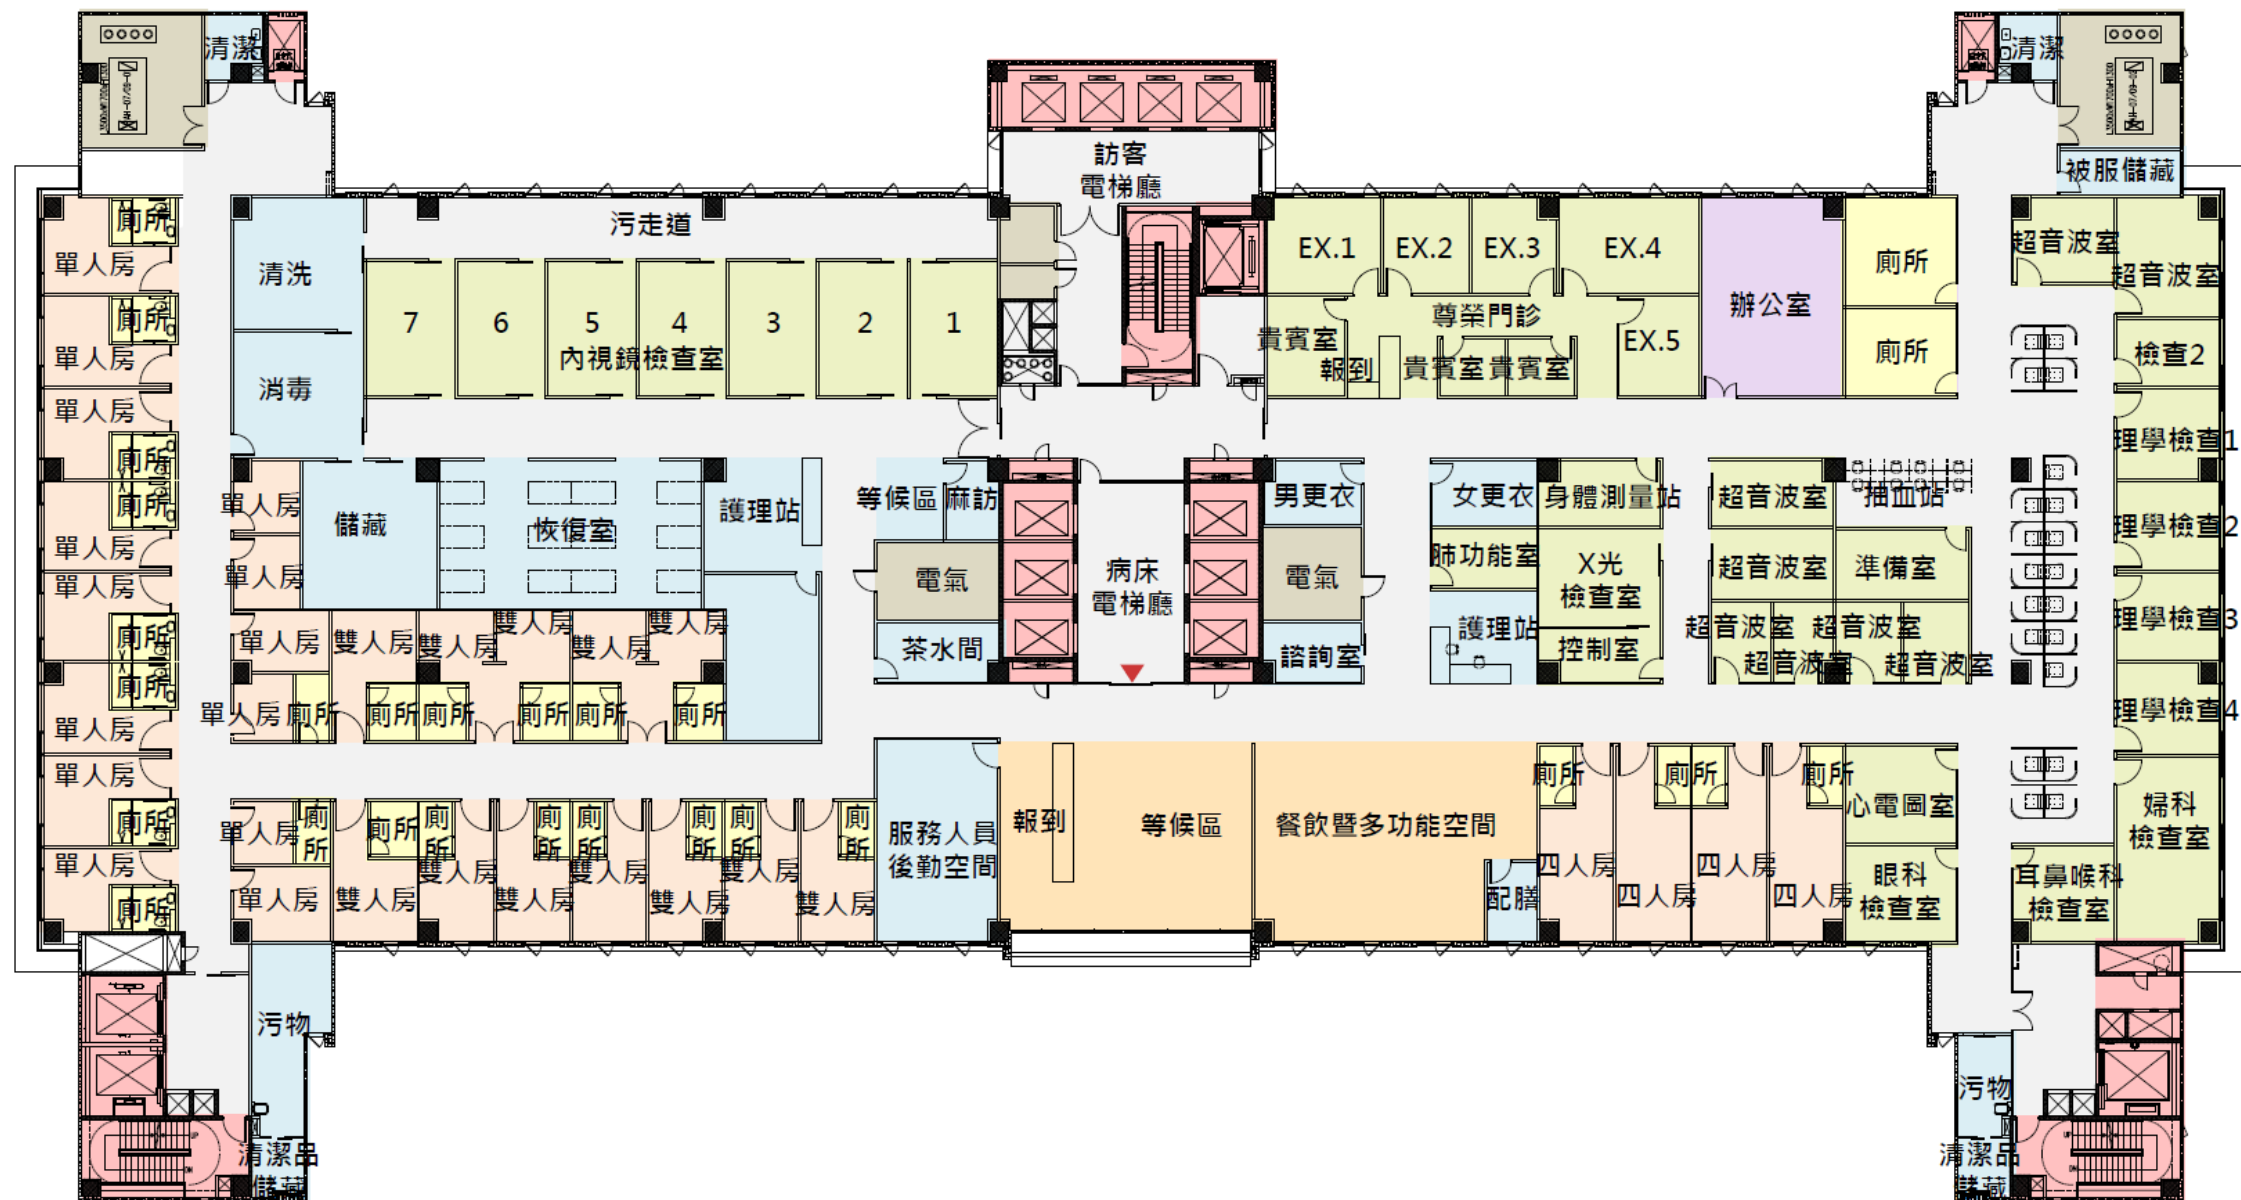

方案2 (3/18組長與其他人討論版本)

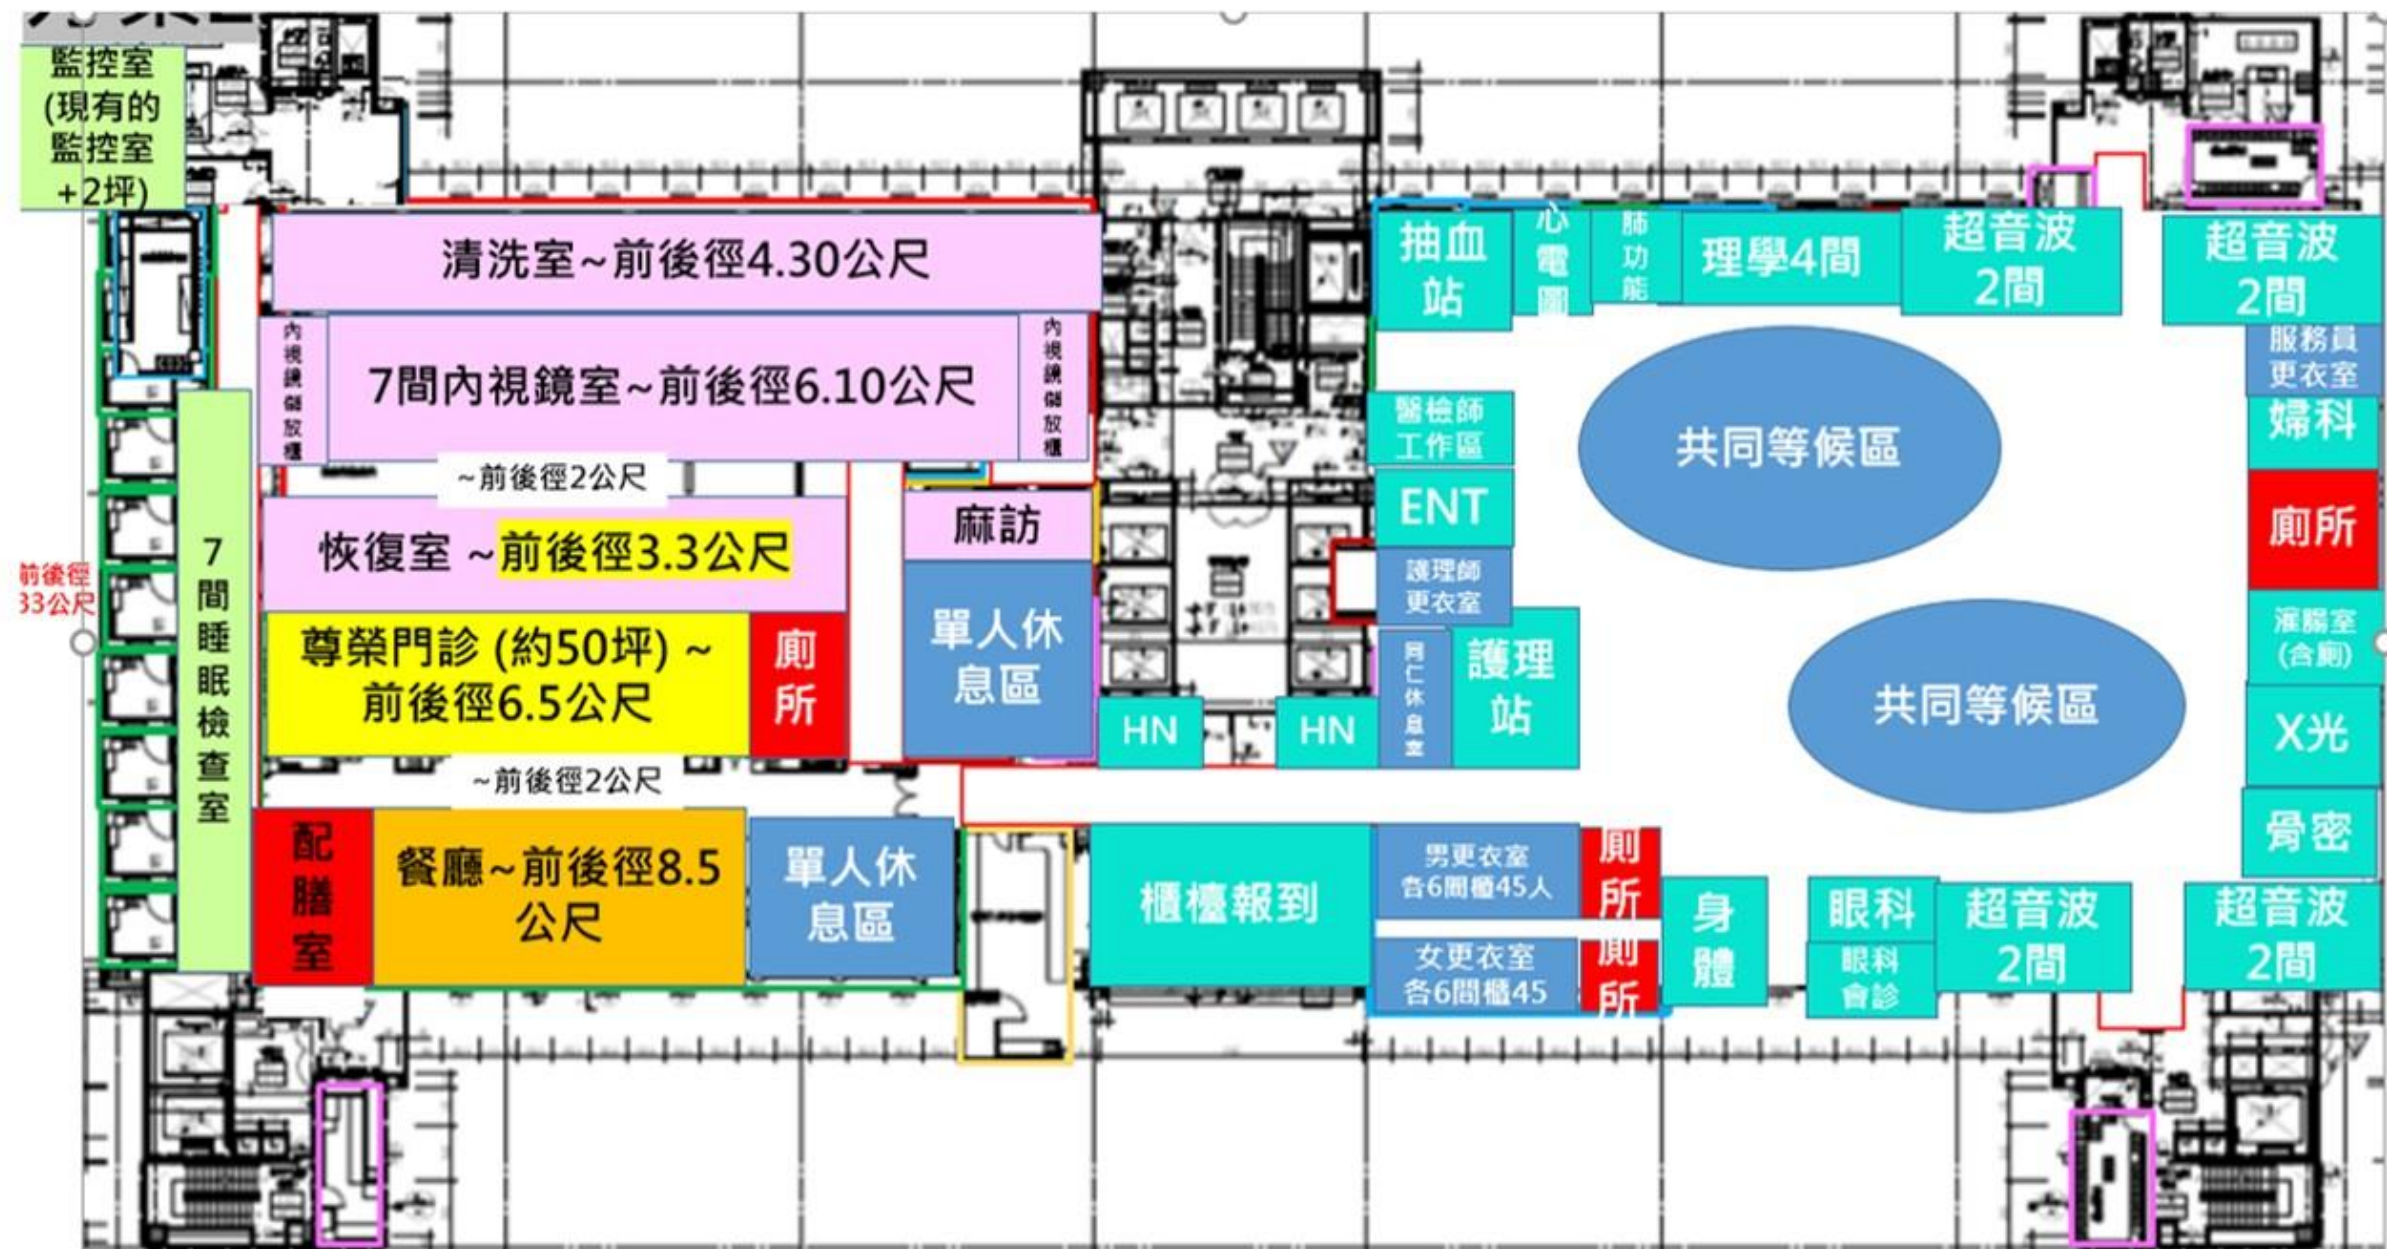

方案2


(建築師彙整版)



B1



B1

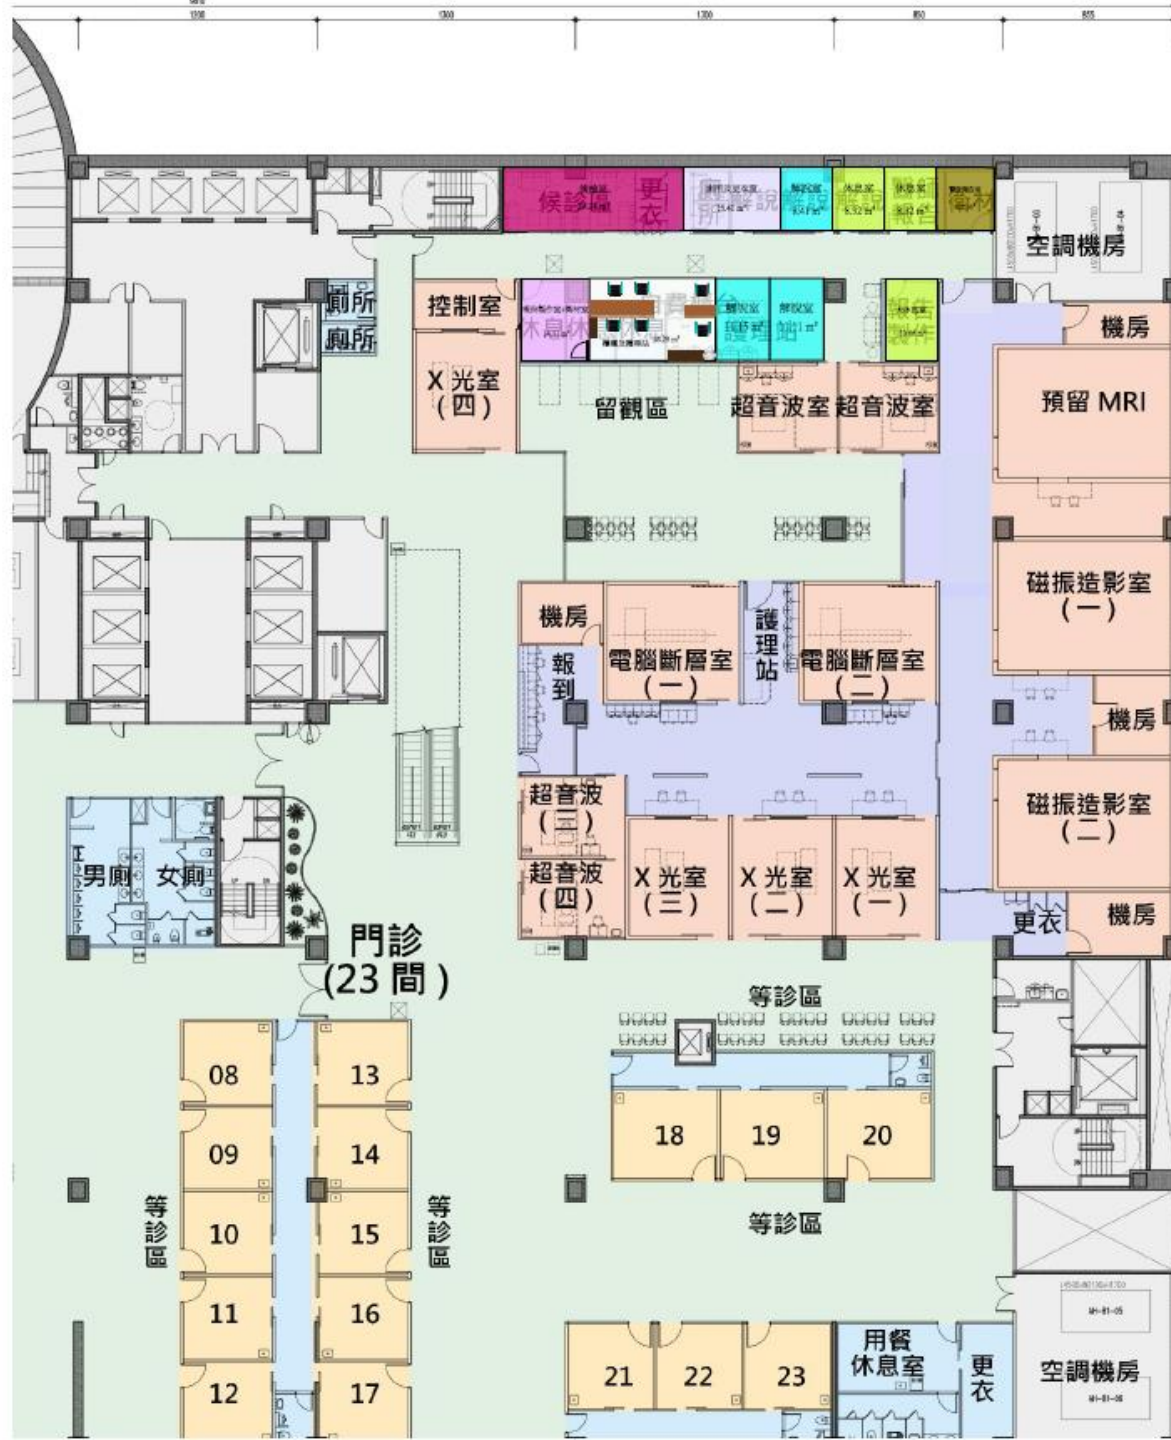

➤ 3/24影像醫學部給的
建議調整需求



分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年4月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 審查中	專管 核定中	機關 備查中		
分項施工計畫	119	118	0	1	1	116	0
1. 「氣送系統工程分項施工計畫」(第3次提送)：專管：銘建(榮)字第1150312018號函核定 院方：中榮工字第1159913487號函備查 本項解管							
2. 「手術室裝修及設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第1150300159號函提送 監造：譚余中榮字第1150319002號函審查合宜 專管：核定中							
3. 「天花板工程分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1150305007號函核定 院方：中榮工字第1159913042號函備查 本項解管							
4. 「架空走廊基樁工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1150306001號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1150309012號函核定 院方：備查中							
5. 「防火阻絕工程工程分項施工計畫」：：(管制提送時間：4月10日)							
項 目	應提送	已提送	審 查 中			已核定	逾期送審
			監造 審查中	專管 審定中	機關 核定中		
材料/設備送審	150	150	1	3	0	146	0
1. 「櫥櫃設備」：麗明：麗字第0916002436號函提送 監造：譚余中榮字第1140922001號函審退(申請至：3月30日重新提送)							
2. 「防焰壁布」：專管：銘建(榮)字第1150309013號審定 院方：中榮工字第1159913263號函核定 本項解管							
3. 「屋頂透氣罩」：麗明：麗字第1150300135號函提送 監造：譚余中榮字第1150313003號函審查合宜 專管：審定中							
4. 「水量計及附屬設備」：專管：銘建(榮)字第1150313007號審定 院方：中榮工字第1159913548號函核定 本項解管							
5. 「弱電材料(資訊插座、收容箱)」：麗明：麗字第1150300198號函提送 監造：譚余中榮字第1150320006號函審查合宜 專管：審定中							
6. 「金屬線槽線架系統工程(電力用T=2.0MM)」：麗明：麗字第1150300208號函提送 監造：譚余中榮字第1150323001號函審查合宜 專管：審定中							

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年4月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已 備 查	逾 期 送 審
			監 造 核 定 中	專 管 備 查 中	機 關 備 查 中		
施工圖	89	89	4	0	0	85	0
1. 「B6F~B1F天花板工程分割施工圖」：麗明：麗字第1150300211號函提送 監造：審查中							
2. 「變電站設備-配電盤簽認圖」：專管：銘建(榮)字第1150309006號備查 院方：中榮工字第1159913227號函備查 本項解管							
3. 「開關箱設備-配電盤簽認圖」：專管：銘建(榮)字第1150309005號備查 院方：中榮工字第1159913228號函備查 本項解管							
4. 「FRP水箱施工圖(進版)」：麗明：麗字第1150300196號函提送 監造：審查中							
5. 「B2F機水電系統工程施工圖(進版)」：麗字第1150300197號函提送 監造：審查中							
6. 「直升機停機坪施工圖」：麗字第1150300188號函提送 監造：審查中							

請施工單位接續簡報~
謝謝

壹、本週及下週施工作業說明

本週(115年3月23日~115年3月29日)工程施工作業

1. 5F~8F內、外牆牆面鋼筋綁紮及混凝土澆置。
2. 4F~5F鋼構梁柱菱形網打設及防火批覆噴塗。
3. 1F~2F室內泥作粉刷施作。
4. 西側車道區地坪鋼筋混凝土施作、東側人行步道區開挖整地及水溝施作。
5. 架空走廊第二區人工基樁開挖施作。

下週(115年3月30日~115年4月5日)預定施工作業

1. 5F~8F內、外牆牆面鋼筋綁紮及混凝土澆置。
2. 4F~5F鋼構梁柱菱形網打設及防火批覆噴塗。
3. 1F~2F室內泥作粉刷施作。
4. 西側車道區地坪鋼筋混凝土施作、東側人行步道區開挖整地及水溝施作。
5. 架空走廊第二區人工基樁開挖施作。

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 3 ~ 115 / 4																			備註		
		預定進度			上週進度							本週進度							下週進度							
					3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3		4/4	4/5
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五		六	日
一、	地上層裝修及結構工程	開始時間	完成時間	249																						
		114/3/27	114/11/30																							
1	5F~7F防火披覆施作	115/1/23	115/4/2	70																					2F~4F已完成	
		115/1/23																								
2	1F輕隔間立骨架	115/3/6	115/3/14	9																						
		115/3/6																								
3	屋頂版鋼筋綁紮及停機坪機電設備管路配置	115/3/14	115/3/30	17																					設備管路先行施作。	
		115/3/14																								
4	5F~8F內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/3/6	115/3/27	22																					4F已完成，修正5F~8F。	
		115/3/6																								
5	第二區人工基樁施作	115/3/21	115/4/20	31																						
		115/3/21																								
二、	地下室機電工程	開始時間	完成時間																							
	地上層至5層機電工程	114/7/16	115/4/30	289																						
		115/3/1	116/4/30	426																						
1	B6F~B3F給排水管路施作	115/1/15	115/4/4	80																						
		115/1/15																								
2	B2F~B1F給排水管路施作	115/2/26	115/5/3	67																						
		115/2/26																								
3	B2F、B1F隔間配管 (水電、弱電、消防、空調)	115/1/26	115/3/18	52																						
		115/1/23	115/3/18	55																						
4	B2F、B1F弱電線槽施作	115/3/9	115/4/27	50																						
		115/3/9																								
5	B3F電力匯流排平面施作	115/3/30	115/4/20	22																						
6	1F~2F空調配管施作 (風管、水管、電管)	115/3/2	115/5/15	75																						
		115/3/2																								

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

日 期		起 始 日	完 成 日	天 數	115 / 3 ~ 115 / 4																					備 註	
編 號	三週進度	預定進度	實際進度		上週進度							本週進度							下週進度								
	綱圖時程				3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5		
	作業內容				一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日		
7	1F-2F排水吊管施作	115/3/5	115/5/10	67																							
		115/3/5																									
8	1F-2F消防水幹管配管	115/3/9	115/5/10	63																							
		115/3/9																									
附註：																											

(2026.3-2026.6)三月施工進度表


營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/2/27

2026/3~2026/6三個月進度表

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	2026年2月 2/1 2/8 2/15 2/22	2026年3月 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26	2026年4月 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31	2026年5月 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 7/19 7/26	2026年6月 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25
1		裝修及結構工程	425 d	2026/1/23	2027/3/31						
2		地上層內外牆結構體	142 d	2026/2/28	2026/7/19						
3		一樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28						
4		二樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28						
5		三樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28						
6		四樓牆面結構體	8 d	2026/2/28	2026/3/7						
11		五樓牆面結構體	8 d	2026/3/8	2026/3/15	6					
12		六樓牆面結構體	14 d	2026/3/16	2026/3/29						
17		七樓牆面結構體	14 d	2026/3/30	2026/4/12						
18		八樓牆面結構體	14 d	2026/4/13	2026/4/26						
19		九樓牆面結構體	14 d	2026/4/27	2026/5/10						
20		十樓牆面結構體	14 d	2026/5/11	2026/5/24						
21		十一樓牆面結構體	14 d	2026/5/25	2026/6/7						
22		十二樓牆面結構體	14 d	2026/6/8	2026/6/21						
23		十三樓牆面結構體	14 d	2026/6/22	2026/7/5						
24		屋頂水箱及機房	14 d	2026/7/6	2026/7/19						
25		內牆面泥作粉刷+RC牆門窗框安裝組立	139 d	2026/3/10	2026/7/26						
26		一樓	10 d	2026/3/10	2026/3/19						
29		二樓	14 d	2026/3/20	2026/4/2	26					
30		三樓	14 d	2026/4/3	2026/4/16	29					
31		四樓	14 d	2026/4/17	2026/4/30	30					
32		五樓	14 d	2026/5/1	2026/5/14	31					
33		六樓	14 d	2026/5/15	2026/5/28	32					
34		七樓	10 d	2026/5/29	2026/6/7	33					
35		八樓	10 d	2026/6/8	2026/6/17	34					
36		九樓	10 d	2026/6/18	2026/6/27	35					
37		十樓	10 d	2026/6/28	2026/7/7	36					
38		十一樓	10 d	2026/6/15	2026/6/24	21FS+7 d					
39		十二樓	10 d	2026/6/29	2026/7/8	22FS+7 d					
40		十三樓	14 d	2026/7/13	2026/7/26	23FS+7 d					
41		外牆粉刷工程	168 d	2026/3/30	2026/9/13						
42		東面	168 d	2026/3/30	2026/9/13						
55		西面	168 d	2026/3/30	2026/9/13						
68		防火披覆工程	116 d	2026/1/23	2026/5/22						
69		一樓	27 d	2026/1/23	2026/2/22						
72		二樓	8 d	2026/2/23	2026/3/2	71					
73		三樓	8 d	2026/3/3	2026/3/10	72					
74		四樓	8 d	2026/3/11	2026/3/18	73					
75		五樓	8 d	2026/3/19	2026/3/26	74					
76		六樓	8 d	2026/3/27	2026/4/3	75					
77		七樓	7 d	2026/4/4	2026/4/10	76					
78		八樓	7 d	2026/4/11	2026/4/17	77					
79		九樓	7 d	2026/4/18	2026/4/24	78					

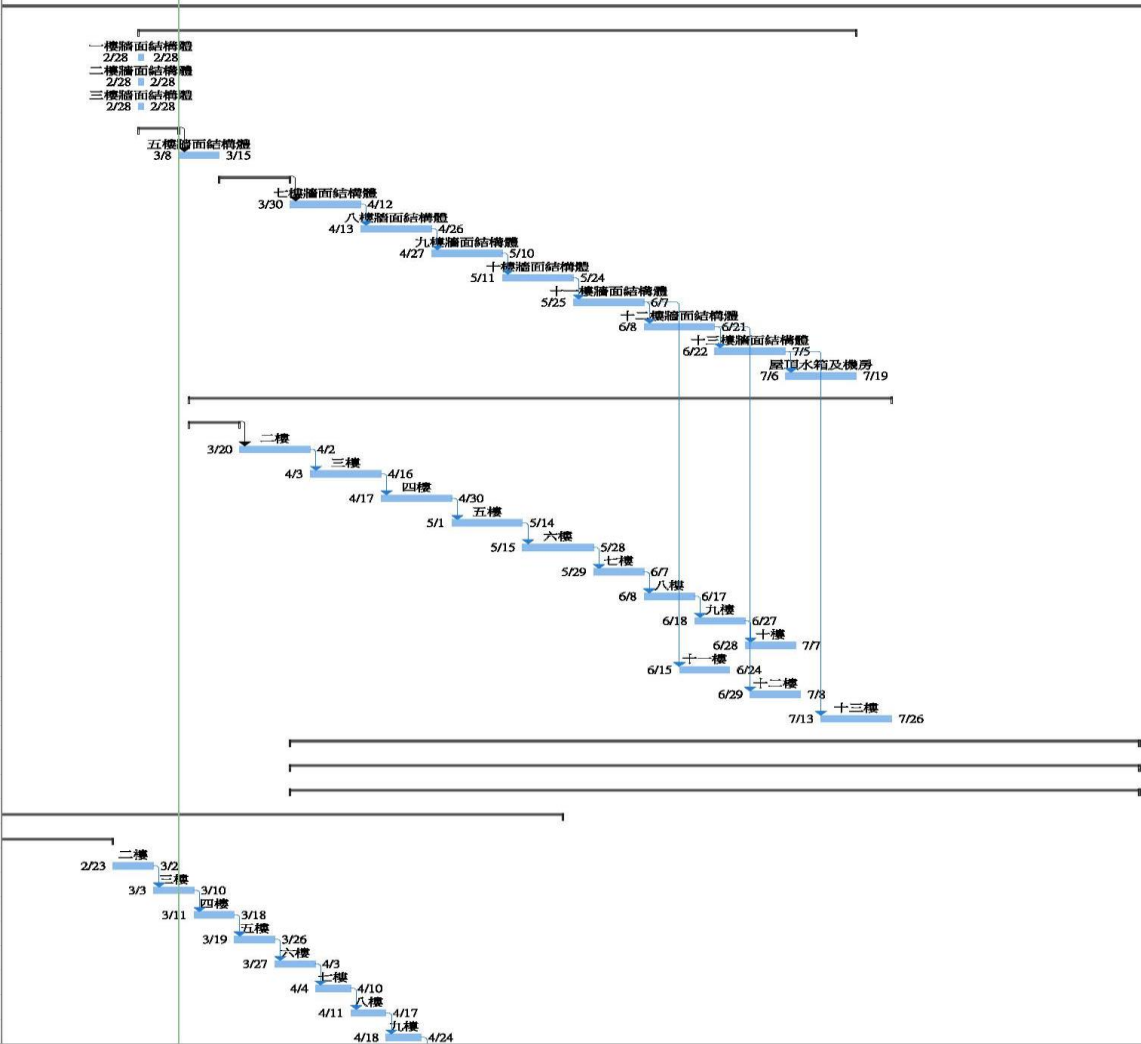

(2026.3-2026.6)三月施工进度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/2/27

2026/3~2026/6三個月進度表

	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	2026年2月 2/1 2/8 2/15 2/22	2026年3月 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 7/19 7/26 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25
80	十樓	7 d	2026/4/25	2026/5/1	79		
81	十一樓	7 d	2026/5/2	2026/5/8	80		
82	十二樓	7 d	2026/5/9	2026/5/15	81		
83	十三樓	7 d	2026/5/16	2026/5/22	82		
84	室內輕隔間工程(含機電工程)	200 d	2026/3/9	2026/9/24			
85	一樓	28 d	2026/3/9	2026/4/5			
90	二樓	28 d	2026/3/13	2026/4/9			
91	三樓	28 d	2026/4/6	2026/5/3	85		
92	四樓	28 d	2026/4/10	2026/5/7	90		
93	五樓	28 d	2026/5/4	2026/5/31	91		
94	六樓	28 d	2026/5/8	2026/6/4	92		
95	七樓	28 d	2026/6/1	2026/6/28	93		
96	八樓	28 d	2026/6/5	2026/7/2	94		
97	九樓	28 d	2026/6/29	2026/7/26	95		
98	十樓	28 d	2026/7/3	2026/7/30	96		
99	十一樓	28 d	2026/7/27	2026/8/23	97		
100	十二樓	28 d	2026/7/31	2026/8/27	98		
101	十三樓	28 d	2026/8/28	2026/9/24	100		
102	天花板工程	215 d	2026/5/8	2026/12/8			
120	地坪裝修工程	271 d	2026/6/30	2027/3/31			
121	西側車道延續	69 d	2026/1/23	2026/4/5			
122	西側車道上方向連接教學大樓通道	12 d	2026/1/23	2026/2/3			
128	西側車道延伸工程	39 d	2026/2/4	2026/3/18			
129	舊友管路移除修改	16 d	2026/2/4	2026/2/23	127		
130	地坪破碎載運及開挖	10 d	2026/2/24	2026/3/5	129		
131	PC澆置	1 d	2026/3/6	2026/3/6	130		
132	測量放樣	1 d	2026/3/7	2026/3/7	131		
133	I樓梯基礎及車道版鋼筋綁紮、基礎螺栓預埋	6 d	2026/3/8	2026/3/13	132		
134	混凝土澆置	1 d	2026/3/14	2026/3/14	133		
135	I樓梯柱頭鋼柱+樓梯吊裝	4 d	2026/3/15	2026/3/18	134		
136	I樓梯外牆工程	18 d	2026/3/19	2026/4/5			

參、上週工程施工照片



說明：鋼筋綁紮



說明：泥作施作前牆面清潔



說明：空橋基樁位置管線拆除



說明：防火披覆施作

參、上週工程施工照片



說明：管路配管施作



說明：管路配管施作



說明：混凝土澆置



說明：泥作打底粉刷

簡報結束，謝謝
