

# 臺中榮民總醫院

## 第三醫療大樓新建工程

### 9月月會暨第247次專業技術協調會

#### 會議紀錄

壹、會議時間：114 年 9 月 16 日(星期二) 下午 03 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓六樓 第一開標室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

#### 【工程進度】

- 截至 114 年 9 月 14 日止，使用工期：974 日曆天(不含免計工期 12 天)，剩餘 903 日曆天(展延工期 27 天)。
- 工程進度截至 114 年 9 月 14 日，預定進度 13.645%，實際進度 26.201%，超前進度：12.556%(約超前 203 天)。
- 期程規劃：

| 結構主要徑   | 網圖預定完成日期  | 實際趕進日期 | 差異天數 | 備註    |
|---------|-----------|--------|------|-------|
| 下構結構體工程 | 115/04/13 |        |      | 承商趕趕中 |

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
  1. 結構體工程：：B 區#6 螺絲鎖固、E F 梯地下室安裝、車道外牆、1F 內牆模板組立。
  2. 機電工程：1F 柱牆配管、B1 暗埋管路及複壁排水清潔、B3~B2F 一般照明拉線、B6F 水配管、2F 版放樣。
  3. 安全監測：數據無異常。

#### 【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。
2. 依 113/09/26 第七次臺中市政府公共藝術審議委員會決議，本案未通過。目前進度：第五次執行小組會議已於 113/11/14(四)召開，專管單位將依會議決議修正後再行提請

院方召開執行小組會議供委員審查。

**【討論事項】**

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為吊裝南、北側第六、七節鋼構梁柱及鋼樓梯、2F、3F 鋼承板鋪設、地下室 B2、B1 泥作施工、地下室車道天花板批土油漆，工程進度超前中。
2. 其他：
  - (1) 空橋試挖路線：
    - A. 施工單位於 114/09/13-114/09/14 於研究大樓前道路進行空橋路線試挖(詳後簡報 P. 5)。經施工單位說明，編號 2~5 之試挖點已確認，預計於本周三(09/17)修復完成、於本周四(09/18)開放；惟編號 1 之試挖點因地下管線配置較複雜，仍需持續釐清，需占用停車格作為土方暫置區。
    - B. 另經設計單位說明，鑒於既有管線位置恐與空橋梁柱產生衝突，已提出替代位置方案(詳後簡報 P. 10 - P. 13)；惟鍋爐房周邊之管線配置仍須待施工單位完成試挖後方能確認。
    - C. 綜上所述，經主席裁示，同意施工單位暫占停車格作為土方暫置區，另編號 4 試挖點內蒸汽管廢除；針對設計單位提出之變更方案，因難以直觀理解其實體形式，請設計單位以 3D 透視圖呈現最終效果，並納入院區整體美觀考量，評估梁柱數量是否可減少，於下次專技會議提報。
  - (2) 第三次變更設計剩餘經費：經專管單位統整，本案第三次變更設計可使用金額剩餘 1.4 億餘元(詳後簡報 P. 6)。
  - (3) 電梯規格：各單位於 114/09/12 至院內既有電梯/手扶梯進行會勘(詳後簡報 P. 7)，經本次會議討論決議如下。
    - A. 編號#1、#5、#7 之殘障電梯輔助控制面板無法完全嵌入，最多突出 3cm(仍在安全扶手間距內)，經主席裁示同意。
    - B. 編號#7-#12 病床電梯比照第二醫療大樓汰舊換新電梯施作三面踢腳及扶手，相關原設計後側有明鏡之電梯改為不鏽鋼鏡面鋼板範圍為扶手之上，扶手之下為不鏽鋼毛紋面鋼板。
    - C. 本案全數電梯外側控制面板由 LED 顯示器改為 LCD 顯示器，納入第三次變更追加減及圖說修正辦理。

- D. 電梯主控箱、馬達等控制設備，考量第二醫療大樓汰舊換新電梯資料顯示為台灣組裝電梯，與本案契約規定電梯來源不同；決議本案電梯採用一體化整機進口。
- E. 手扶梯經本次會議決議手扶梯欄杆高度 135 公分，並增設警告標示，納入第三次變更設計辦理。
- F. 其他：經工務室(修護保養組)提出本案電梯鋼索是否得須採用日本製規格(院內既有規格)，經主席決議請施工單位評估各規格鋼索之對照，於下次專技會議提報；另本案電梯須納入智慧電梯功能，經主席決議請工務室(修護保養組)詳列智慧電梯應具備之功能並評估相關預算，於下次專技會議提報。

#### 肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

#### 伍、散會(下午 03 時 40 分)

#### 陸、會議照片



臺中榮民總醫院  
第三醫療大樓新建工程  
114年9月份工程月會報暨第247次專業技術協調會  
會議簽到表

- 壹、 會議時間：114 年 9 月 16 日(星期二) 下午 3 時 00 分  
 貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室  
 參、 主持人：李副院長 政鴻  
 肆、 出(列)席單位及人員：

|                              |                        |     |            |
|------------------------------|------------------------|-----|------------|
| 臺中榮民總醫院                      |                        |     |            |
| 副院長                          | 李政鴻                    |     |            |
| 主任秘書                         | 姚 銘                    |     |            |
| 醫企部                          | 李政鴻<br>洪信奇             | 醫工部 | 王聖魁        |
| 工務室                          | 伍南訓<br>陳恩華 許明龍 傅家臣 張滿洲 |     |            |
| 專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司    |                        |     |            |
| 賴銘昌 蕭提柏 張 不威 關               |                        |     | 陳秋屏<br>江意蓮 |
| 規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所 |                        |     |            |
| 楊良江 廖昱奇 楊雅麗                  |                        |     |            |
| 施工廠商-麗明營造股份有限公司              |                        |     |            |
| 黃以明 楊雅麗 劉森厚 林枝銘              |                        |     |            |

# 第三醫療大樓新建工程

## 114年9月工程月會暨第247次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司  
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所  
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司



# 工進說明

|                        |                                                                                                                                              |          |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 工程開工日                  | 112.01.03                                                                                                                                    |          |                    |
| 契約規定工期                 | 1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)                                                                                                   |          |                    |
| 契約完工日期                 | 117.03.10                                                                                                                                    | 目標第一階段開放 | 115年7月31日          |
|                        |                                                                                                                                              | 目標整體完工日期 | 116年3月19日          |
| 使用工期<br>(截至114.09.14止) | 974日曆天(不含免計工期12天)，剩餘 <u>903</u> 日曆天(展延工期27天)                                                                                                 |          |                    |
| 工程進度<br>(截至114.09.14止) | 預計：13.645%<br>實際：26.201%                                                                                                                     | 進度差      | +12.556% (約超前203天) |
| 目前工程施作項目               | <div>① 結構體工程：B區#6螺絲鎖固、E F梯地下室安裝、車道外牆、1F內牆模板組立</div> <div>② 機電工程：1F柱牆配管、B1暗埋管路及複壁排水清潔、B3~B2F一般照明拉線、B6F水配管、2F版放樣</div> <div>③ 安全監測：數據無異常</div> |          |                    |



# 本案三週進度表

業主:臺中榮民總醫院  
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司  
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所  
承包商:麗明營造股份有限公司

## 臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表


| 編號                            | 日期<br>三週進度<br>綱圖時程<br>作業內容 | 起始日        | 完成日         | 天數 | 114 / 9 ~ 114 / 9 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  | 備 | 註 |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-------------|----|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|--|--|---|---|
|                               |                            | 預定進度       | <div></div> |    | 上週進度              |     |      |      |      |      | 本週進度 |      |      |      |      |      | 下週進度 |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               |                            |            |             |    | 9/8               | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 |                               |  |  |   |   |
|                               |                            |            |             |    | 一                 | 二   | 三    | 四    | 五    | 六    | 日    | 一    | 二    | 三    | 四    | 五    | 六    | 日    | 一    | 二    | 三    | 四    | 五    | 六    | 日    |                               |  |  |   |   |
| 一、地上層鋼構工程                     | 開始時間                       | 完成時間       | 249         |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/3/27                  | 2025/11/30 |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/8/18                  | 2025/9/25  |             | 39 |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 1 #6鋼構梁柱吊裝及電焊                 | 2025/8/6                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9/11已申報勘驗完成，電焊作業收尾中，預計9/22完成。 |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/17                  | 2025/10/18 | 32          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/16                  |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 2 #7鋼構梁柱吊裝及電焊                 | 開始時間                       | 完成時間       | 32          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/17                  | 2025/10/18 |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/16                  |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 3 2F-5F鋼承板鋪設及剪力釘施作            | 2025/9/8                   | 2025/10/11 | 34          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/8                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/7/16                  | 2025/12/30 | 168         |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 二、地下室裝修工程                     | 開始時間                       | 完成時間       | 62          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/8/5                   | 2025/10/5  |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/8/5                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 1 B2F-B1F牆面泥作粉刷批土油漆、天花板平頂批土油漆 | 2025/8/5                   | 2025/10/5  | 62          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | B2F牆面已完成。                     |  |  |   |   |
|                               | 2025/8/5                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/8/5                   | 2025/10/5  | 62          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 2 B3F-B6F電力照明及插座拉線            | 2025/8/5                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/8/5                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/5                   | 2025/10/5  | 31          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 3 B3F-B6F複壁排水                 | 2025/9/5                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/5                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/15                  | 2025/10/17 | 33          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 4 B1F消防系統拉線                   | 2025/9/15                  |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/15                  |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/3                   | 2025/10/15 | 43          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 5 B6F-B4F消防水配管                | 2025/9/3                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/3                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/1                   | 2025/9/21  | 21          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
| 6 B3F-B5F空調誘導風機電源拉線           | 2025/9/1                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/1                   |            |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 開始時間                       | 完成時間       |             |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |
|                               | 2025/9/15                  | 2025/9/28  | 14          |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | </   |      |      |      |      |      |      |                               |  |  |   |   |

# 進度追蹤

| 事項           | 辦況說明                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建照變更         | 1. 依第245次專技會議，經評估若長青分院於114年10月核准後，後續行政流程至少仍需14.5個月                                                                                                                                                                                                                 |
| 部分空間<br>先行開放 | 1. 經與都發局詢問後，需先依《建築物部分使用執照核發辦法》第三條第一項第三點：「高度超過三十六公尺或十二層樓以上，或建築面積超過八〇〇〇平方公尺以上之建築物，其中任一樓層至基地地面間各層業經施工完竣。」檢討本案狀況。<br>2. 院方已於114/03/04發文請示中央機關(內政部國土署)解釋法律定義。<br>3. 依都發局於114/03/13之公文說明，本案涉及個案事實認定，仍須請建築師依規檢討辦理。<br>4. 依第221次專技會議，本案將於完成建照變更後依規申請B6F至1F各樓層經施工完竣之部分使用執照。 |
| 氣送系統         | 1. 依第242次專技會議，施工單位已繪製新增路徑之完整路線圖，並於院部晨會提報。<br>2. 經廠商報價，本案氣送系統(一般)需追加九百萬餘元。 <b>上週專技會議，長官指示請工務室釐清高速氣送系統費用，請工務室說明</b>                                                                                                                                                  |
| 空橋           | 1. 經確認，施工單位於114/09/13-114/09/14進行試挖，封鎖範圍詳後簡報。 <b>目前施工進度如後簡報說明</b>                                                                                                                                                                                                  |
| 電梯規格         | 1. 各單位於114/09/09進行電梯聯審會議，惟尚有部分事項須請主席裁示。 <b>上週主席裁示，請各單位派員並召開協調討論會，釐清本案電梯設置最佳方案。</b><br>2. <b>本案於114/09/12召開電梯會勘協調會，相關討論結果詳後說明。</b>                                                                                                                                  |



# 議題追蹤-空橋試挖路線

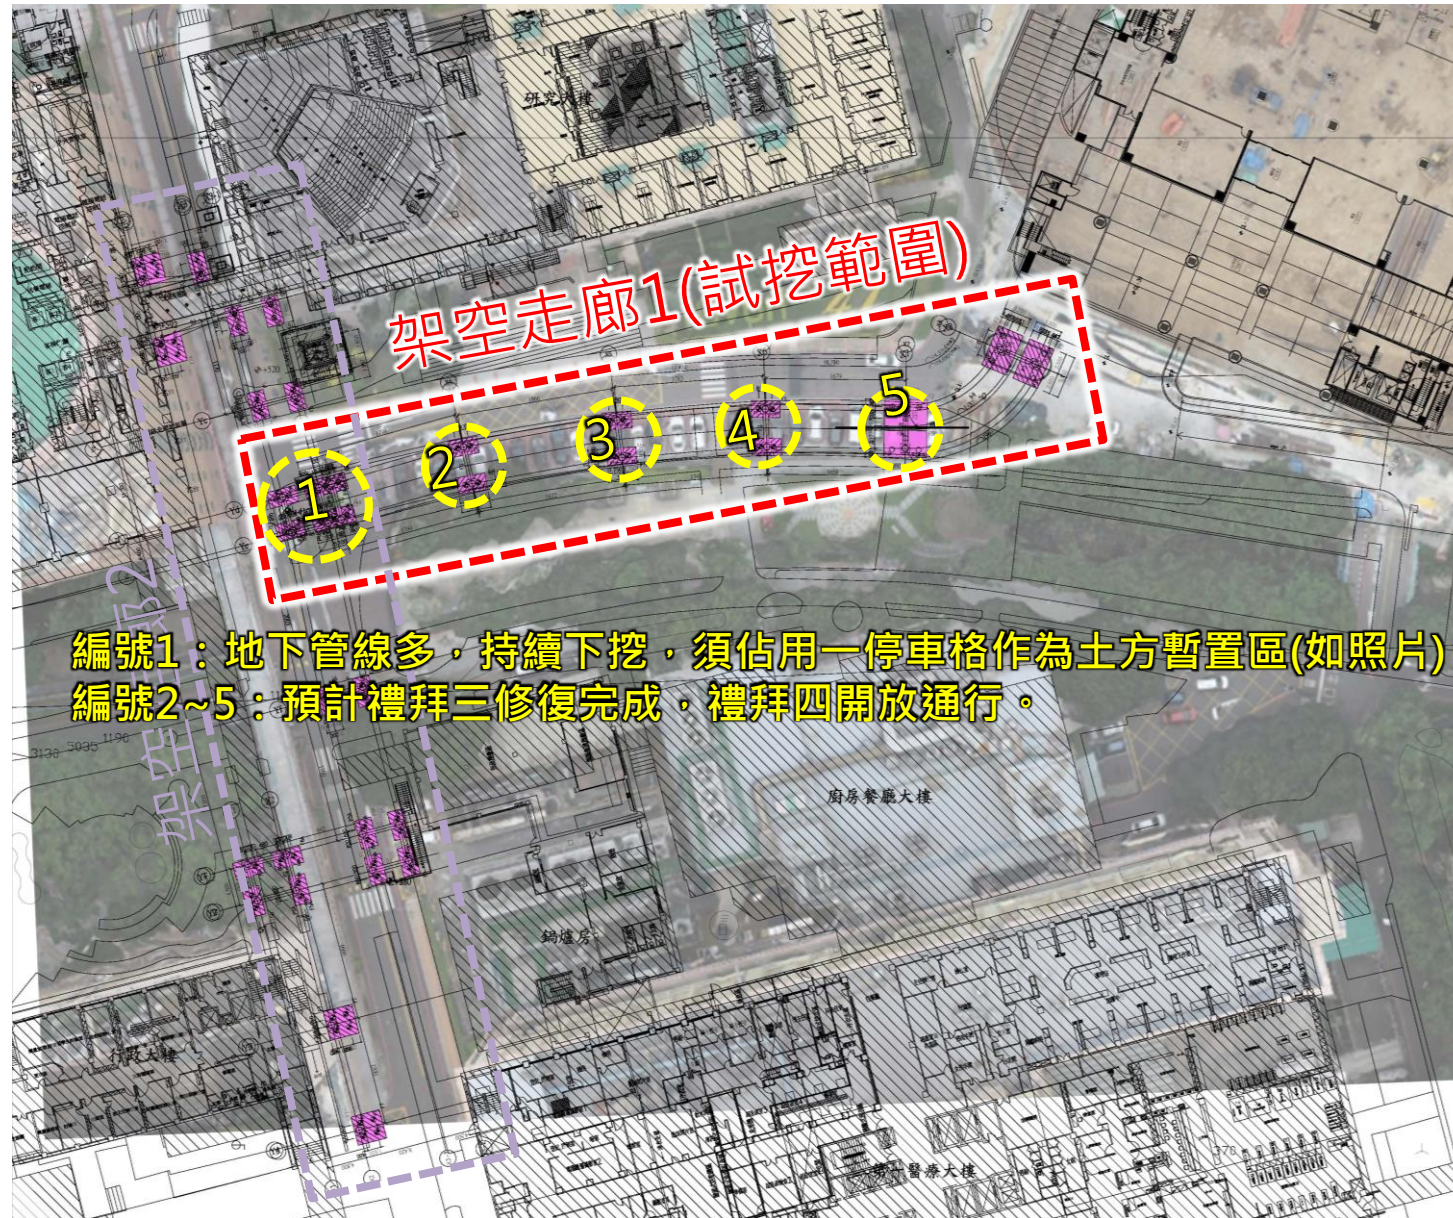



# 議題追蹤-預算管控(第三次變更設計剩餘金額)

| 物價調整費用：333,600,000元 |             |
|---------------------|-------------|
| 預估使用經費              |             |
| 本案已支用(113/3-114/8)  | 17,157,993  |
| 醫療儀器及相關設備預估費用       | 140,039,025 |
| 建議留用                | 100,000,000 |
| 剩餘                  | 76,402,982  |

| 工程準備金：304,001,790元                |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 預估使用經費                            |             |
| 第二次變更設計預估費用<br>(包含原計畫空橋、服務費、工程費等) | 239,429,876 |
|                                   |             |
| 剩餘                                | 64,571,914  |

三變可用金額  
140,974,896元(1.4億餘)

# 議題請示-電梯規格

| 9/9電梯聯審會議之疑義 |                                       | 9/10主席裁示                       | 9/12會勘討論結果                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 編號#1、#5、#7之殘障電梯輔助控制面板無法完全嵌入(約突出3~5公分) | 同意辦理                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 二醫汰舊換新電梯輔助面板為完全嵌入施作，但該電梯是面板更換位置而非原設計位置改善嵌入</li> <li>2. 本案電梯因殘障設施法規限制無法更換位置，<b>故仍維持原議</b>，最多突出3cm(仍在安全扶手間距內)辦理。</li> <li>3. 相關電梯標示編號俟專技會議決議再行納入三變追加減(指標工程)辦理。</li> </ol> |
| 2            | 編號#7-#12病床電梯是否增設踢腳                    | 是，增設防護踢腳                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 比照二醫汰舊換新電梯施作三面踢腳及扶手</li> <li>2. 相關原設計後側有明鏡之電梯改為<b>不鏽鋼鏡面鋼板範圍為扶手之上，扶手之下為不鏽鋼毛紋面鋼板</b>。</li> </ol>                                                                          |
| 3            | 電梯外側控制面板是否由LED顯示器改為LCD顯示器             | 全數電梯外側控制面板由改為LCD顯示器，內部維持LED顯示器 | <b>比照二醫汰舊換新電梯外側控制面板</b> ，俟專技會議決議再行納入第三次變更追加減及圖說修正辦理                                                                                                                                                               |
| 4            | 電梯主控箱、馬達等控制設備建議以國產或符合國際品質認證之進口產品為主    | 請工務室與各單位協調，於下周專技會議提報討論結果       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依協力廠商提供二醫汰舊換新電梯資料顯示為台灣組裝電梯。與本案契約規定電梯來源不同。</li> <li>2. 經承商表示，<b>本案電梯相關主要部件皆為進口合格供應商，其協力廠商於大陸廠組裝整機進口，符合契約及CNS規定</b>。</li> </ol>                                           |
| 5            | 手扶梯增設防墜網、警告標示等裝置                      | 手扶梯護欄加高、增設警示牌，請參考門診前棟手扶梯規格     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「手扶梯設備」<b>依院方需求於二變之增設設備項目</b>，手扶梯周邊設置玻璃扶手等已奉院方114/7/8中榮工字1149918844號函核定併入三變內辦理。</li> <li>2. 另警告標示、防墜措施或指標等其他需求，俟專技會議討論決議後，再行納入第三次變更項內辦理。</li> </ol>                     |

# 職安衛安全管理


## 職安衛安全管理

|   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。                                         |
| 2 | 本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。                        |
| 3 | 請施工團隊落實要求塔吊操作人員於攀爬上塔吊作業時應確實使用安全帶及安全帽，避免因重心失穩墜落造成重大職業災害。                                          |
| 4 | 現場進行鋼梯吊裝工程，作業人員於鋼構上作業時，受限因工作面狹窄，應請人員著必要之安全防護措施及背負式安全帶，並提供固定掛點，確保作業安全。                            |
| 5 | 地下六樓空間環境仍較為潮濕，應請加強通風並注意用電安全，包含接線箱之管理及臨時電線高架等作業，避免感電危害；一樓樓板施工區域內遍布氧氣乙炔線路及臨時用電線等線路較為凌亂，請加強管理，確保安全。 |

請設計監造單位接續簡報~  
謝謝





## 空橋配置 1F 變更前

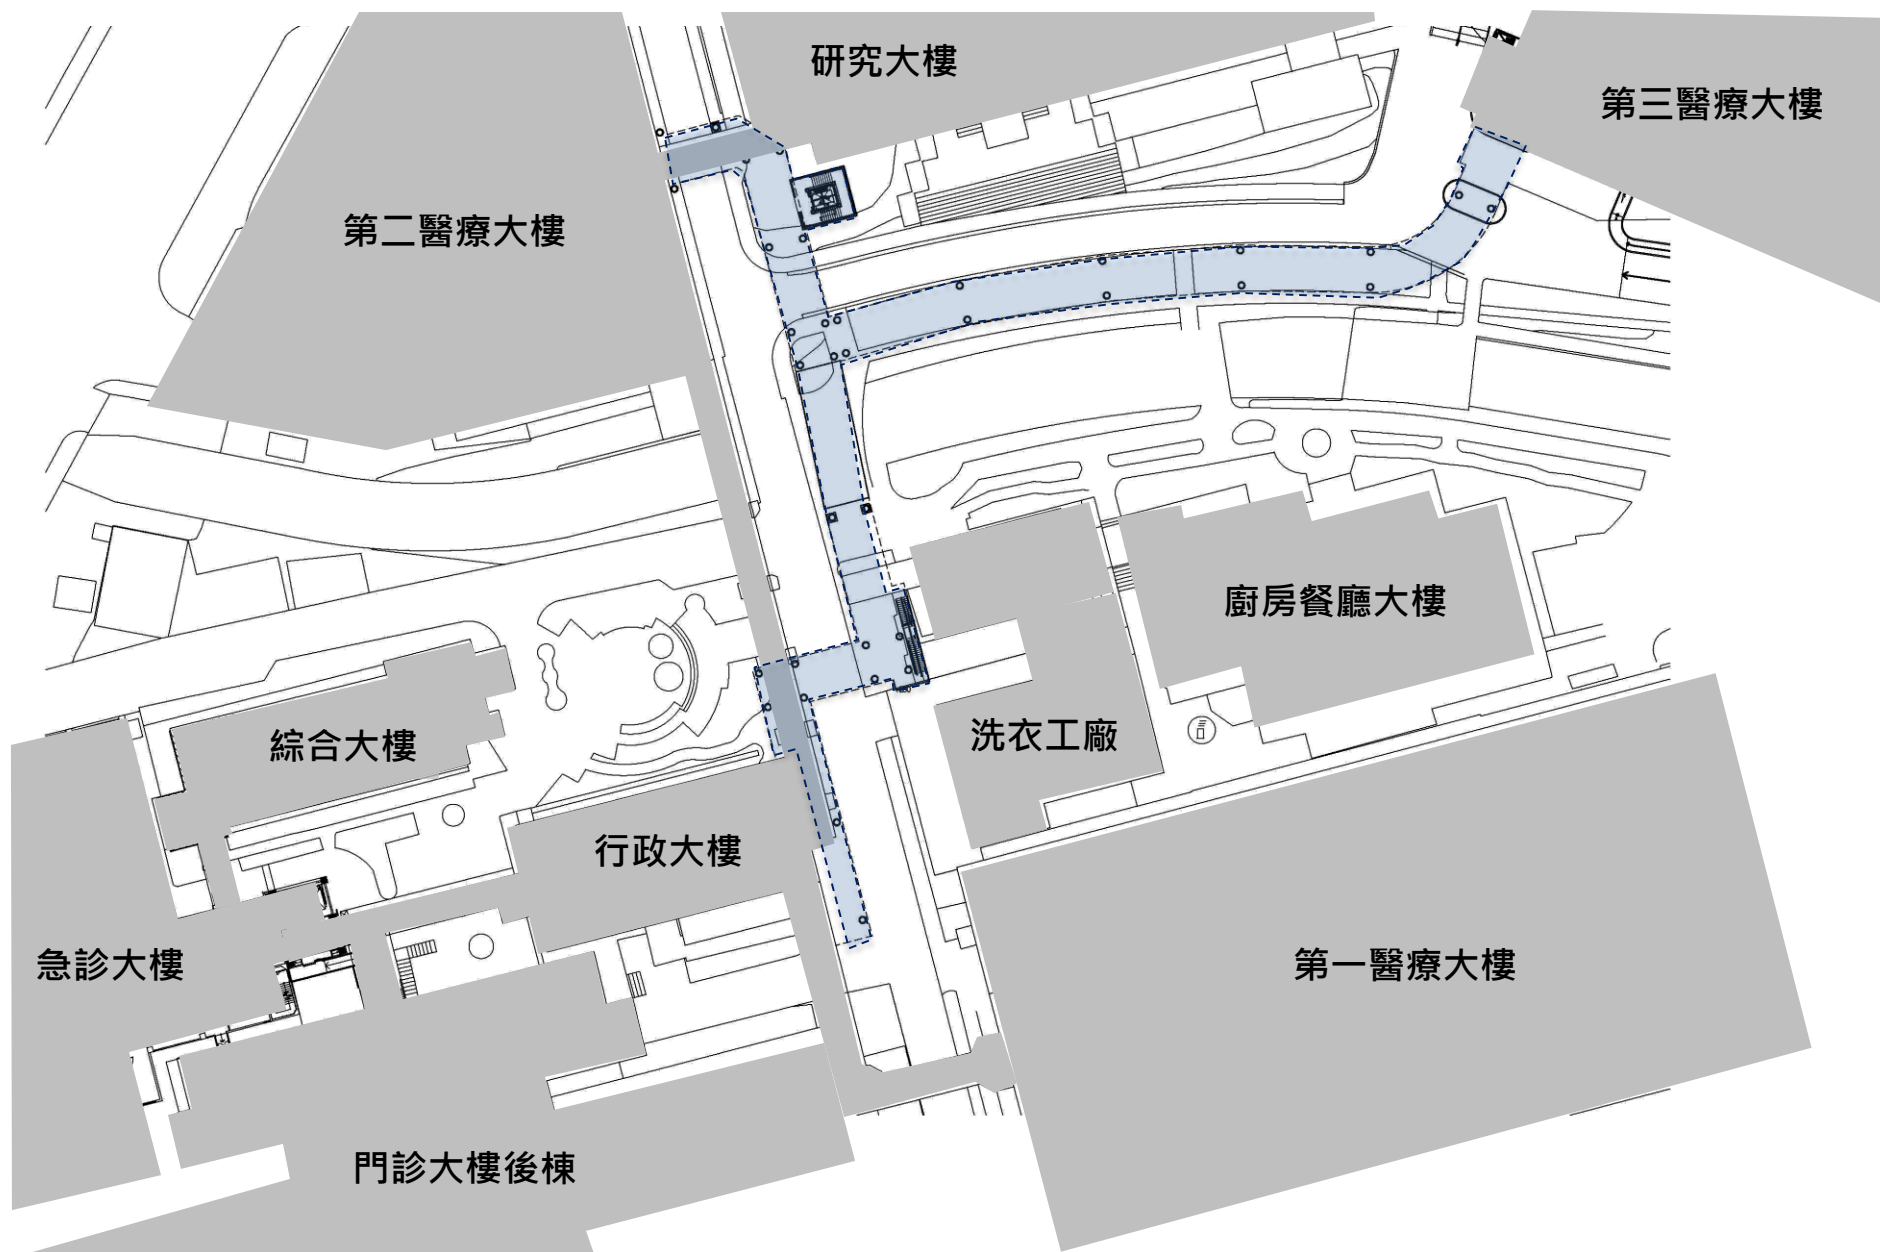


## 空橋配置 1F 變更後

●●●●● 管線位置

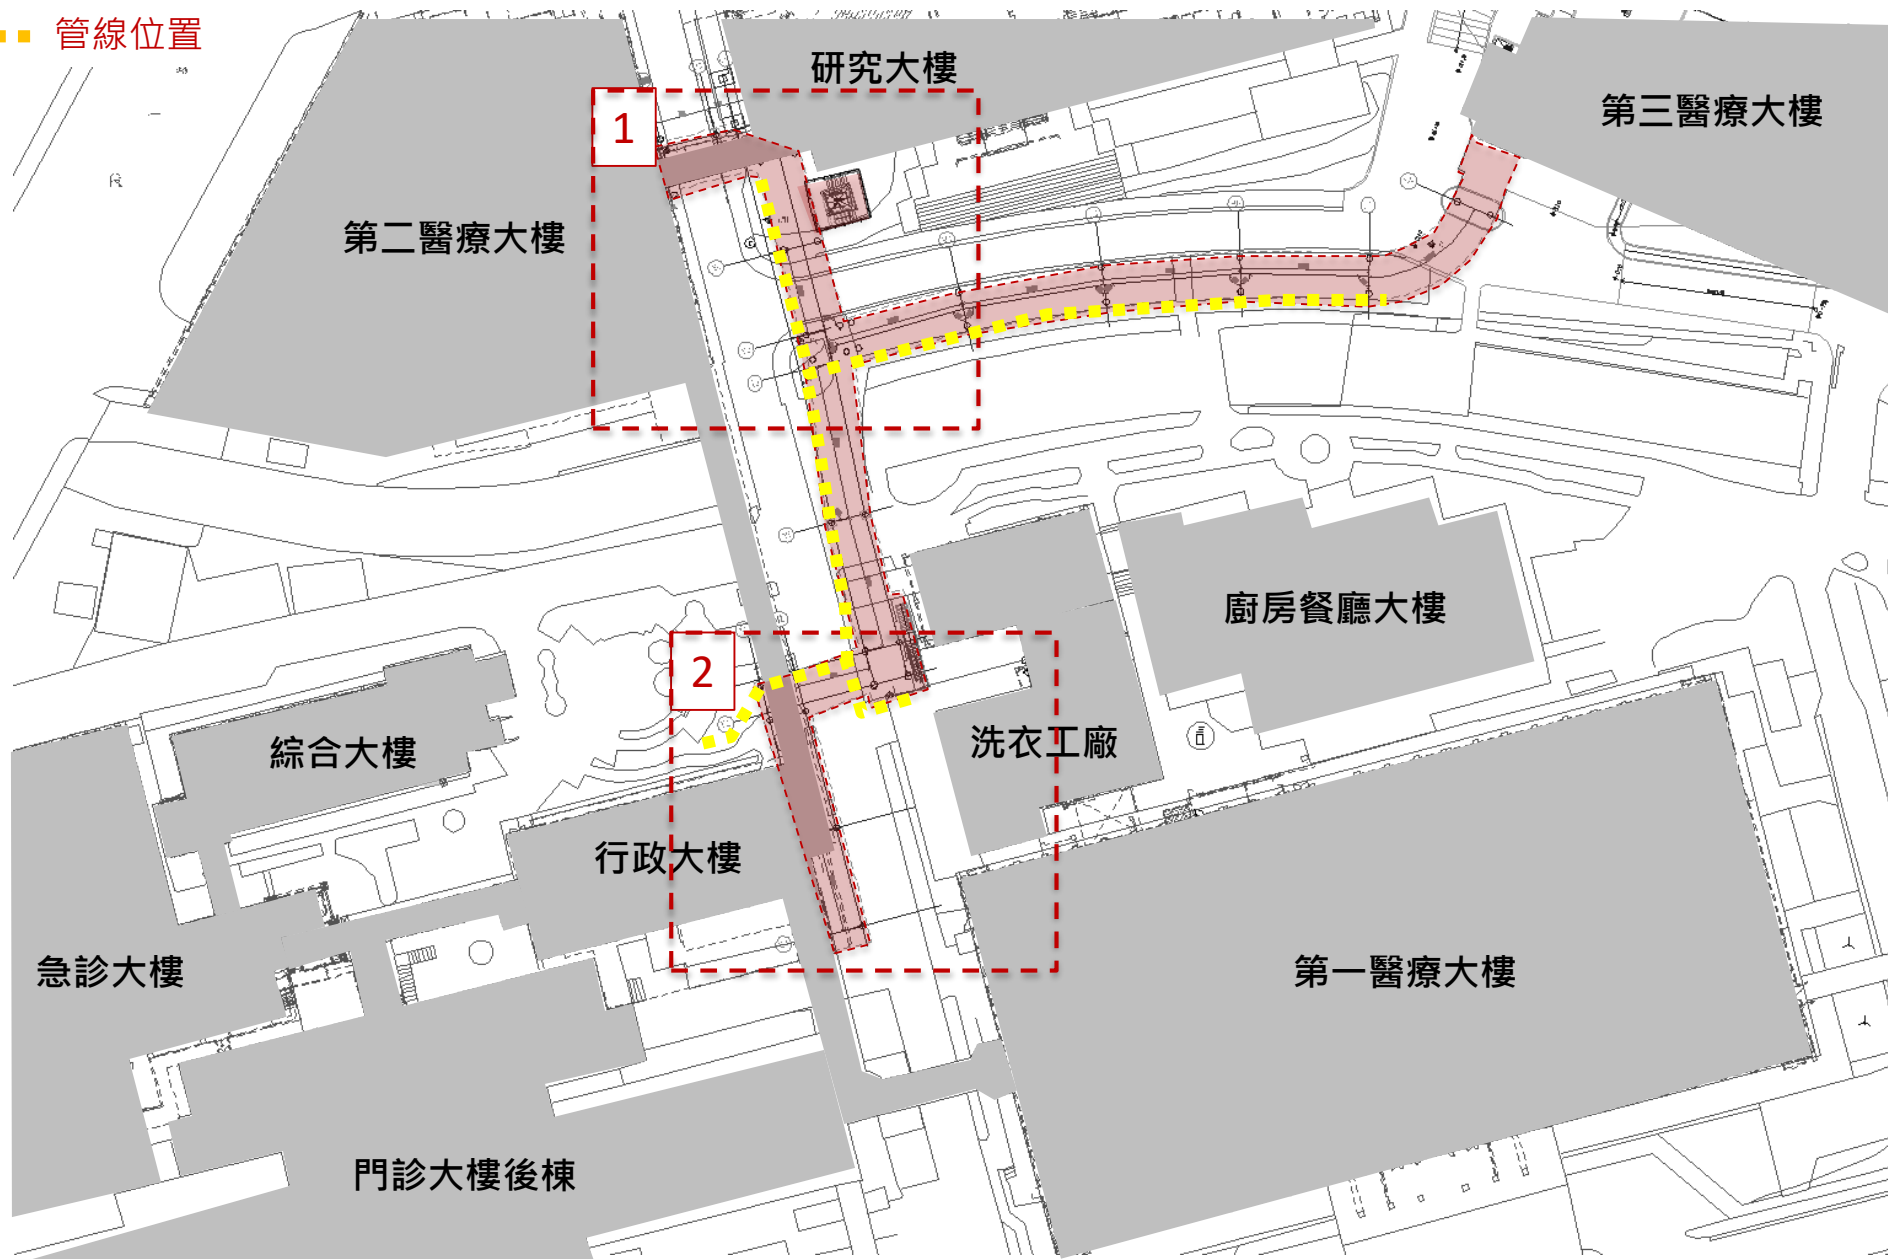

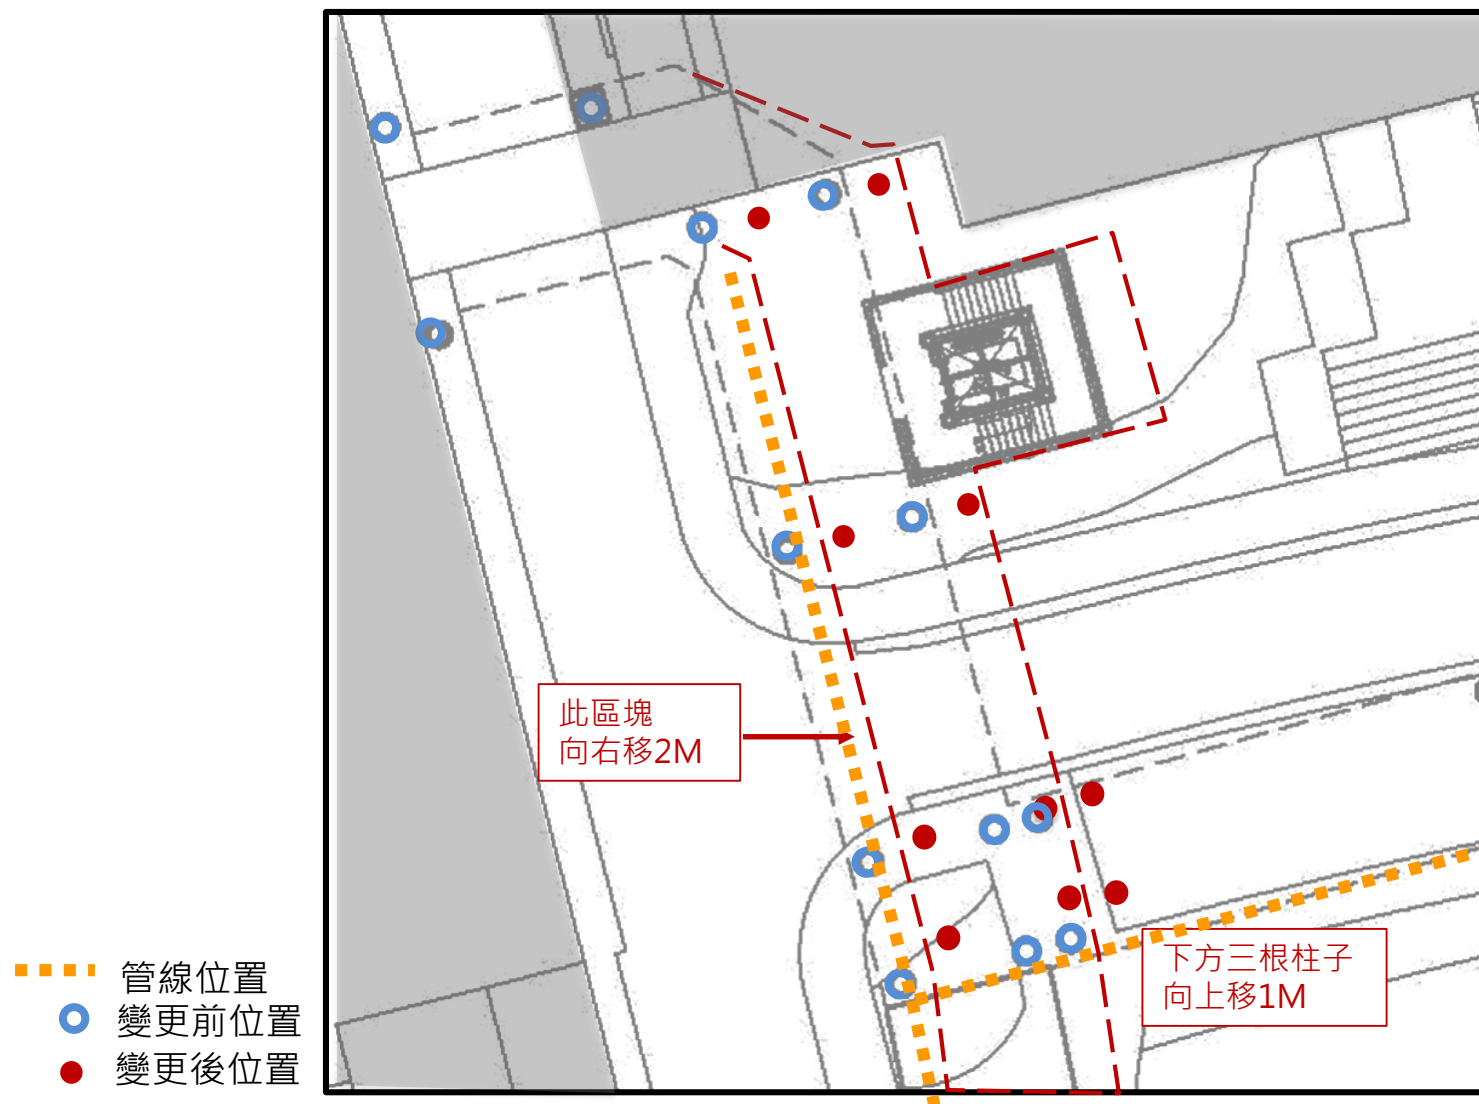



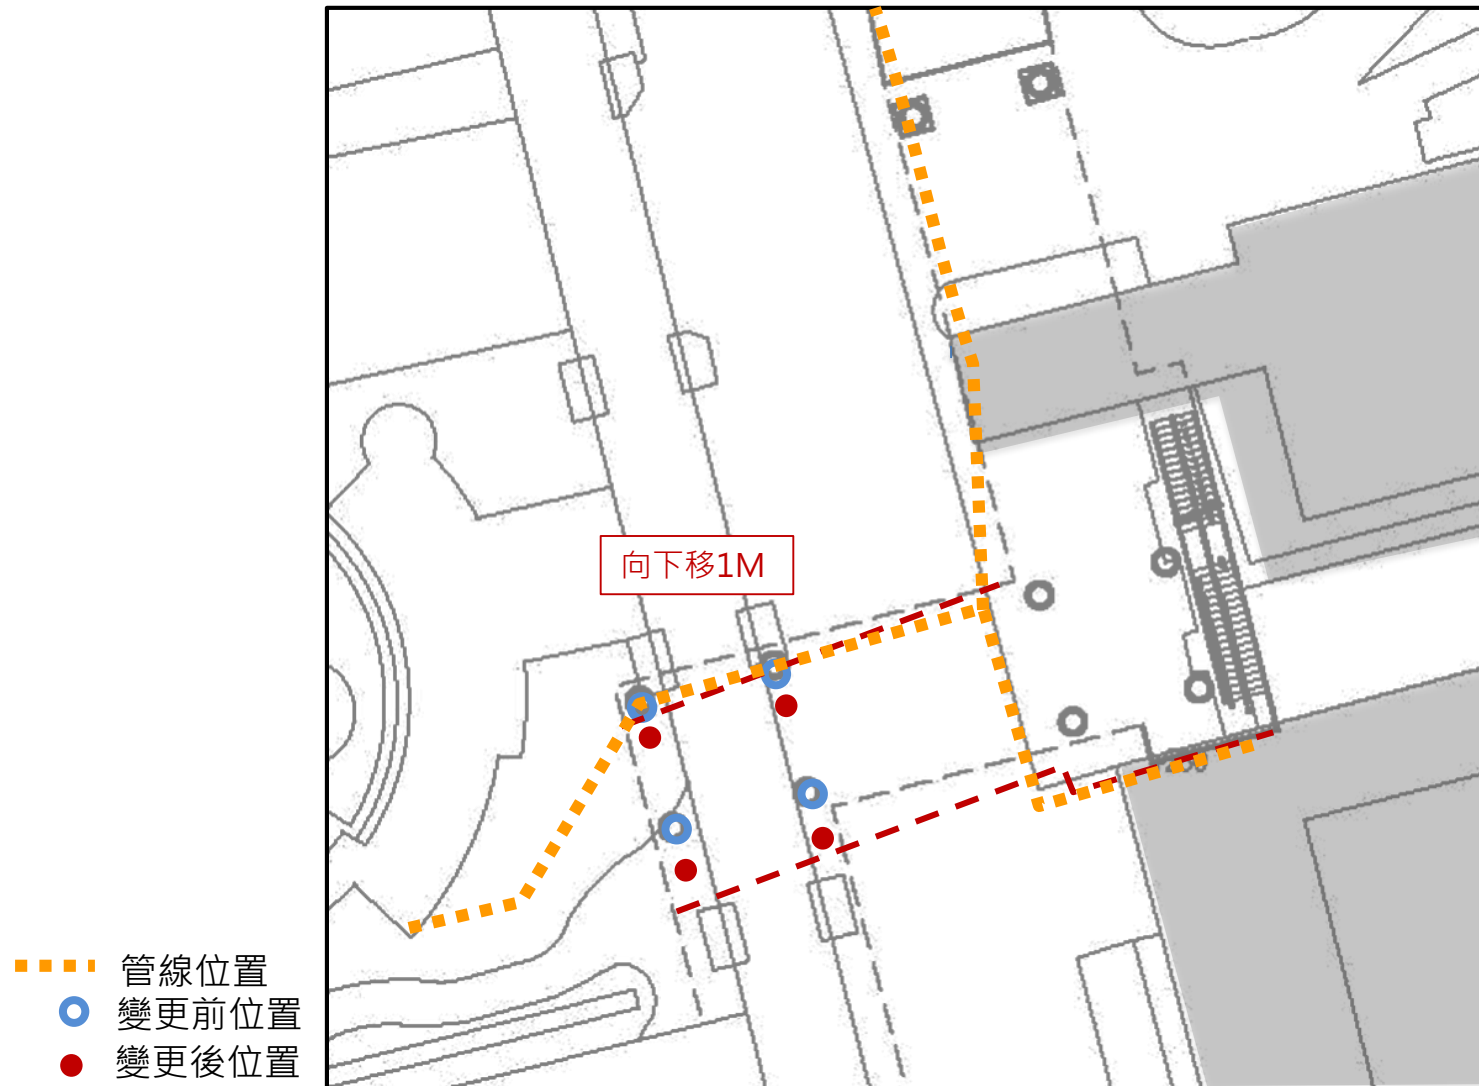

# 分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年10月31日止

| 項 目    | 應提送 | 已提送 | 審 查 中       |             |             | 已備查 | 逾期送審 |
|--------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----|------|
|        |     |     | 監造<br>審 查 中 | 專管<br>核 定 中 | 機關<br>備 查 中 |     |      |
| 分項施工計畫 | 102 | 100 | 0           | 0           | 5           | 95  | 0    |

1. 「電梯(含電扶梯)工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140901002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140903003號函核定 院方：備查中
2. 「電話交換機系統設備工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140901007號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140903004號函核定 院方：備查中
3. 「共同電視系統設備工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140901006號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140903006號函核定 院方：備查中
4. 「污被服垂直收集系統工程分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1140903007號函核定 院方：中榮工字第1149922181號函備查 本項解管
5. 「對講保全系統設備工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140902004號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140905024號函核定 院方：備查中
6. 「資通訊系統設備工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140902006號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140905023號函核定 院方：備查中
7. 「無線AP設備工程分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1140905022號函核定 院方：中榮工字第1149922338號函備查 本項解管
8. 「緊急求救影音對講系統分項施工計畫」(管制提送時間：114年9月22日)
9. 「門禁管制系統設備工程分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1140903002號函核定 院方：中榮工字第1149922173號函備查 本項解管
10. 「安全監視系統設備工程分項施工計畫」(管制提送時間：114年10月13日)

# 分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年10月31日止

| 項 目                                                                                      | 應提送 | 已提送 | 審 查 中       |             |             | 已核定 | 逾期送審 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----|------|
|                                                                                          |     |     | 監造<br>審 查 中 | 專管<br>審 定 中 | 機關<br>核 定 中 |     |      |
| 材料/設備送審                                                                                  | 115 | 108 | 2           | 0           | 4           | 102 | 0    |
| 1. 「防火遮煙捲簾」：監造：譚余中榮字第1140902003號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140905021號函審定 院方：核定中                    |     |     |             |             |             |     |      |
| 2. 「車道防水開門」：專管：銘建(榮)字第1140903008號函審定 院方：中榮工字第1149922186號函核定 本項解管                         |     |     |             |             |             |     |      |
| 3. 「手術室裝修及設備-1」：麗明：麗字第0708001741號函提送 監造：譚余中榮字第1140718002號函審退(管制時間：9月15日)                 |     |     |             |             |             |     |      |
| 4. 「手術室裝修及設備-2」：麗明：麗字第0811002099號函提送 監造：譚余中榮字第1140719006號函審退(管制時間：9月30日)                 |     |     |             |             |             |     |      |
| 5. 「NOVEC氣體自動滅火設備」：專管：銘建(榮)字第1140903005號函審定 院方：中榮工字第1149922183號函核定 本項解管                  |     |     |             |             |             |     |      |
| 6. 「資通訊系統設備工程、無線AP設備工程」：監造：譚余中榮字第1140808001號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140814011號函審定 院方：核定中        |     |     |             |             |             |     |      |
| 7. 「共同電視系統設備工程、電話配管線系統工程」：(管制提送時間：9月29日)                                                 |     |     |             |             |             |     |      |
| 8. 「變風量終端箱、定風量終端箱、變風量風閥、定風量風閥」：監造：譚余中榮字第1140908006號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140910007號函審定 院方：核定中 |     |     |             |             |             |     |      |
| 9. 「不鏽鋼爬梯及扶手欄杆」：專管：銘建(榮)字第1140901014號函審定 院方：中榮工字第1149922076號函核定 本項解管                     |     |     |             |             |             |     |      |
| 10. 「天花板(含防火吸音材)」：專管：銘建(榮)字第1140902004號函審定 院方：中榮工字第1149922116號函核定 本項解管                   |     |     |             |             |             |     |      |
| 11. 「防撞護牆板及防撞護角」：(管制提送時間：10月15日)                                                         |     |     |             |             |             |     |      |
| 12. 「隔簾(防焰布簾)」：(管制提送時間：10月15日)                                                           |     |     |             |             |             |     |      |
| 13. 「鍋爐(蒸氣鍋爐)設備」：(管制提送時間：10月1日)                                                          |     |     |             |             |             |     |      |
| 14. 「業務廣播系統設備」：(管制提送時間：10月13日)                                                           |     |     |             |             |             |     |      |
| 15. 「資通訊系統設備工程、無線AP設備工程」：(管制提送時間：10月27日)                                                 |     |     |             |             |             |     |      |
| 16. 「BI/BO 過濾網箱」：(管制提送時間：10月15日)                                                         |     |     |             |             |             |     |      |
| 17. 「廁所附屬設備」：監造：譚余中榮字第1140908005號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140910008號函審定 院方：核定中                   |     |     |             |             |             |     |      |

# 分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年10月31日止

| 項 目 | 應提送 | 已提送 | 審 查 中        |              |              | 已 備 查 | 逾 期 送 審 |
|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
|     |     |     | 監 造<br>核 定 中 | 專 管<br>備 查 中 | 機 關<br>備 查 中 |       |         |
| 施工圖 | 68  | 65  | 2            | 0            | 1            | 62    | 0       |

1. 「9F機水電各系統」：專管：銘建(榮)字第1140829001號函備查 院方：中榮工字第11409921961號同意備查 **本項解管**
2. 「電梯(含電扶梯)施工圖」：麗明：麗字第0901002312號函提送 監造：譚余中榮字第1140908001號函核定 專管：銘建(榮)字第1140911004號函審退
3. 「10F~R2F鋼承鈑施工圖」：監造：譚余中榮字第1140908003號函核定 專管：銘建(榮)字第1140910006號函 院方：備查中
4. 「10F機水電各系統施工圖」：麗明：麗字第0911002407號函提送 監造：核定中
5. 「內牆磁磚工程分割施工圖」：(管制提送時間：10月10日)
6. 「天花板工程分割施工圖」：(管制提送時間：10月20日)
7. 「11F機水電各系統施工圖」：(管制提送時間：10月15日)



請施工單位接續簡報~  
謝謝

# 壹、本週及下週施工作業說明

## 本週(114年9月15日~114年9月21日)工程施工作業

1. 吊裝第七節鋼構梁柱及鋼樓梯、2F、3F鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
2. 地下室B2、B1泥作施工、地下室車道天花板批土油漆。

## 下週(114年9月22日~114年9月28日)預定施工作業

1. 吊裝第七節鋼構梁柱及鋼樓梯、2F、3F鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
2. 地下室B2、B1泥作施工、地下室車道天花板批土油漆。

# 貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院  
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司  
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所  
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程  
三週進度表

| 編號                            | 日期<br>三週進度<br>綱圖時程<br>作業內容 | 起始日        | 完成日 | 天數 | 114 / 9 ~ 114 / 9 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               | 備註 |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-----|----|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|----|
|                               |                            | 預定進度       |     |    | 上週進度              |     |      |      |      |      |      | 本週進度 |      |      |      |      |      |      | 下週進度 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               |                            | 實際進度       |     |    | 9/8               | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               |                            |            |     |    | 一                 | 二   | 三    | 四    | 五    | 六    | 日    | 一    | 二    | 三    | 四    | 五    | 六    | 日    | 一    | 二    | 三    | 四    | 五    | 六    | 日    |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 一、地上層鋼構工程                     | 開始時間                       | 完成時間       | 249 |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/3/27                  | 2025/11/30 |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               |                            |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 1 #6鋼構梁柱吊裝及電焊                 | 開始時間                       | 完成時間       | 39  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  | 9/11已申報勘驗完成，電焊作業收尾中，預計9/22完成。 |    |
|                               | 2025/8/18                  | 2025/9/25  |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/8/6                   |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 2 #7鋼構梁柱吊裝及電焊                 | 開始時間                       | 完成時間       | 32  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/17                  | 2025/10/18 |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/16                  |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 3 2F-5F鋼承板鋪設及剪力釘施作            | 開始時間                       | 完成時間       | 34  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/8                   | 2025/10/11 |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/8                   |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 二、地下室裝修工程                     | 開始時間                       | 完成時間       | 168 |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/7/16                  | 2025/12/30 |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               |                            |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 1 B2F-B1F牆面泥作粉刷批土油漆、天花板平頂批土油漆 | 開始時間                       | 完成時間       | 62  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  | B2F牆面已完成。                     |    |
|                               | 2025/8/5                   | 2025/10/5  |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/8/5                   |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 2 B3F-B6F電力照明及插座拉線            | 開始時間                       | 完成時間       | 62  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/8/5                   | 2025/10/5  |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/8/5                   |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 3 B3F-B6F複壁排水                 | 開始時間                       | 完成時間       | 31  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/5                   | 2025/10/5  |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/5                   |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 4 B1F消防系統拉線                   | 開始時間                       | 完成時間       | 33  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/15                  | 2025/10/17 |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               |                            |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 5 B6F-B4F消防水配管                | 開始時間                       | 完成時間       | 43  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/3                   | 2025/10/15 |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/3                   |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 6 B3F-B5F空調誘導風機電源拉線           | 開始時間                       | 完成時間       | 21  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/1                   | 2025/9/21  |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/1                   |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 7 B3F-B5F宅內電信箱配置安裝            | 開始時間                       | 完成時間       | 14  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/15                  | 2025/9/28  |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/15                  |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 8 B1F弱電系統拉線                   | 開始時間                       | 完成時間       | 12  |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/8                   | 2025/9/19  |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
|                               | 2025/9/8                   |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |
| 附註：                           |                            |            |     |    |                   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |                               |    |

(2025.09-2025.11)三月施工進度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2025/09/14

2025/9~2025/11工期預定進度表

| 職別碼 | 任務模式 | 任務名稱                     | 工期     | 開始時間       | 完成時間       | 前置任務    | Q2 | Q3 | Q4 | 2025年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2027年 | Q1 |
|-----|------|--------------------------|--------|------------|------------|---------|----|----|----|-------|----|----|----|----|-------|----|
| 1   |      | 結構體工期                    | 1145 d | 2024/1/15  | 2027/3/20  |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 2   |      | 地下室工程                    | 537 d  | 2024/1/15  | 2025/7/12  |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 213 |      | 上部鋼構吊裝作業                 | 198 d  | 2025/6/11  | 2025/12/25 |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 214 |      | 第一區1~5line鋼構吊裝440塔吊      | 197 d  | 2025/6/11  | 2025/12/24 |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 215 |      | 塔吊安檢及核發(6/27取得合格證)       | 17 d   | 2025/6/11  | 2025/6/27  |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 216 |      | #4 1~5/D~G line          | 9 d    | 2025/6/28  | 2025/7/6   | 215     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 217 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/7/7   | 2025/7/8   | 216     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 218 |      | 電鉗                       | 14 d   | 2025/7/9   | 2025/7/22  | 217     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 219 |      | #5 1~5/D~G line (遇雨延後5天) | 21 d   | 2025/7/9   | 2025/7/29  | 217     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 220 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/7/30  | 2025/7/31  | 219     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 221 |      | 電鉗                       | 20 d   | 2025/8/1   | 2025/8/20  | 220     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 222 |      | #6 1~5/A~G line          | 21 d   | 2025/8/21  | 2025/9/10  | 221     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 223 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/9/11  | 2025/9/12  | 222     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 224 |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/9/13  | 2025/10/3  | 223     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 225 |      | #7 1~5/A~G line          | 18 d   | 2025/9/17  | 2025/10/4  | 223FS+4 |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 226 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/10/5  | 2025/10/6  | 225     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 227 |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/10/7  | 2025/10/27 | 226     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 228 |      | #8 1~5/A~G line          | 23 d   | 2025/10/7  | 2025/10/29 | 226     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 229 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/10/30 | 2025/10/31 | 228     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 230 |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/11/1  | 2025/11/21 | 229     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 231 |      | #9 1~5/A~G line          | 21 d   | 2025/11/1  | 2025/11/21 | 229     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 232 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/11/22 | 2025/11/23 | 231     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 233 |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/11/24 | 2025/12/14 | 232     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 234 |      | #10 1~5/A~G line         | 8 d    | 2025/11/24 | 2025/12/1  | 232     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 235 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/12/2  | 2025/12/3  | 234     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 236 |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/12/4  | 2025/12/24 | 235     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 237 |      | 第二區6~10line鋼構吊裝600塔吊     | 182 d  | 2025/6/27  | 2025/12/25 |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 238 |      | 塔吊安檢及核發(7/18取得合格證)       | 22 d   | 2025/6/27  | 2025/7/18  |         |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 239 |      | #4 5~10/D~G line         | 13 d   | 2025/7/19  | 2025/7/31  | 238     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 240 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/8/1   | 2025/8/2   | 239     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 241 |      | 電鉗                       | 14 d   | 2025/8/3   | 2025/8/16  | 240     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 242 |      | #5 5~10/D~G line         | 13 d   | 2025/8/3   | 2025/8/15  | 240     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 243 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/8/16  | 2025/8/17  | 242     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 244 |      | 電鉗                       | 14 d   | 2025/8/18  | 2025/8/31  | 243     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 245 |      | #6 5~10/D~G line         | 23 d   | 2025/8/18  | 2025/9/9   | 243     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 246 |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/9/10  | 2025/9/11  | 245     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |
| 247 |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/9/12  | 2025/10/2  | 246     |    |    |    |       |    |    |    |    |       |    |

結構體工期

塔吊安檢及核發(6/27取得合格證)

#4 1~5/D~G line

校正及鎖斷

電鉗

#5 1~5/D~G line (遇雨延後5天)

校正及鎖斷

電鉗

#6 1~5/A~G line

校正及鎖斷

電鉗

#7 1~5/A~G line

校正及鎖斷

電鉗

#8 1~5/A~G line

校正及鎖斷

電鉗

#9 1~5/A~G line

校正及鎖斷

電鉗

#10 1~5/A~G line

校正及鎖斷

電鉗

第二區6~10line鋼構吊裝600塔吊

塔吊安檢及核發(7/18取得合格證)

#4 5~10/D~G line

校正及鎖斷

電鉗

#5 5~10/D~G line

校正及鎖斷

電鉗

#6 5~10/D~G line

校正及鎖斷

電鉗

第 1 頁




(2025.09-2025.11)三月施工進度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2025/09/14

2025/9~2025/11工期預定進度表

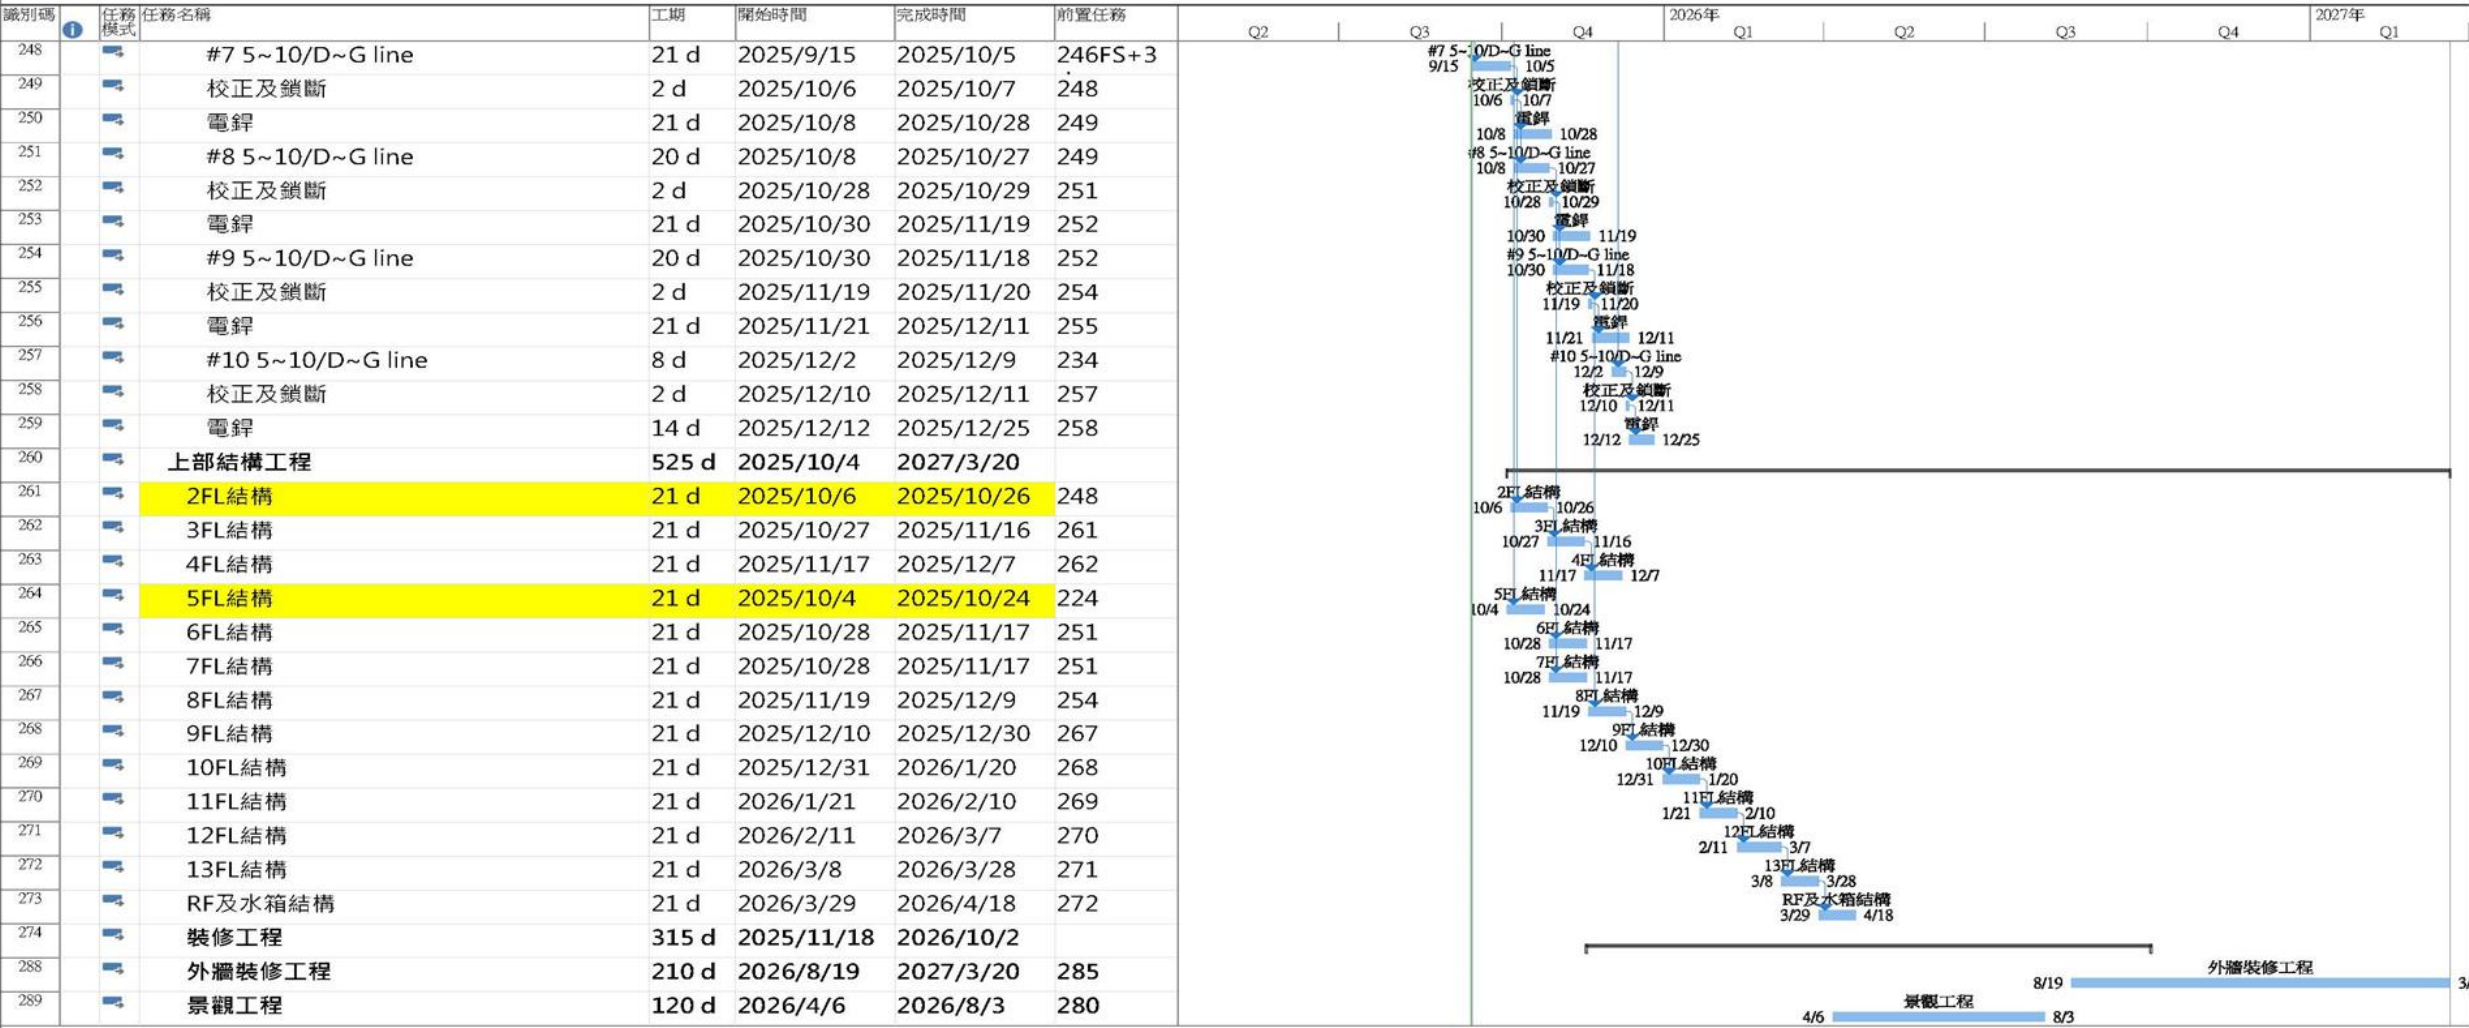



# 參、上週工程施工照片



說明：工地空拍照。



說明：鋼構吊裝作業。



說明：收費機處試挖。



說明：鋼承板鋪設。



# 參、上週工程施工照片



說明：牆面噴漆。



說明：地下室拉線作業。



說明：預埋管路配設。



說明：工區整理整頓。

簡報結束，謝謝
