

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

05月月會暨第280次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：115 年 05 月 19 日(星期二) 下午 02 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 115 年 5 月 16 日止，使用工期：1214 日曆天(不含免計工期 12 天)，剩餘 665 日曆天(展延工期 29 天)。
- 工程進度截至 115 年 5 月 16 日，預定進度 19.907%，實際進度 37.035%，超前進度：17.128%(約超前 172 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
結構體工程	115/11/20			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 土建工程：Y1~Y2, X3-1~C3-2 基樁 P5、P5A、P51 挖掘及鋼筋籠綁紮、10F 東側外牆鋼筋綁紮。
 2. 機電工程：1F/B1F 隔間配管電力、2F/3F 隔間給水配管、1F 輕隔間器具放樣配管、B3F 空調水管保溫施作。
 3. 安全監測：數據無異常。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為 9F~13F 內、外牆鋼筋綁紮、模板組立及 9F~11F 外牆混凝土澆置、B2F~4F 輕隔間施作、外牆樓層接縫防水工程、空橋-基樁工程，工程進度超前中。
2. 其他：

- (1) 建照變更等相關流程：經設計單位說明，臺中市政府預計於六月召開都審會議(本案為第一次變更)。
- (2) 樓層空間變更：7F 健檢中心已於 115/05/15 簽認完成、B2F 醫工部空間已於 115/05/18 簽認完成；經設計單位說明，預計於 115/07/07 提供相關細部設計圖說(含裝修、機電……等)。
- (3) 工程竣工驗收流程(詳後簡報 P. 6)：
 - A. 經工務室提醒，第九項(搬遷)、第 17 項(申請醫療許可)、第 18 項(衛生局申請勘驗)、第 19 項(衛生局現場勘查)等時程尚可再行調整以利縮短時程。
 - B. 承上，經主席裁示更動如下：
 - a. 將搬遷時程往前與點交日期同時啟動。
 - b. 將原 17 項及第 18 項合併管制(名稱更正為申請醫療許可\聯合勘驗)，並提前至 8 月啟動。
 - c. 原第 16 項停車場登記證改至追蹤表最下方。
 - d. 試營運日期提前至 117/12/01。
 - C. 綜上所述，會議中修正版本請詳後簡報 P. 7)。
- (4) 人行便道開放期程：經此次會議施工單位說明，因尚有部分施工作業受氣候影響延宕，施工作業時程需展延至 115/06/15(一)。經主席裁示同意。
- (5) 溫濕度監控系統：醫企部於 05/15 彙整完成，工務室於 05/18 上午提供(詳後簡報 P. 8-P. 9)，經各單位確認無誤，請設計單位依此表格進行評估。
- (6) 臨時動議(選色選樣)：經本次會議主席決議，本案診間木質門美耐板色號採用 3009 號、櫥櫃把手採用 C814-96/BSN 樣式。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

伍、散會(下午 03 時 00 分)

陸、會議照片







臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
115年5月份工程月會報暨第280次專業技術協調會
會議簽到表

壹、會議時間：115年5月19日(星期二)下午2時00分

貳、會議地點：行政大樓七樓會議室

參、主持人：李副院長 政鴻

肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院			
副院長			
主任秘書			
醫企部		醫工部	
工務室			
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司			
		  	
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所			
			
施工廠商-麗明營造股份有限公司			
			

第三醫療大樓新建工程

115年5月月會暨第280次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明

工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.19 (含展延工期)		
使用工期 (截至115.05.16止)	1214日曆天(不含免計工期12天)，剩餘 <u>665</u> 日曆天(展延工期29天)		
工程進度 (截至115.05.16止)	預計：19.907% 實際：37.035%	進度差	+17.128% (約超前172天)
目前工程施作項目	① 土建工程：Y1~Y2,X3-1~C3-2基樁P5、P5A、P51挖掘及鋼筋籠綁紮、10F東側外牆鋼筋綁紮 ② 機電工程：1F/B1F隔間配管電力、2F/3F隔間給水配管、1F輕隔間器具放樣配管、B3F空調水管保溫施作 ③ 安全監測：數據無異常		



進度追蹤

事項	辦況說明
建照變更	1. 設計單位已著手準備第四次建照變更相關文件。 2. 第四次建照變更作業資料，院方已用印完成，待施工單位結構體勘驗完成後即可啟動程序。 3. 目前辦況：依第272次專技會議，待樓層平面配置確認後修正(B2F醫工部)；另衛生局要求隔間及面積只要有任何變更，都需要辦理擴建計畫變更，否則不會同意建照變更。
部分空間 先行開放	1. 於115/03/26與院部長官進行空間配置變更研討會議時，院部長官同意本案原訂115/10/01部分開放使用計畫暫緩，待後續變更設計進度及行政跑照流程後另議。 2. 經檢討後流程如下： <pre>graph LR; A[設計單位提送平面配置圖 115/05/15] --> B[設計單位繪製細部設計圖說+專管單位/院方審圖 6月上旬-7月底]; B --> C[消防送審 8月初-11月底]; C --> D[現場施工 30-40天]; E[現場檢查 30-45天] --> F[農曆年前取得部分使照]; F --> G[停車場登記證]; G --> H[部分驗收開放使用];</pre>
樓層配置 變更	目前辦況如下： 1. 7F健檢中心已於115/05/15簽認完成。 2. B2F醫工部空間已於115/05/18簽認完成。

進度追蹤

事項	辦況說明
人行便道	1. 於第277次專技會議決議人行便道開放期程展延至115/06/01(一)開放通行。 2. 請施工單位說明目前的施工作業進度，並評估是否能按原定開放目標使用。




- 預計於115/05/30完成施工作業，排定於115/06/01(一)開放通行


變更設計待確認項目

項目	目前辦況
全棟-溫溼度監控系統	● 護理部於114/7/22提供本案大樓需裝設溫濕度、噪音等監控功能之需求並簽認 ● 醫企部於115/05/15彙整完成，工務室於115/05/18上午提供予專管/設計監造單位(詳後附件)
機電-氣送/高速傳送系統	● 氣送/高速傳送系統規劃已經院部長官拍板定案，預算尚未有支應款(納入四變，預計由長青分院支應工程款) ● 115/4/14院方提供氣送系統設備與中央監控系統整合需求規範資料供參，已提供給設計單位 ● 設計監造單位於115/05/13回覆，考量兩者系統因軟體技術性營業秘密及開放權限等問題，爰建議氣送設備商應提供「乾接點」與中央監控系統整合
B2F-醫工部空間	● 115/5/13第279次專技會議進行需求確認。 ● 已於115/05/18簽認完成
7F設置健檢中心	● 115/5/14院部會議再行提報圖面 ● 已於115/05/15簽認完成，請設計單位於115/06/01前提供平面配置圖

工程竣工進度規劃

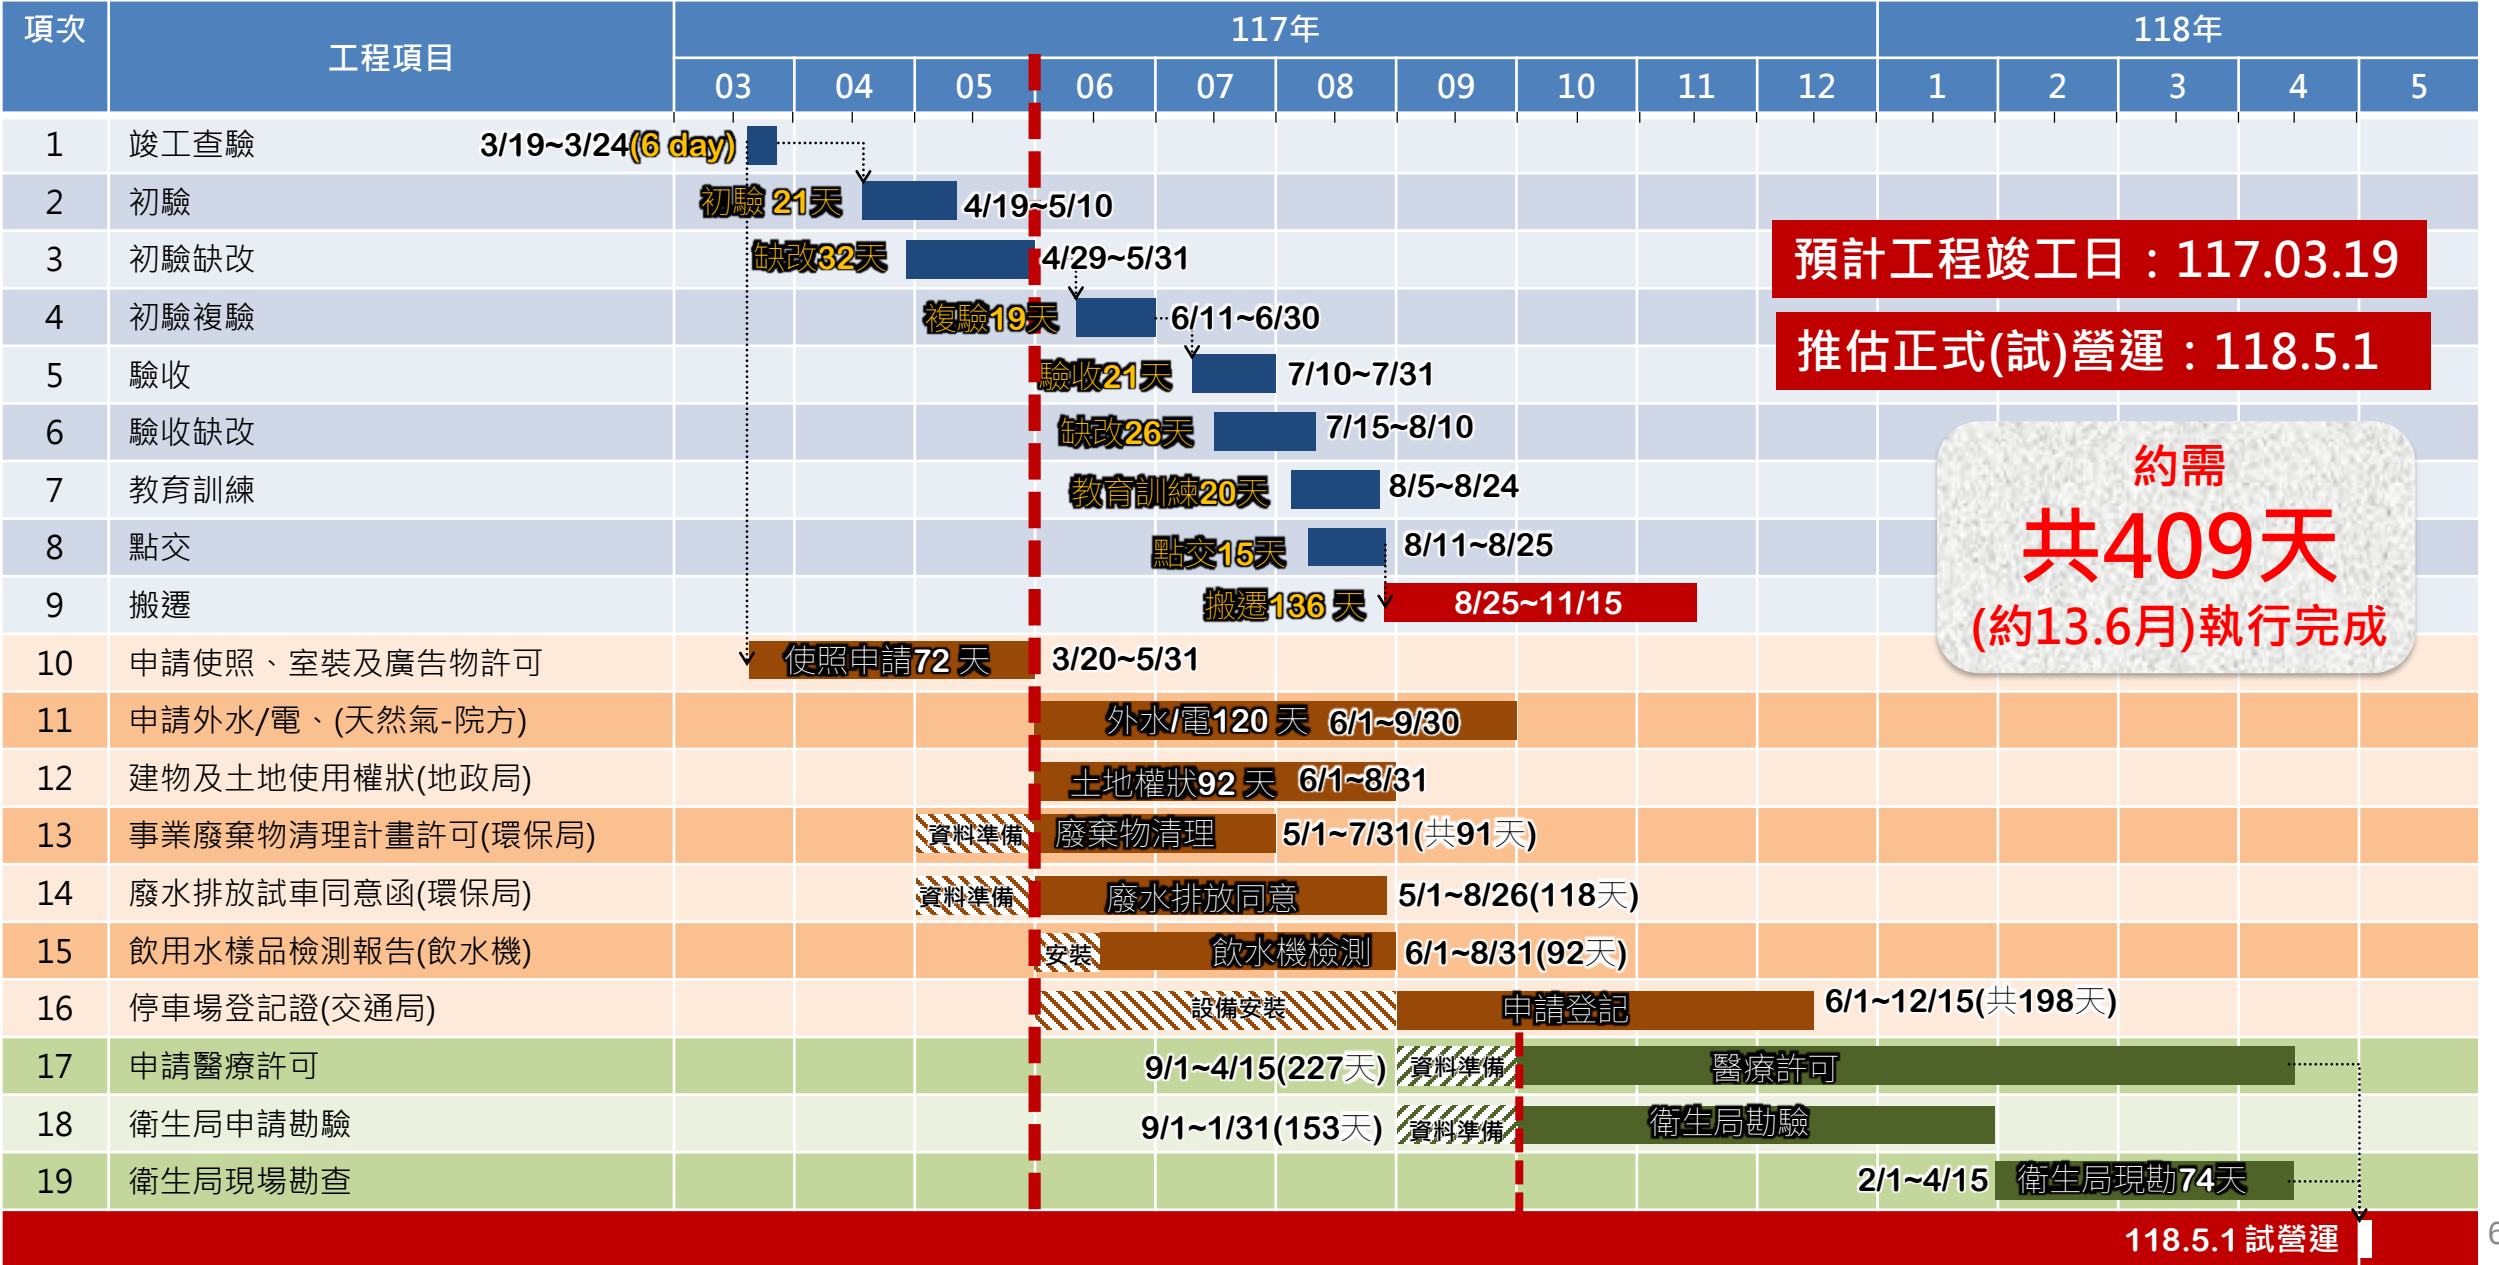

工程竣工進度規劃(會議修正版)

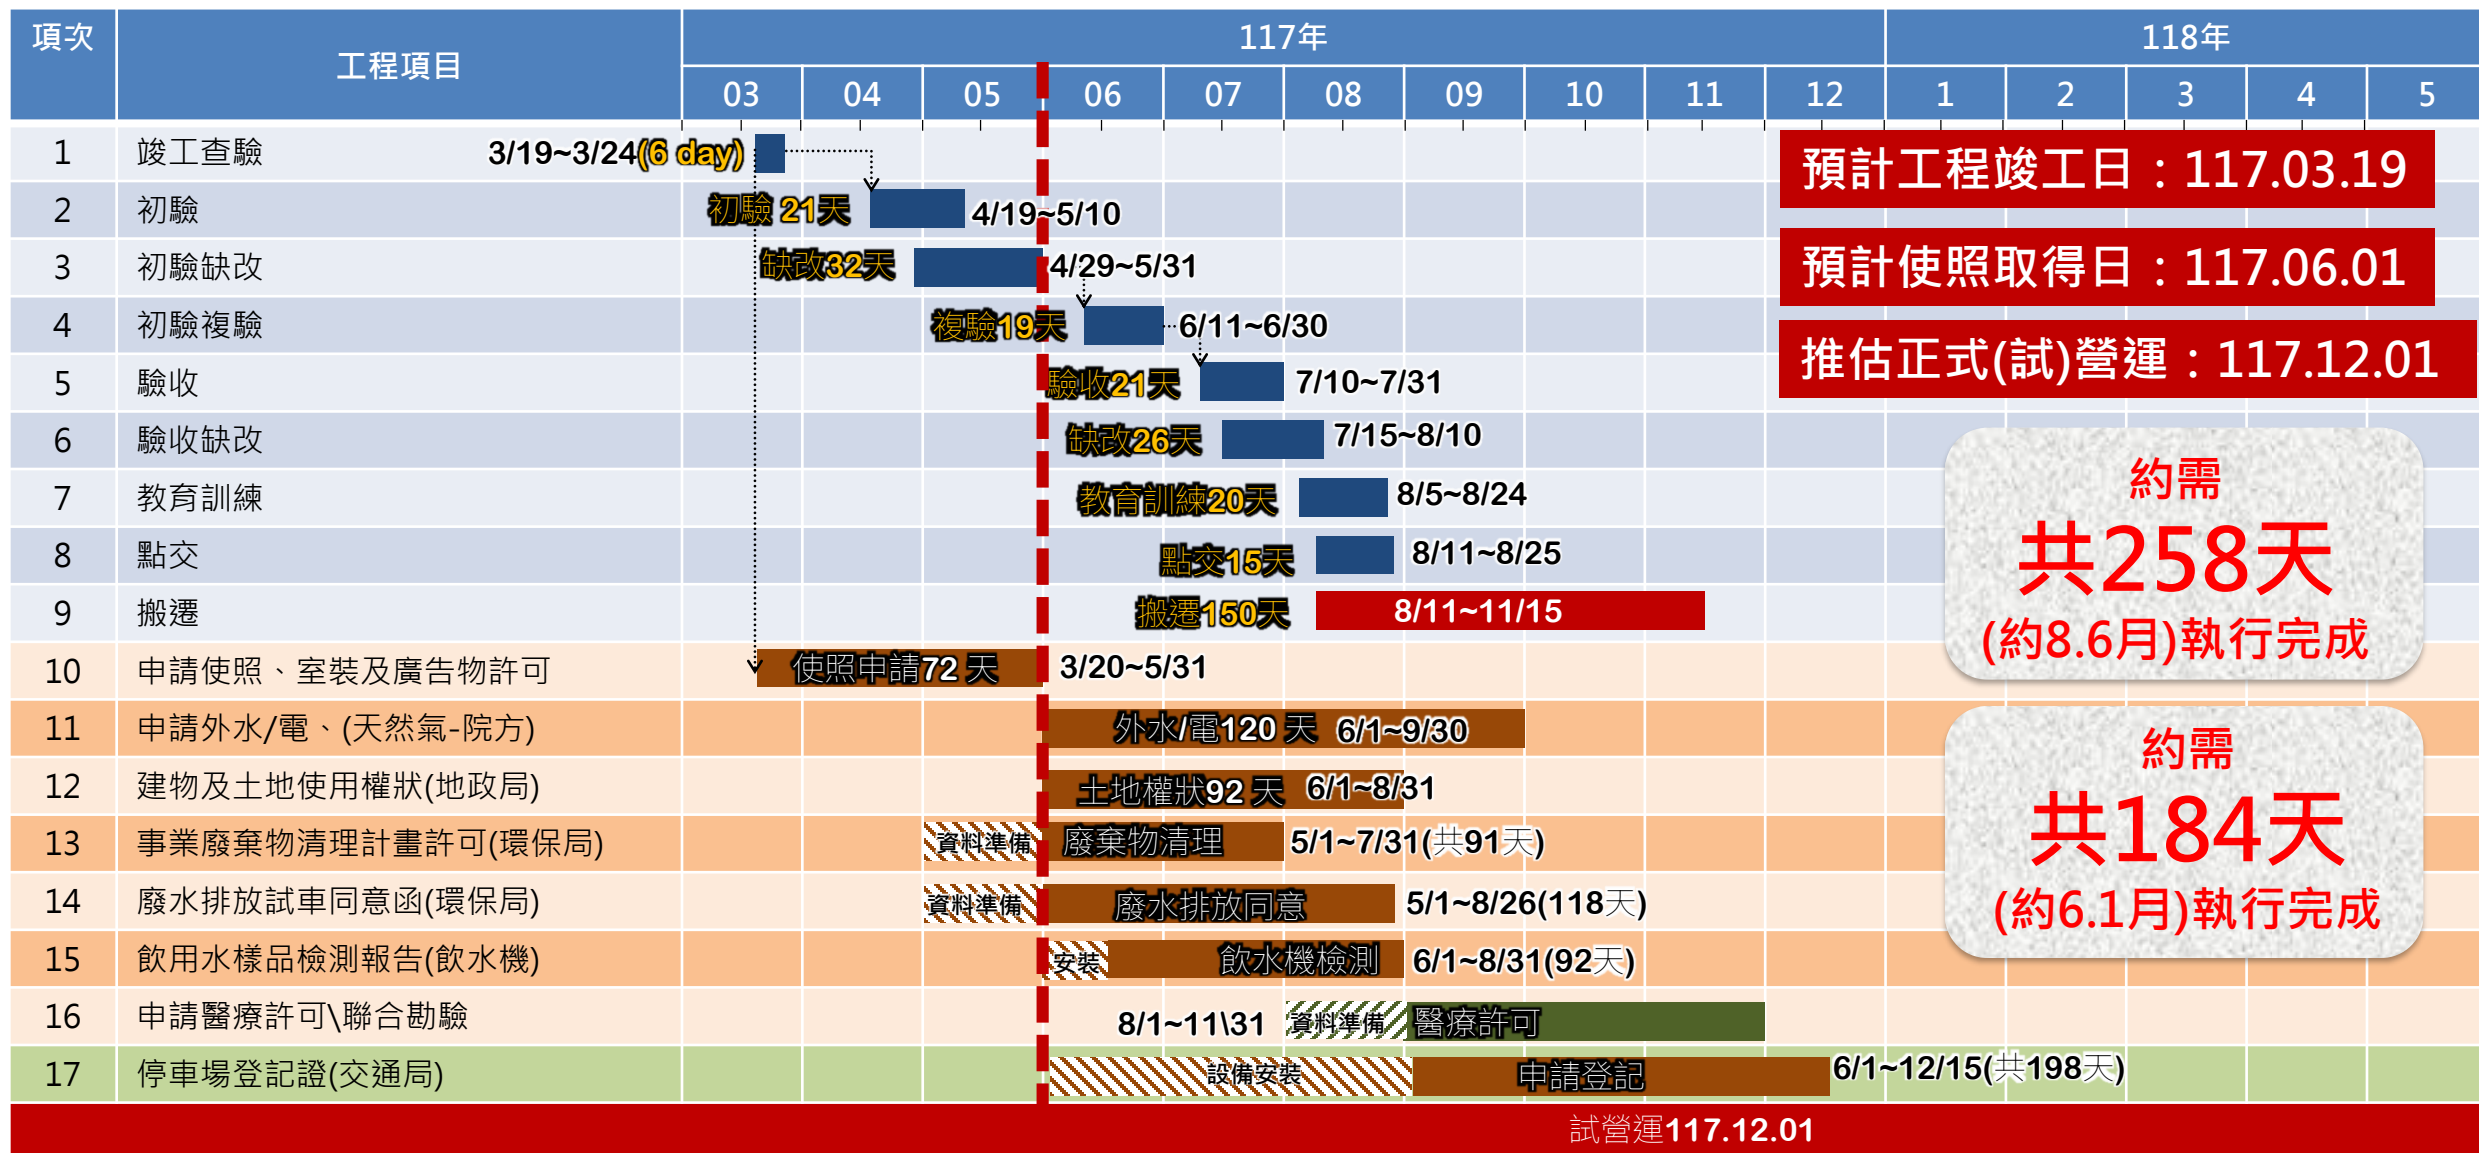

議題追蹤-溫濕度監控系統彙整

- 醫企部於05/15彙整完成，工務室於05/18上午提供。
- 本次會議確認無誤後將以此版本進行後續評估檢討作業。

臺中榮總長青分院 溫度、濕度、壓力、二氧化碳、分貝計設備調查表 (115.05調查/確認)																		
樓層	主責單位	用途	1.無需求	2.有需求 (續填3、4項)	3.需求項目						4.安裝位置						安裝位置總數量	
					溫度	濕度	壓力	分貝計	CO2	1	2	3	4	5	小計			
					監測	控制	監測	監測	監測							監測		
B2	護理部	CSR		V	V		V	V	V		B2115 清洗去污區	B2118消毒打包區				2	7	
				V	V		V	V		B2129無菌品儲藏室	B2130發件區	B2133無菌物品儲藏區	B2132待涼區	B2114前室	5			
	藥學部	藥品儲存/調劑		V		V	V			B2247藥品庫存區	B2246針劑藥品儲藏室	B2099調劑區前	B2099調劑區後		4	6		
				V		V	V			B2249自動化療調劑區	B2096製劑室				2			
	營養室	配膳		V	V		V			B2140配膳區						1	2	
				V	V		V		V	B1240A洗碗區						1		
B1	門診部	OPD		V	V		V			V	B1276候診區	B1250候診區				2	2	
	影像醫學部	影像檢查	V													0	0	
1F	門診部	OPD		V	V		V			V	1221候診區	1203候診區				2	3	
				V	V		V			1230儲藏室					1			
	急診部	ER		V	V		V			V	1247急診留觀區	1245急診檢傷站				2	2	
	藥學部	藥品儲存/交付		V		V	V				1070藥局					1	1	
	病檢部	血庫		V	V	V	V				1235血庫	1237儲藏室				2	2	
2F	護理部	OR		V	V		V	V			2278手術房間	2279手術房間	2280手術房間	2281手術房間		4	13	
				V	V		V			2258儲藏室	2270器械清洗室	2264儲藏室	2237儲藏室		4			
				V	V		V			V	2201家屬等候區					1		
		POR		V	V		V			2220恢復室	2221儲藏室				2			
		PPC		V	V		V		V	2262術前準備中心						1		
				V	V		V			2260準備室						1		
	心臟內科	心導管室		V	V	V	V			V	2241~2248心導管室	2204、2223、2224、2249、2250、2251、2252、2253、2254機房	2228、2229、2230、2231、2232、2233、2234、2235、2236儀器儲藏室			26	29	
		超音波室		V	V	V	V				2205	2207報告室				2		
		心電圖室		V	V	V	V				2206					1		
		麻醉部	麻醉作業		V	V		V			2268儲藏室					1		1
3F	護理部	OR		V	V		V	V			3226~3243(手術房間)					18	33	
				V	V		V	V			3223負壓前室	3224負壓前室				2		
				V	V		V				3225儲藏室	3246器械清洗室	3245內視鏡儲藏	3244包布儲藏室	3049 station	5		
				V	V		V				3052切片標本室	3047入OR前室	3090衛材儲藏室	3094藥局	3091藥局前室	5		
				V	V		V			V	3201家屬等候區							1
		POR		V	V		V				3205恢復室	3212準備室						2
				V	V		V											

議題追蹤-溫濕度監控系統彙整

- 醫企部於05/15彙整完成，工務室於05/18上午提供。
- 本次會議確認無誤後將以此版本進行後續評估檢討作業。

臺中榮總長青分院 溫度、濕度、壓力、二氧化碳、分貝計設備調查表 (115.05調查/確認)																	
樓層	主責單位	用途	1.無需求	2.有需求 (續填3、4項)	3.需求項目						4.安裝位置						安裝位置總數量
					溫度		濕度	壓力	分貝計	CO2	1	2	3	4	5	小計	
					監測	控制	監測	監測	監測	監測							
	藥學部	藥品儲存/調劑		V		V	V				3094藥局					1	1
	麻醉部	麻醉作業		V	V		V				3208麻醉儲藏室	3209麻醉工作區				2	2
4F	護理部	OR		V	V		V	V			4228~4245(手術房間)					18	33
				V	V		V			4227儲藏室	4221切片標本室	4218 station	4217入OR前室	4216 OPD準備室	5		
				V	V		V			4257藥局前室	4258儲藏室	4259衛材儲藏室	4252保留空間	4247包布儲藏室	5		
				V	V		V			4248內視鏡儲藏室	4250器械清洗室				2		
				V	V		V		V	4201家屬等待區					1		
			V	V		V			4205恢復室	4207準備室				2			
	麻醉部	麻醉作業		V	V		V			4208麻醉儲藏室	4209麻醉工作區				2	2	
5F	護理部	ICU		V	V		V			5127儀器室	5321準備室	5268醫材儲藏室	5286準備室	5289儲藏室	5	26	
				V	V		V			5290儲藏室	5298醫材儲藏室	5258儲藏室	5251醫材儲藏室	5213儲藏室	5		
				V	V		V			5081儀器室	5323醫材儲藏室	5226儲藏室	5215準備室	5229準備室	5		
				V	V		V			5040儲藏室	5041準備室				2		
				V	V		V	V		5312正壓13	5313正壓14	5033負壓1	5034負壓2	5035負壓3	5		
		V	V		V	V		5036負壓4	5037負壓5	5038負壓6			3				
	RO間		V	V		V			5296 RO間					1			
6F	護理部	病房		V	V		V		V	6102護理站						1	10
			V	V		V			6104準備室	6105儀器室	6107醫材儲藏室	6085儀器室		4			
		PAC病房		V	V		V		V	6042護理站					1		
			V	V		V			6045儀器室	6047醫材儲藏室	6044準備室	6215儀器室		4			
	復健醫學部	復健治療		V	V		V		V	物理治療室	職能治療室				2	3	
			V	V		V			水療室					1			
7F	護理部	健康管理中心		V	V		V		V	V	報到櫃台					1	16
				V	V		V			內視鏡儲藏區(7間)	儲藏室(7間)				14		
				V	V		V	V		消毒處理區					1		
8F	護理部	病房		V	V		V		V	8087護理站	8032護理站				2	10	
				V	V		V			8089準備室	8090儀器室	8092醫材儲藏室	8102儀器室		4		
				V	V		V			8034準備室	8035儀器室	8037醫材儲藏室	8047儀器室		4		
9F	護理部	病房		V	V		V		V	9087護理站	9032護理站				2	10	
				V	V		V			9089準備室	9090儀器室	9092醫材儲藏室	9102儀器室		4		
				V	V		V			9034準備室	9035儀器室	9037醫材儲藏室	9047儀器室		4		
10F	護理部	病房		V	V		V		V	10087護理站	10032護理站				2	10	
				V	V		V			10089準備室	10090儀器室	10092醫材儲藏室	10102儀器室		4		
				V	V		V			10034準備室	10035儀器室	10037醫材儲藏室	10047儀器室		4		
11F	護理部	病房		V	V		V		V	11090護理站	11036護理站				2	7	
				V	V		V			11093儀器室	11094準備室				2		
				V	V		V			11040儀器室	11039準備室	11042醫材儲藏室			3		
12F	護理部	病房		V	V		V		V	12090護理站	12036護理站				2	7	
				V	V		V			12093儀器室	12094準備室				2		
				V	V		V			12040儀器室	12039準備室	12042醫材儲藏室			3		
各項需求總計					64	8	67	10	12	9	安裝位置總數量					238	238

職安衛安全管理

職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	請施工團隊落實要求高空作業車作業時應確實使用安全帶及安全帽，避免因重心失穩墜落造成重大職業災害。
4	配合室內隔間工程施工，請施工團隊檢討室內空間設置足夠之照明燈具，確保安全。
5	近日對流雲系發展旺盛，有短延時強降雨發生機率，請施工團隊妥為因應，避免降雨造成工區室內工程淹/積水現象，確保施工環境及工程品質。

請設計監造單位接續簡報~
謝謝

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年6月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 審查中	專管 核定中	機關 備查中		
分項施工計畫	120	119	0	0	0	119	0

1. 「玻璃隔屏工程分項施工計畫」：(管制提送時間：6月1日)

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已核定	逾期送審
			監造 審查中	專管 審定中	機關 核定中		
材料/設備送審	168	164	4	3	2	155	0

1. 「弱電材料(資訊插座、收容箱)」：監造：譚余中榮字第1150504003號函審合宜 專管：銘建(榮)字第1150507008號審定 院方：核定中
2. 「廚房設備」：監造：譚余中榮字第1150430001號函審合宜 專管：銘建(榮)字第1150504004號審定 院方：核定中
3. 「防撞護牆板」：麗明：麗字第1150300258號函提送 監造：譚余中榮字第1150331002號函審退(申請7月31日前重新提送)
4. 「抗菌工業地坪」：麗明：麗字第1150300272號函提送 監造：譚余中榮字第1150402003號函審退(申請展延至5月22日重新提送)
5. 「空調-送排風機、斜流扇等設備」：專管：銘建(榮)字第1150507007號審定 院方：中榮工字第1159916464號函核定 **本項解管**
6. 「花崗石材」：麗明：麗字第1150400144號函提送 監造：譚余中榮字第1150423001號函審退(申請6月22日前重新提送)
7. 「空調-自動控制工程」：麗明：麗字第1150400190號函提送 監造：譚余中榮字第1150506001號函審退(5月20日重新提送)
8. 「感染垃圾冷凍庫」：麗明：麗字第1150500046號函提送 監造：譚余中榮字第1150508005號函審合宜 專管：審定中
9. 「油水分離器、全自動反洗雜質過濾器、油脂截留器」：麗明：麗字第1150500079號函提送 監造：譚余中榮字第1150512002號函審合宜 專管：審定中
10. 「偵煙局限型探測器、自動閉鎖器」：麗明：麗字第1150500080號函提送 監造：譚余中榮字第1150512003號函審合宜 專管：審定中
11. 「外牆抵石子材料」：(管制提送時間：6月1日)
12. 「浪型鋼板」：(管制提送時間：6月1日)
13. 「伸縮縫及蓋板」：(管制提送時間：6月1日)
14. 「熱浸鍍鋅格柵(含框座)」：(管制提送時間：6月1日)

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年6月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 核定中	專管 備查中	機關 備查中		
施工圖	95	93	0	2	0	91	0
1. 「空調工程配電盤承認圖(變更設計進版)」：麗明：麗字第1150500129號函提送 監造：譚余中榮字第1150515002號函審核定 專管：備查中 2. 「3F~5F內牆磁磚工程內牆磁磚工程分割施工圖」：麗明：麗字第1150500106號函提送 監造：譚余中榮字第1150515003號函審核定 專管：備查中 3. 「1F~RF天花板工程分割施工圖」：(管制提送時間：5月20日) 4. 「內牆磁磚工程分割施工圖」：(管制提送時間：6月10日)							

請施工單位接續簡報~
謝謝

本週及下週施工作業說明

本週(115年5月18日~115年5月24日)工程施工作業

1. 9F~13F內、外牆鋼筋綁紮、模板組立及9F~11F外牆混凝土澆置。
2. 5F~6F室內泥作粉刷施作；B2F~4F輕隔間施作；外牆鋁窗框及捲門安裝。
3. 東北側水保溝擋土設施及人行道施作(鋼軌樁襯板施作)。
4. 外牆樓層接縫防水工程。
5. 空橋-基樁工程。

下週(115年5月25日~115年5月31日)預定施工作業

1. 9F~13F內、外牆鋼筋綁紮、模板組立及9F~11F外牆混凝土澆置。
2. 6F~7F室內泥作粉刷施作；B2F~4F輕隔間施作；外牆鋁窗框及捲門安裝。
3. 東北側水保溝擋土設施及人行道施作(鋼軌樁襯板施作)。
4. 外牆樓層接縫防水工程。
5. 空橋-基樁工程。

三週施工進度表

業主: 臺中榮民總醫院
專案管理: 賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造: 譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商: 麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表

編 號	日 期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天 數	115 / 5 ~ 115 / 5																												備 註
		預定進度 ██████████	實際進度 ██████		上週進度							本週進度							下週進度														
					5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31								
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日								
一、	地上層裝修及結構工程	開始時間 114/3/27	完成時間 114/11/30	249																								B2F~4F及6F~7F裝修變更設計中					
1	1F~2F輕隔間立骨架	115/2/13 115/3/6	115/3/9	25																								變更設計中，1F~2F單封板					
2	3F~4F輕隔間立骨架	115/4/11 115/4/11	115/5/15	35																								變更設計中，3F~4F隔間骨架組立					
3	5F~8F內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/3/25 115/3/25	115/5/23	60																								8F西側外牆模板組立					
4	9F~RF內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/4/20 115/4/20	115/6/18	60																								10F東側外牆、南北側梯廳外牆鋼筋綁紮、10F東側造型梁底組模、11F內牆組模					
5	3F~6F室內牆面打底粉刷	115/4/20 115/4/20	115/6/18	60																								6F泥作打底粉刷					
6	第二區人工基樁施作	115/3/21 115/3/21	115/4/20	31																								空橋-基樁工程Y1~Y2, X3-1~C3-2基樁P5、P5A、P51挖掘及鋼筋籠綁紮					
7	東北側水保溝擋土設施施作	115/5/1 115/5/2	115/5/31	31																								東北側水保溝位置舊擋土牆打除、西南側土方搬運					
二、	地上層至5層機電工程 地下室機電工程(B2F-B1F)	開始時間 115/3/1 115/5/1	完成時間 116/4/30 115/8/15	426 107																								B2F、B1F部分變更設計中					
1	1F~2F給水管路施作	115/4/22 115/4/22	115/6/10	50																													
2	B6F自來水FRP水箱組裝	115/4/17 115/4/17	115/5/31	45																								挑高至B5F					
3	1F、2F弱電、電力線槽施作	115/4/22 115/4/22	115/5/31	40																													

三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表

編 號	日 期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天 數	115 / 5 ~ 115 / 5																												備 註																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		預定進度			上週進度							本週進度							下週進度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	一	二	三	四	五	六	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	1F-2F空調配管施作 (風管、水管、電管)	115/3/2	115/5/15	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(2026.3-2026.6)三月施工进度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/2/27

2026/3~2026/6三個月進度表

類別碼	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務
1	裝修及結構工程	425 d	2026/1/23	2027/3/31	
2	地上層內外牆結構體	142 d	2026/2/28	2026/7/19	
3	一樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28	
4	二樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28	
5	三樓牆面結構體	1 d	2026/2/28	2026/2/28	
6	四樓牆面結構體	8 d	2026/2/28	2026/3/7	
11	五樓牆面結構體	8 d	2026/3/8	2026/3/15	6
12	六樓牆面結構體	14 d	2026/3/16	2026/3/29	
17	七樓牆面結構體	14 d	2026/3/30	2026/4/12	12
18	八樓牆面結構體	14 d	2026/4/13	2026/4/26	17
19	九樓牆面結構體	14 d	2026/4/27	2026/5/10	18
20	十樓牆面結構體	14 d	2026/5/11	2026/5/24	19
21	十一樓牆面結構體	14 d	2026/5/25	2026/6/7	20
22	十二樓牆面結構體	14 d	2026/6/8	2026/6/21	21
23	十三樓牆面結構體	14 d	2026/6/22	2026/7/5	22
24	屋頂水箱及機房	14 d	2026/7/6	2026/7/19	23
25	內牆面泥作粉刷+RC牆門窗框安裝組立	139 d	2026/3/10	2026/7/26	
26	一樓	10 d	2026/3/10	2026/3/19	
29	二樓	14 d	2026/3/20	2026/4/2	26
30	三樓	14 d	2026/4/3	2026/4/16	29
31	四樓	14 d	2026/4/17	2026/4/30	30
32	五樓	14 d	2026/5/1	2026/5/14	31
33	六樓	14 d	2026/5/15	2026/5/28	32
34	七樓	10 d	2026/5/29	2026/6/7	33
35	八樓	10 d	2026/6/8	2026/6/17	34
36	九樓	10 d	2026/6/18	2026/6/27	35
37	十樓	10 d	2026/6/28	2026/7/7	36
38	十一樓	10 d	2026/6/15	2026/6/24	21FS+7 d
39	十二樓	10 d	2026/6/29	2026/7/8	22FS+7 d
40	十三樓	14 d	2026/7/13	2026/7/26	23FS+7 d
41	外牆粉刷工程	168 d	2026/3/30	2026/9/13	
42	東面	168 d	2026/3/30	2026/9/13	
55	西面	168 d	2026/3/30	2026/9/13	
68	防火披覆工程	116 d	2026/1/23	2026/5/22	
69	一樓	27 d	2026/1/23	2026/2/22	
72	二樓	8 d	2026/2/23	2026/3/2	71
73	三樓	8 d	2026/3/3	2026/3/10	72
74	四樓	8 d	2026/3/11	2026/3/18	73
75	五樓	8 d	2026/3/19	2026/3/26	74
76	六樓	8 d	2026/3/27	2026/4/3	75
77	七樓	7 d	2026/4/4	2026/4/10	76
78	八樓	7 d	2026/4/11	2026/4/17	77
79	九樓	7 d	2026/4/18	2026/4/24	78

(2026.3-2026.6)三月施工进度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/2/27

2026/3~2026/6三個月進度表

	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	2026年2月 2/1 2/8 2/15 2/22	2026年3月 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12 7/19 7/26 8/2 8/9 8/16 8/23 8/30 9/6 9/13 9/20 9/27 10/4 10/11 10/18 10/25
80	十樓	7 d	2026/4/25	2026/5/1	79		
81	十一樓	7 d	2026/5/2	2026/5/8	80		
82	十二樓	7 d	2026/5/9	2026/5/15	81		
83	十三樓	7 d	2026/5/16	2026/5/22	82		
84	室內輕隔間工程(含機電工程)	200 d	2026/3/9	2026/9/24			
85	一樓	28 d	2026/3/9	2026/4/5			
90	二樓	28 d	2026/3/13	2026/4/9			
91	三樓	28 d	2026/4/6	2026/5/3	85		
92	四樓	28 d	2026/4/10	2026/5/7	90		
93	五樓	28 d	2026/5/4	2026/5/31	91		
94	六樓	28 d	2026/5/8	2026/6/4	92		
95	七樓	28 d	2026/6/1	2026/6/28	93		
96	八樓	28 d	2026/6/5	2026/7/2	94		
97	九樓	28 d	2026/6/29	2026/7/26	95		
98	十樓	28 d	2026/7/3	2026/7/30	96		
99	十一樓	28 d	2026/7/27	2026/8/23	97		
100	十二樓	28 d	2026/7/31	2026/8/27	98		
101	十三樓	28 d	2026/8/28	2026/9/24	100		
102	天花板工程	215 d	2026/5/8	2026/12/8			
120	地坪裝修工程	271 d	2026/6/30	2027/3/31			
121	西側車道延續	69 d	2026/1/23	2026/4/5			
122	西側車道上方向連接教學大樓通道	12 d	2026/1/23	2026/2/3			
128	西側車道延伸工程	39 d	2026/2/4	2026/3/18			
129	舊友管路移除修改	16 d	2026/2/4	2026/2/23	127		
130	地坪破碎載運及開挖	10 d	2026/2/24	2026/3/5	129		
131	PC澆置	1 d	2026/3/6	2026/3/6	130		
132	測量放樣	1 d	2026/3/7	2026/3/7	131		
133	I樓梯基礎及車道版鋼筋綁紮、基礎螺栓預埋	6 d	2026/3/8	2026/3/13	132		
134	混凝土澆置	1 d	2026/3/14	2026/3/14	133		
135	I樓梯柱頭鋼柱+樓梯吊裝	4 d	2026/3/15	2026/3/18	134		
136	I樓梯外牆工程	18 d	2026/3/19	2026/4/5			

上週工程施工照片



說明：門窗嵌縫。



說明：工區整理整頓。



說明：空調風管安裝。



說明：消防管路補漆。

上週工程施工照片



說明：樓梯混凝土澆置。



說明：輕隔間封板。



說明：鋼筋間隔器安裝。



說明：筏基雜用水箱貼磚。

議題-木質門美耐板

議題追蹤-院部會議紀錄

- 115/03/26院部晨會紀錄

診間外牆配色比照院內門診候診區，並同意工務室建議調整門扇位置，以避免影響隔簾之設置與使用。



- 115/03/26院部晨會決議之色彩方案

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程			
選色選樣核章表			
材料名稱	木質門扇用美耐板		
送審編號	依據 114 年 5 月 14 日中榮工字第 1149916106 號(HA-045-B)函辦理		
用途	全棟一般木質門扇及防火木質門扇		
沙灘柚木(山)3017			
			
依據 114 年 7 月 16 日第 238 次專業技術協調會辦理			
	施工廠商	設計單位建議師建議色樣	專業管理單位建議
		沙灘柚木(山)3017	沙灘柚木(山)3017
核章欄	 	 	 

柚木 Teak




沙灘柚木 (山)
3017


原核定之木質門扇用美耐板

議題-櫥櫃把手

B1F樣品間採用C814-96/BSN

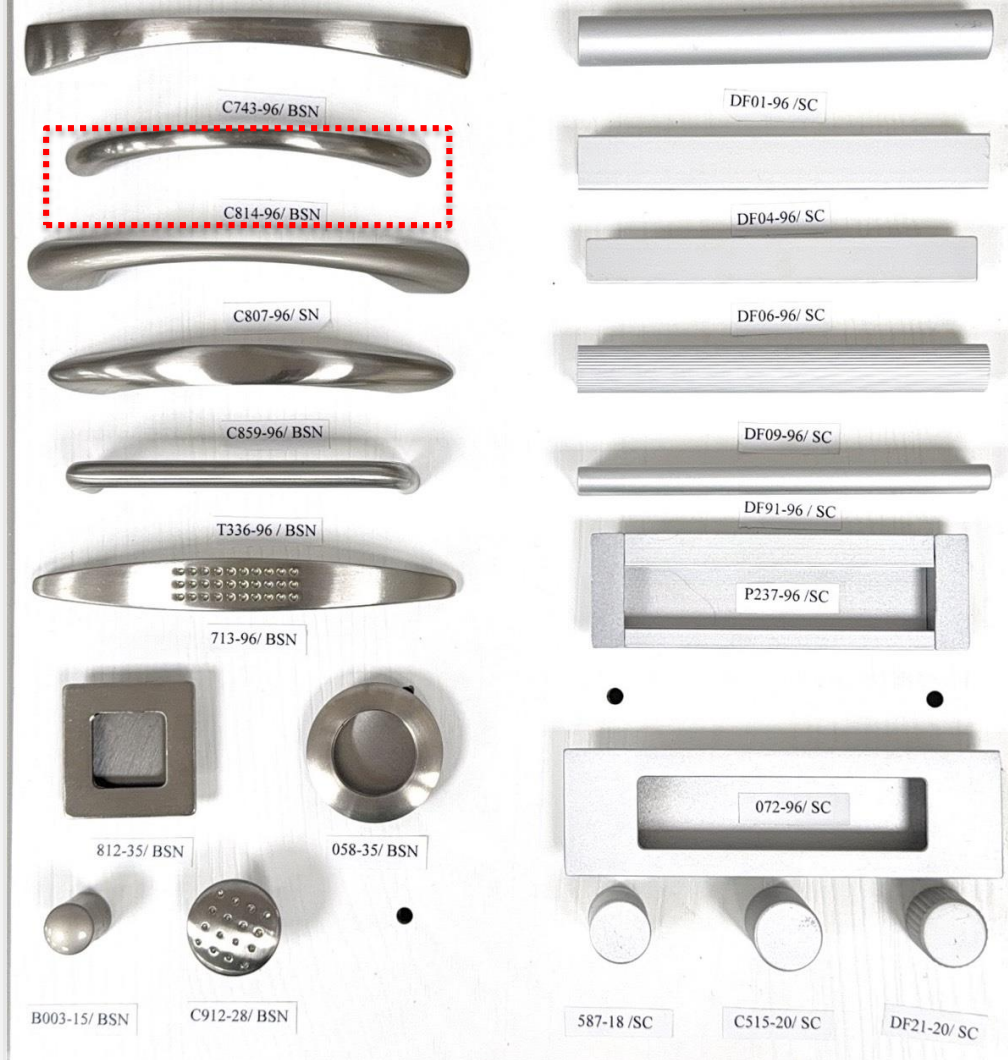

設計圖說

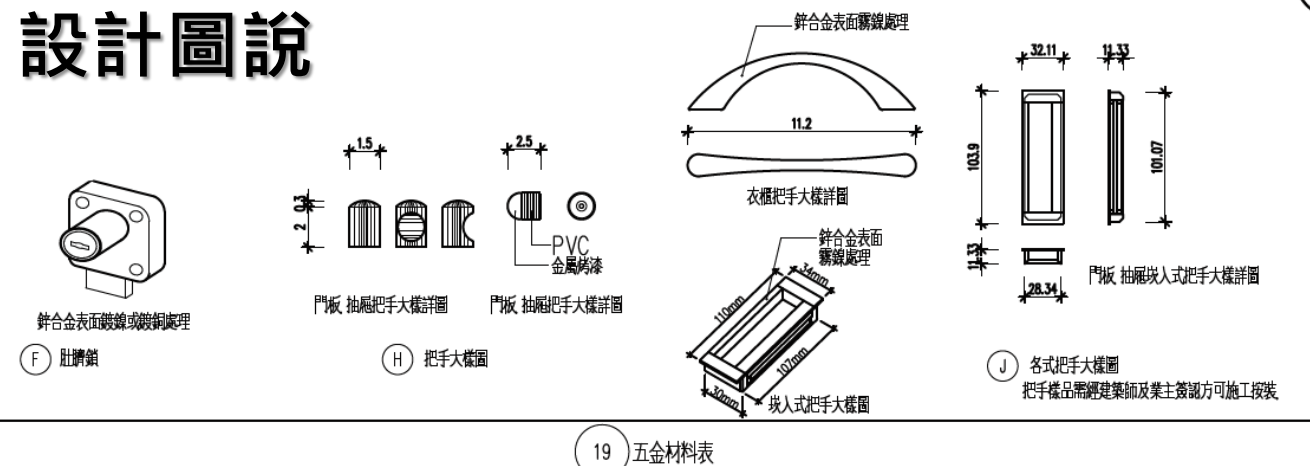

請問是否統一採用
C814-96/BSN
抑或依不同櫥櫃型
式另有選擇？

2026年2月5日

簡報結束，謝謝
