

# 臺中榮民總醫院

## 第三醫療大樓新建工程

### 10月月會暨第251次專業技術協調會

#### 會議紀錄

壹、會議時間：114 年 10 月 20 日(星期一) 下午 03 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓六樓 第一開標室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

#### 【工程進度】

- 截至 114 年 10 月 16 日止，使用工期：996 日曆天(不含免計工期 12 天)，剩餘 881 日曆天(展延工期 27 天)。
- 工程進度截至 114 年 10 月 16 日，預定進度 14.254%，實際進度 28.241%，超前進度：13.987%(約超前 203 天)。
- 期程規劃：

| 結構主要徑   | 網圖預定完成日期  | 實際趕進日期 | 差異天數 | 備註    |
|---------|-----------|--------|------|-------|
| 下構結構體工程 | 115/04/13 |        |      | 承商趕趕中 |

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
  1. 結構體工程：塔吊爬升後回補作業、安全網拉設、D 區#7 吊裝、斜撐螺栓穿鎖、A、B 區#7 電焊作業、D 區#6 電焊作業、5 樓剪力釘植焊、1F 西側車道鋼筋下料綁紮、2F 鋼線網進料及鋪設。
  2. 機電工程：B2F、B3F 照明、插座拉線，引導線結線、B6F 複壁排水配管施作、1F 牆南北側梯廳預埋配管。
  3. 安全監測：數據無異常。

#### 【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。

2. 依 113/09/26 第七次臺中市政府公共藝術審議委員會決議，本案未通過。目前進度：第五次執行小組會議已於 113/11/14(四)召開，專管單位將依會議決議修正後再行提請院方召開執行小組會議供委員審查。

### 【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為吊裝第八節鋼構梁柱及鋼樓梯、4F~5F 鋼承板鋪設及剪力釘施作、2F 鋼承板鋼網鋪設及東側車道版模板施作及鋼筋綁紮，工程進度超前中。
2. 期程相關：
  - (1) 建照變更：經設計單位說明，第三次建照變更補正文件已掛件，目標於 10/31 前取得。
  - (2) 部分空間先行開放：經本次會議討論後，主席決議本案目標於 115 年 7 月開放一樓以下樓層先行使用。
  - (3) 第二次變更設計：依第 248 次專技會議，第二次變更設計須召開審查會並邀請外部專家委員出席審議；經確認，審查會將於 114/11/11(二)上午召開。
  - (4) 圖說：
    - A. 空橋：經設計單位說明，與結構技師商討後方案如簡報 P.10-P.16，經主席決議請將修正後版本提至院部晨會予長官提報。
    - B. B2F 平面圖：經設計單位說明，第三次變更設計 B2F 規劃如簡報 P.18-P.19，並且使用單位陸續簽認中；經主席決議同意，以該配置進行後續細部規劃設計。
    - C. 第三次變更設計圖說：經設計單位說明，將於 114/10/28 提送本案全棟第三次變更設計書圖(不含天橋及預算部分)；經主席決議，請工務室(設計施工組)協助辦理聯合審查會，邀集各單位共同審查。
    - D. 門禁系統：依院部晨會紀錄，設計單位已檢討本案各層樓門禁系統規劃，經主席決議，請工務室(設計施工組)協助會辦至各使用單位簽認，並於 114/10/24 前完成。
  - (5) 外牆磁磚：本案外牆磁磚依院部晨會紀錄確認依院方後續修正版本辦理(該顏色符合院區色系)，並請廠商據此進行磁磚燒製作業。
  - (6) 電梯：經工務室(修護保養組)提供資訊及主席裁示，本案電梯決議如下：
    - A. 面板：控制面板內外側皆改為 LCD 顯示器。

B. 不斷電系統：比照院內既有電梯樣態，連接緊急供電系統即可，無須額外增設不斷電系統，第三次變更圖說須作修正。

C. 智能電梯規格比照第一醫療大樓電梯規格，請工務室(修護保養組)提供相關資訊。

(7) 其他：

A. 本年度預算為 12 億餘元，截至第 34 期已執行 11 億餘元，施工單位同意第 35 期及第 36 期估驗計價金額不足部分於 115 年 1 月辦理支付。

B. 國防部軍備局：依國防部軍備局中部地區工程營產處來函申請至本案工地觀摩參訪，經本次會議確認施工單位先前已知情並同意辦理。

#### 肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

#### 伍、散會(下午 03 時 40 分)

#### 陸、會議照片









臺中榮民總醫院  
第三醫療大樓新建工程  
114年10月份工程月會報暨第251次專業技術協調會  
會議簽到表

壹、會議時間：114年10月20日(星期一)下午3時00分

貳、會議地點：行政大樓六樓 第一開標室

參、主持人：李副院長 政鴻

肆、出(列)席單位及人員：

|                                                                                      |                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 臺中榮民總醫院                                                                              |                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                |
| 副院長                                                                                  |     |     |                                                                                                                                                                                |
| 主任秘書                                                                                 |     |     |                                                                                                                                                                                |
| 醫企部                                                                                  |    | 醫工部 |                                                                                            |
| 工務室                                                                                  |  |     |                                                                                                                                                                                |
| 專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司                                                            |                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                      |     | <br> |
| 規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所                                                         |                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                |
| 施工廠商-麗明營造股份有限公司                                                                      |                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                |



# 第三醫療大樓新建工程

## 114年10月月會暨第251次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司  
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所  
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

# 工進說明

|                        |                                                                                                                                                                                              |          |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 工程開工日                  | 112.01.03                                                                                                                                                                                    |          |                    |
| 契約規定工期                 | 1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)                                                                                                                                                   |          |                    |
| 契約完工日期                 | 117.03.17                                                                                                                                                                                    | 目標第一階段開放 | 115年7月31日          |
|                        |                                                                                                                                                                                              | 目標整體完工日期 | 116年3月19日          |
| 使用工期<br>(截至114.10.16止) | 996日曆天(不含免計工期12天)，剩餘881日曆天(展延工期27天)                                                                                                                                                          |          |                    |
| 工程進度<br>(截至114.10.16止) | 預計：14.254%<br>實際：28.241%                                                                                                                                                                     | 進度差      | +13.987% (約超前207天) |
| 目前工程施作項目               | <div>① 結構體工程：塔吊爬升後回補作業、安全網拉設、D區#7吊裝、斜撐螺栓穿鎖、A、B區#7電焊作業、D區#6電焊作業、5樓剪力釘植焊、1F西側車道鋼筋下料綁紮、2F鋼線網進料及鋪設</div> <div>② 機電工程：B2F、B3F照明、插座拉線，引導線結線、B6F複壁排水配管施作、1F牆南北側梯廳預埋配管</div> <div>③ 安全監測：數據無異常</div> |          |                    |



# 本案三週進度表

業主:臺中榮民總醫院  
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司  
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所  
承包商:麗明營造股份有限公司

## 臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表

| 編號  | 日期<br>三週進度<br>綱圖時程<br>作業內容 | 起始日       | 完成日       | 天數  | 114 / 10 ~ 114 / 11 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  | 備             | 註 |  |  |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|---------------|---|--|--|
|     |                            |           |           |     | 上週進度                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 本週進度  |       |       |       |       |       | 下週進度  |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            |           |           |     | 10/13               | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 |  |               |   |  |  |
|     |                            |           |           |     | 一                   | 二     | 三     | 四     | 五     | 六     | 日     | 一     | 二     | 三     | 四     | 五     | 六     | 日     | 一     | 二     | 三     | 四     | 五     | 六    | 日    |  |               |   |  |  |
| 一、  | 地上層結構工程                    | 預定進度      |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 實際進度      |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/3/27  | 114/11/30 | 249 |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 1   | #7鋼構梁柱吊裝及電焊                | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/9/17  | 114/10/18 | 32  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/9/16  | 114/10/20 | 35  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 2   | #8鋼構梁柱吊裝及電焊                | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/10/23 | 114/11/16 | 25  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            |           |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 3   | 2F~5F鋼承板鋪設及剪力釘施作           | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  | 配合吊裝修正進度10/24 |   |  |  |
|     |                            | 114/9/8   | 114/10/24 | 47  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/9/8   |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 4   | 2FL~5FL點銲鋼線網鋪設及混凝土澆置       | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  | 10/16進料       |   |  |  |
|     |                            | 114/10/16 | 114/11/15 | 31  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/10/16 |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 5   | 1F鋼網牆及鋼筋綁紮                 | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/10/18 | 114/11/15 | 29  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            |           |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 二、  | 地下室裝修工程                    | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/7/16  | 114/12/30 | 168 |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            |           |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 1   | B2F~B1F輕隔間工程               | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  | 修正10/24進場放樣   |   |  |  |
|     |                            | 114/10/24 | 114/11/30 | 38  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            |           |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 2   | B3F~B6F電力照明及插座拉線           | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/8/5   | 114/11/12 | 100 |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/8/5   |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 3   | B3F~B6F複壁排水                | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/9/5   | 114/11/14 | 71  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/10/10 |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 4   | B6F~B2F消防水配管               | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/9/3   | 114/10/31 | 59  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/9/3   |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 5   | B2F~B5F宅內電信箱配置安裝           | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/10/3  | 114/10/12 | 10  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/10/3  | 114/10/12 | 10  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 6   | B3F~B6F電信線槽吊子安裝            | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/10/15 | 114/10/30 | 16  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            |           |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 7   | B6F~B3F空調水系統配管             | 開始時間      | 完成時間      |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            | 114/10/20 | 114/11/18 | 30  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
|     |                            |           |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |
| 附註： |                            |           |           |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |  |               |   |  |  |

# 進度追蹤

| 事項            | 辦況說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建照變更          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 依第245次專技會議，經評估若長青分院於114年10月核准後，第四次建照變更行政流程至少仍需14.5個月。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 部分空間<br>先行開放  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 經與都發局詢問後，需先依《建築物部分使用執照核發辦法》第三條第一項第三點：「高度超過三十六公尺或十二層樓以上，或建築面積超過八〇〇〇平方公尺以上之建築物，其中任一樓層至基地地面間各層業經施工完竣。」檢討本案狀況。</li><li>2. 院方已於114/03/04發文請示中央機關(內政部國土署)解釋法律定義。</li><li>3. 依都發局於114/03/13之公文說明，本案涉及個案事實認定，仍須請建築師依規檢討辦理。</li><li>4. 依第221次專技會議，本案將於完成建照變更後依規申請B6F至1F各樓層經施工完竣之部分使用執照。</li><li>5. 依第248次專技會議，配合院方後續整體規劃，本案目標於115年7月部分空間先行使用。</li></ol> |
| 第二次變更<br>設計預算 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 設計單位於114/09/19提送補正之第二次變更設計預算資料，專管單位於114/09/26轉呈院方。</li><li>2. 依第248次專技會議，第二次變更設計須召開審查會並邀請外部專家委員出席審議。</li><li>3. 經確認，審查會將於114/11/11(二)上午十點召開。</li></ol>                                                                                                                                                                                         |
| 空橋            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 於114/10/09各單位及結構技師共同進行研討，須請技師重新檢視結構設計。</li><li>2. 請設計單位說明目前辦況。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 職安衛安全管理

## 職安衛安全管理

|   |                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。                                                                             |
| 2 | 本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。                                                            |
| 3 | 請施工團隊落實要求塔吊操作人員於攀爬上塔吊作業時應確實使用安全帶及安全帽，避免因重心失穩墜落造成重大職業災害。                                                                              |
| 4 | 地上 2~3 樓底板(鋼承板)已完成大部分鋪築，針對樓板邊緣或角落等鋼承板未滿鋪之區域，請加強開口安全防護措施(安全護欄或隔離、警示措施)之巡檢；另工區內仍偶見施工人員於鋼樑上行進時，雖已穿戴背負式安全帶，惟未確實勾掛於安全母索上，請持續加強巡檢及宣導，確保安全。 |
| 5 | 地下室部分梯廳牆壁灌漿後拆模面殘存雜物(零模、鐵件、填塞物等)，請施工團隊派員巡檢並即時清除，確保後續施工品質。                                                                             |



# 議題追蹤-院部會議紀錄

## 期程規劃

第三醫療大樓規劃於116年3月工程竣工，116年6月大樓啟用，請重新提送工程施工進度表。

## 門扇規格

請逐層與各單位確認門扇規格及需求項目全面盤點(例如是否設置電動門、門禁系統、對講機等)

## 外牆磁磚

第三醫療大樓外牆磁磚請醫院方後續修正版本辦理(該顏色符合院區色系)，並請廠商據此進行磁磚燒製作業。

## 空橋設計

第三醫療大樓空橋設計，請廠商召集結構技師再檢視確認結構，以利橋墩基座定位及橋面外觀設計

## 議題討論-電梯規格

- 原依第246及第247次專技會議確認本案電梯外側控制面板由LED顯示器改為LCD顯示器、內部維持LED顯示器。
- 惟施工單位於114/10/07提送之《電梯工程(含電扶梯)施工圖第二版BG-01-041-B》送審文件中回覆意見提及「全電梯由LED顯示器改為LCD顯示器，**其系統顯示需要一致，故內外側皆改為LCD顯示器**」
- 請示主席是否同意此項變更。


# 議題討論-門禁

依院部晨會紀錄，設計單位已檢討本案各層樓門禁系統(詳附件)

全棟所有污物室及無障礙廁所

皆為自動門(兩側手感應控制)

## B2F平面圖

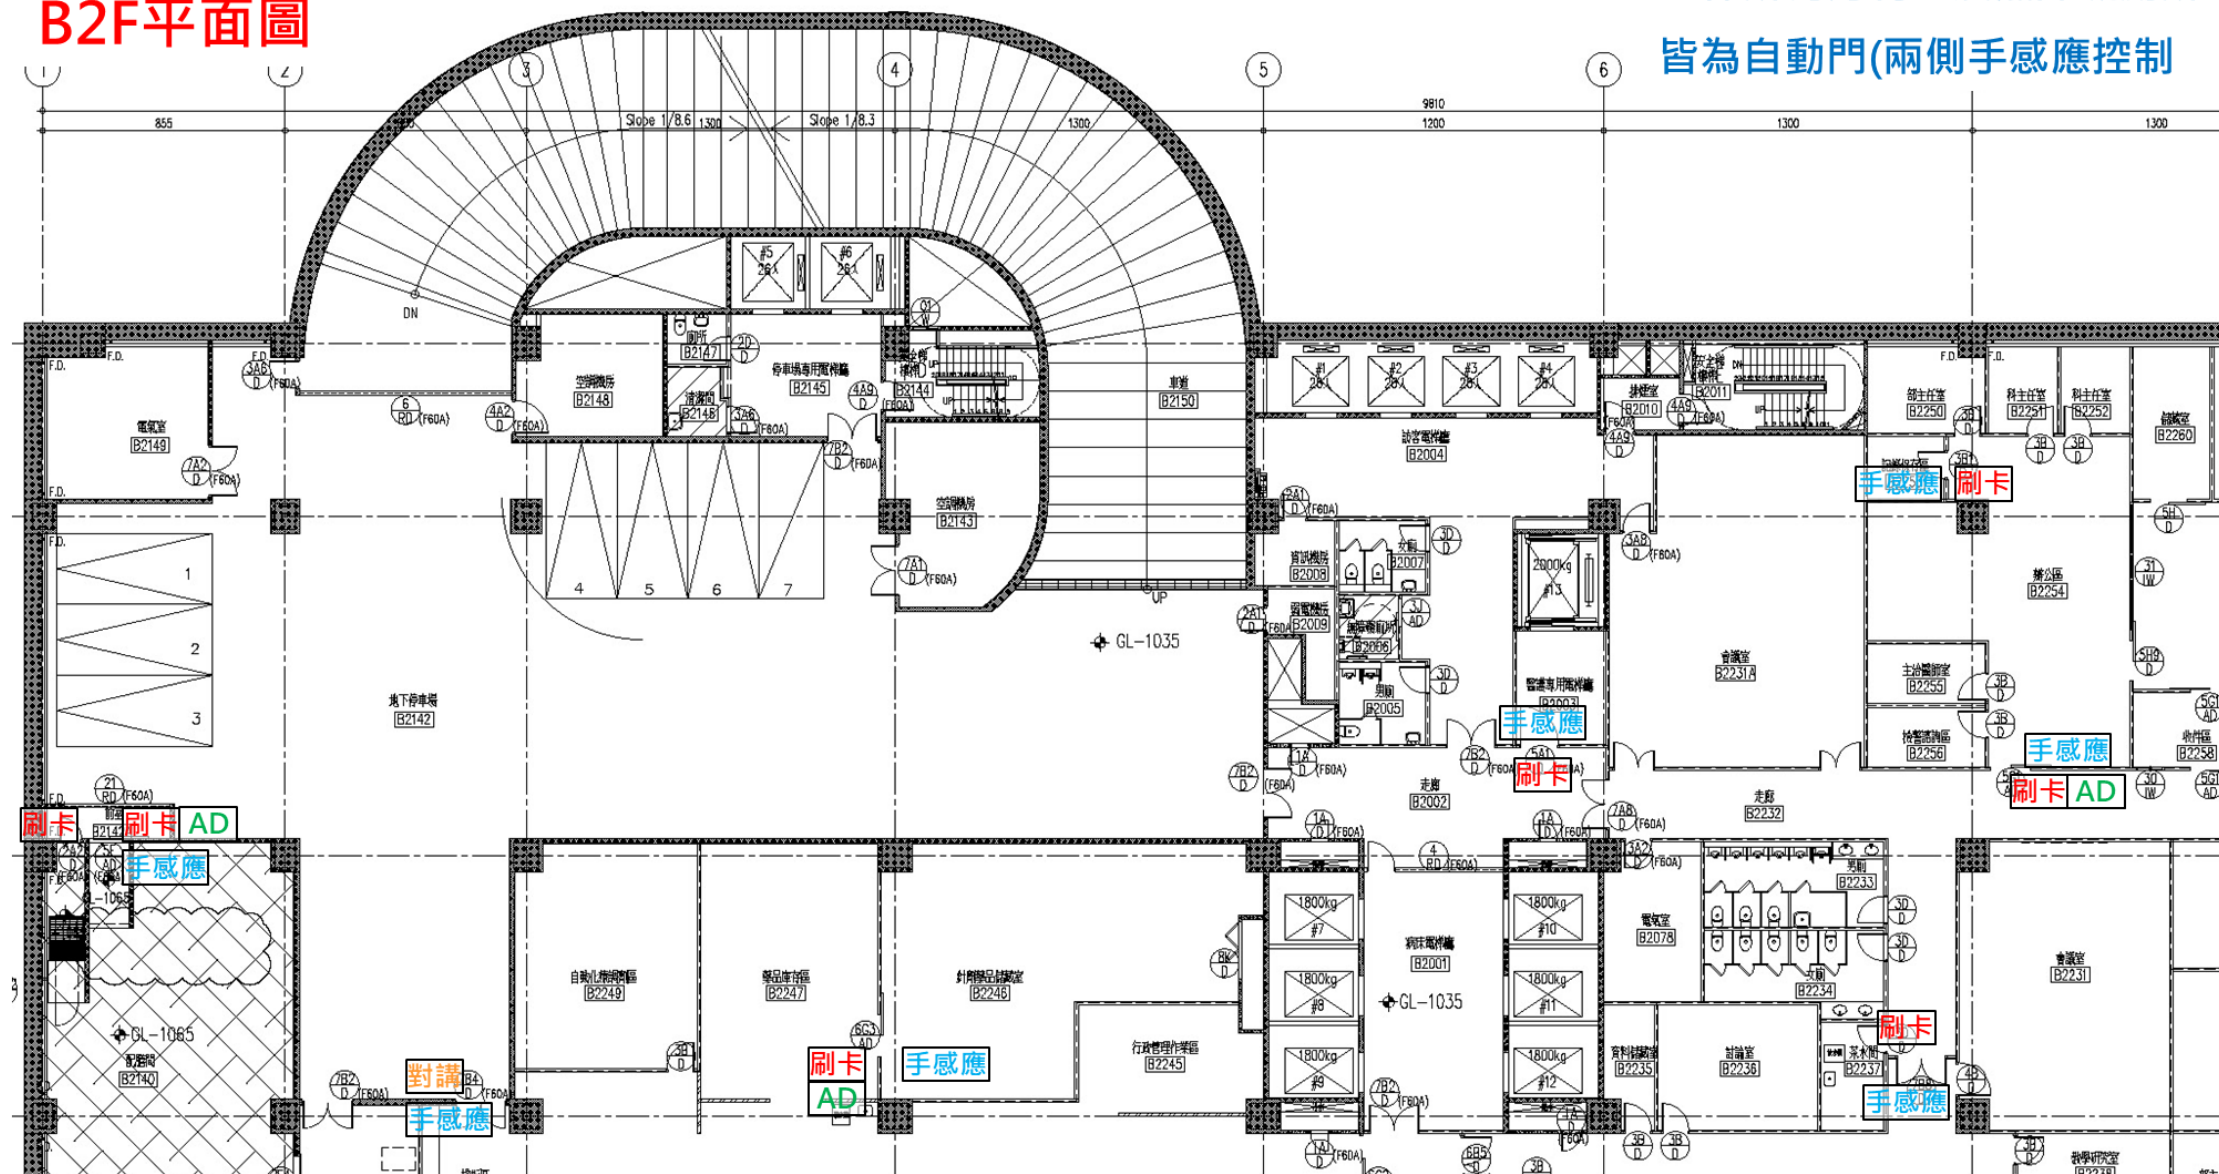


請設計監造單位接續簡報~  
謝謝

## 空橋規劃說明




## 空橋配置 1F 變更前

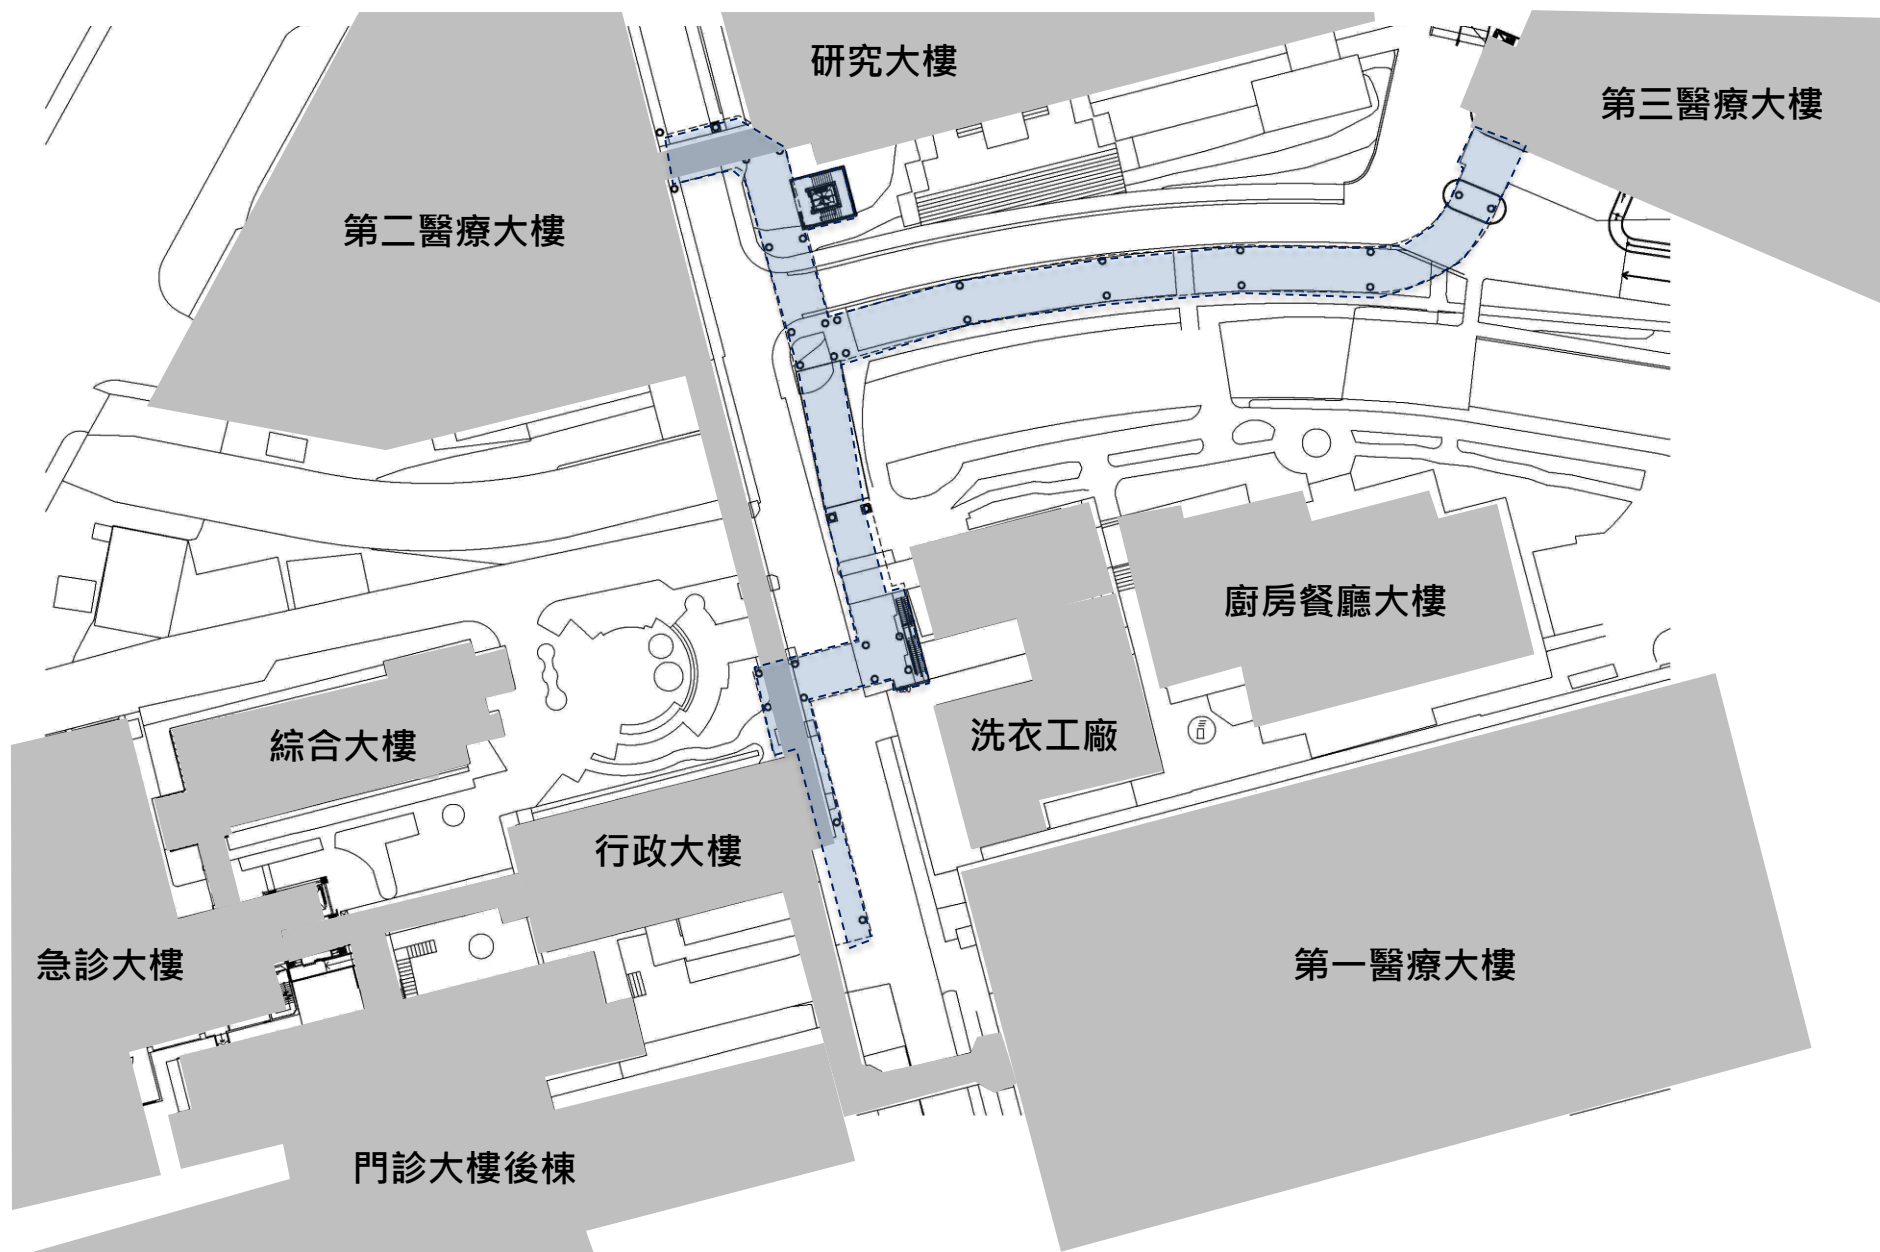


## 空橋配置 1F 變更後

●●●● 管線位置

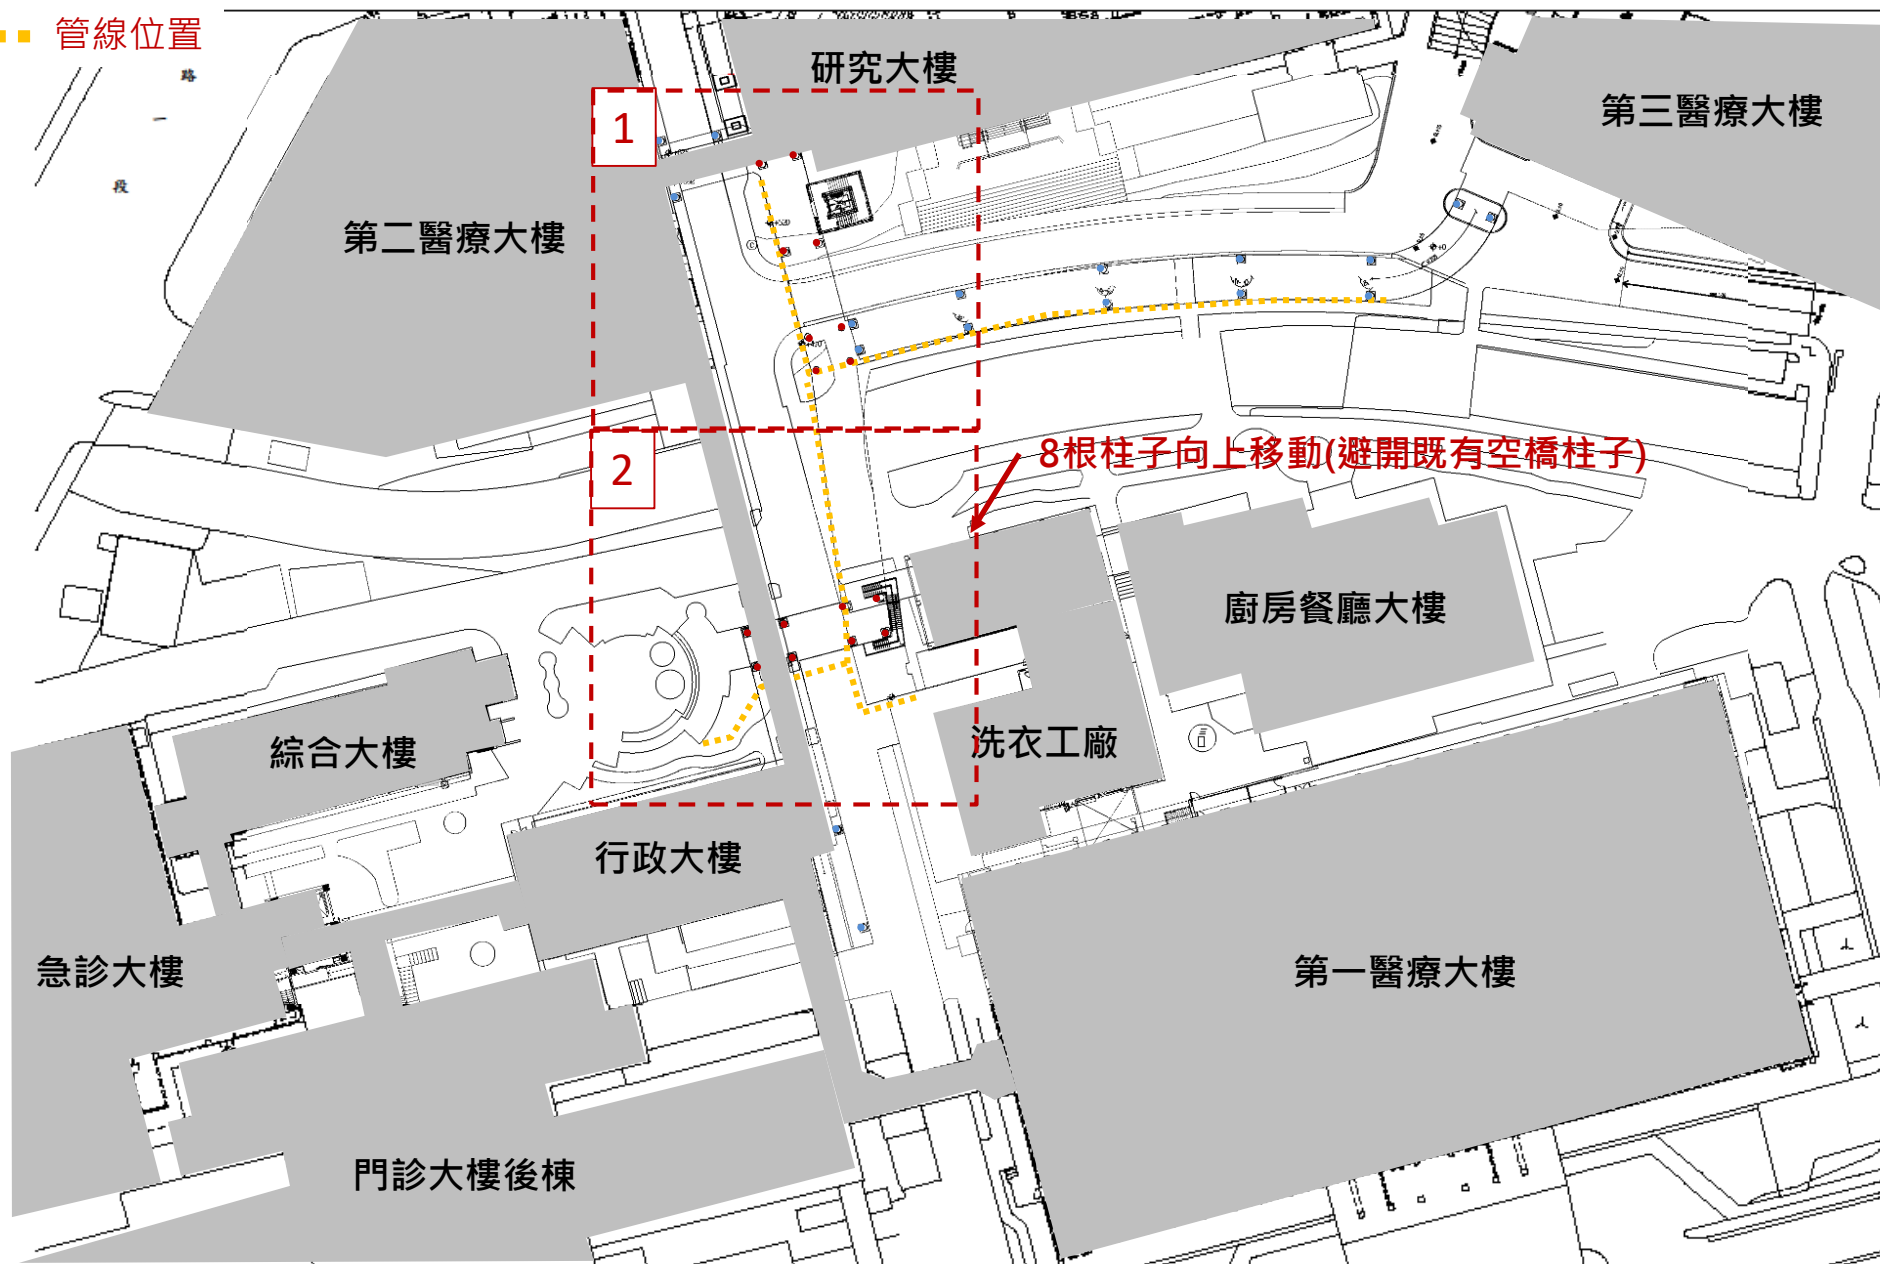



## 空橋配置 1F 變更對照

2

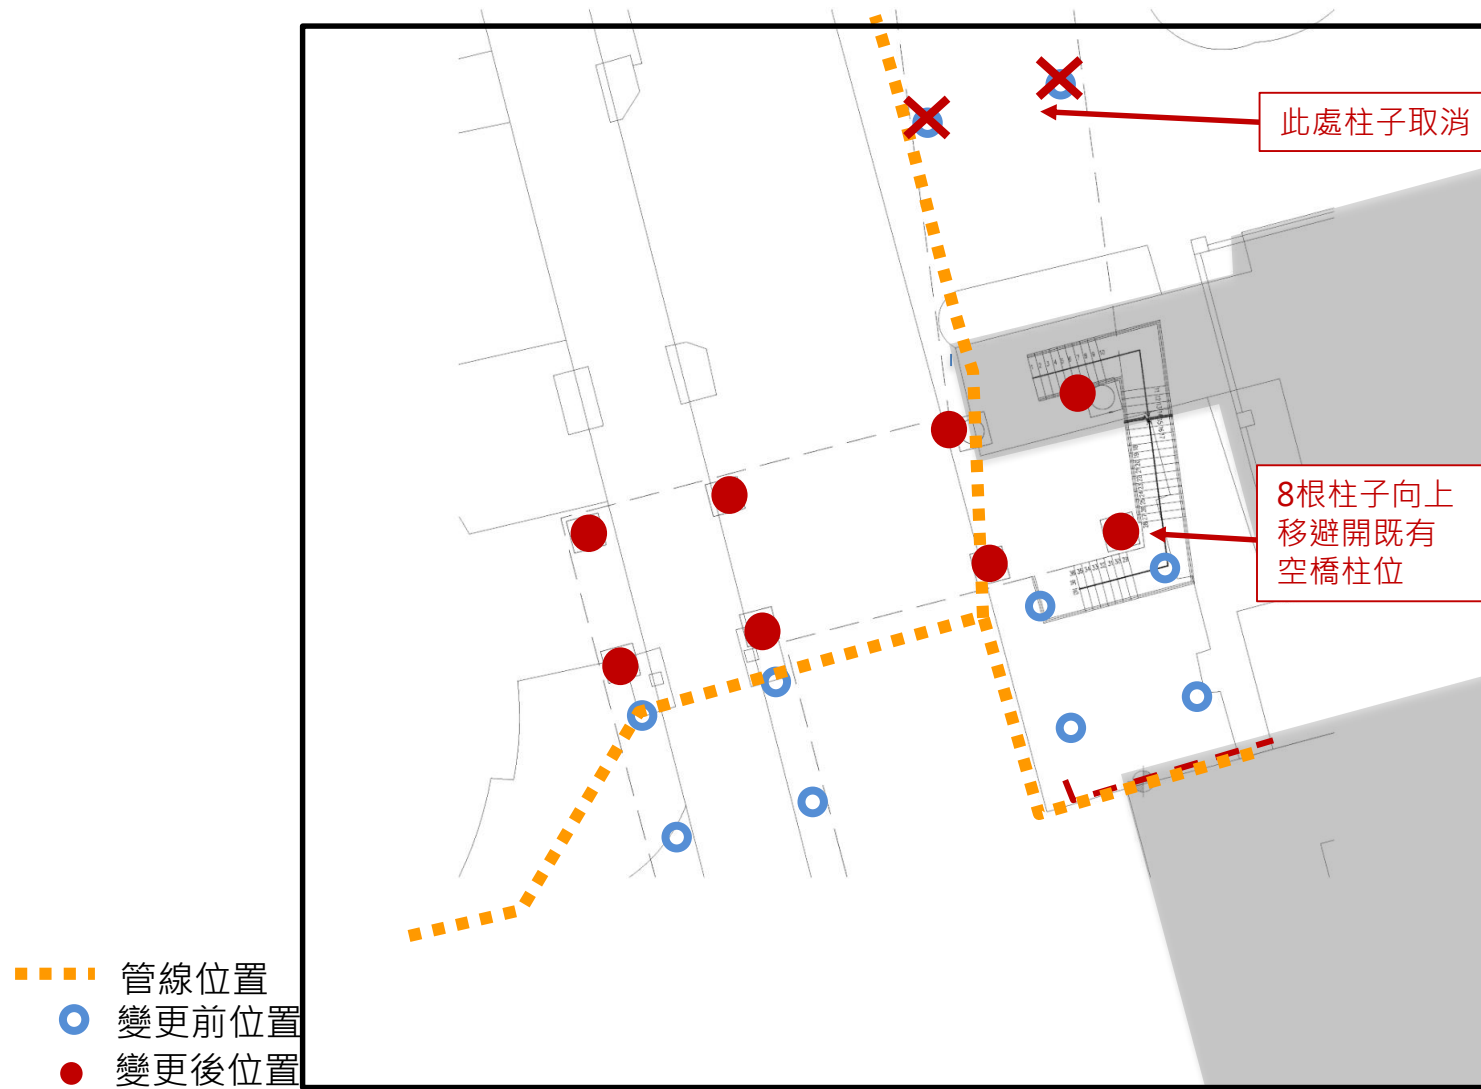


## 空橋結構示意圖

(依結構尺寸上色)

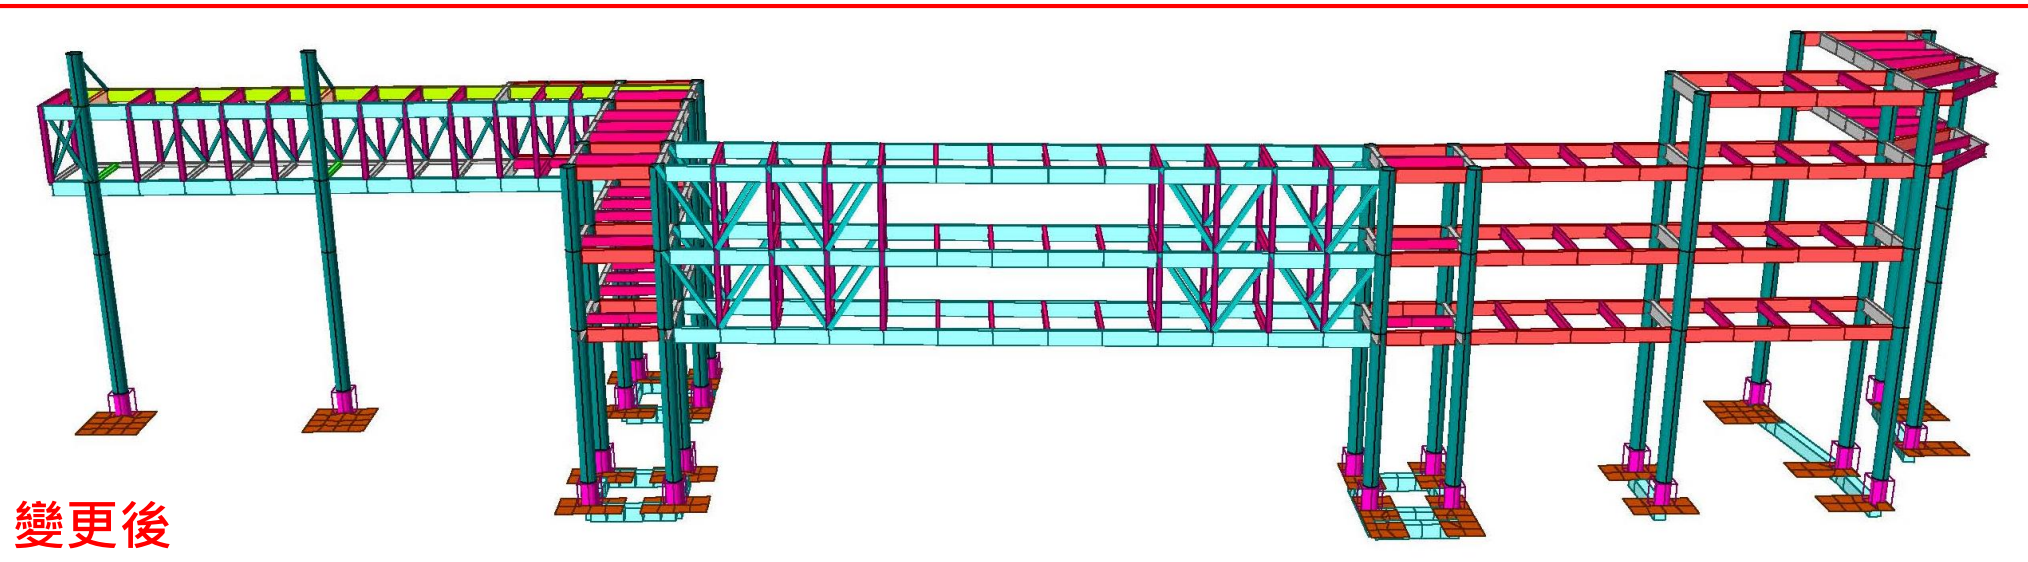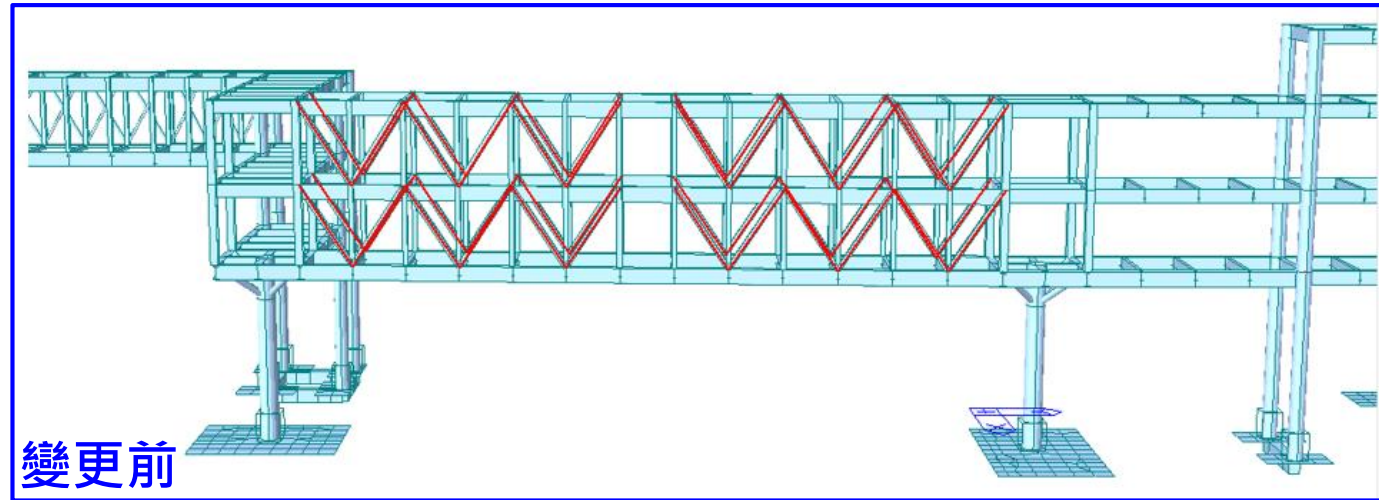

## 空橋結構示意圖


(依結構尺寸上色)

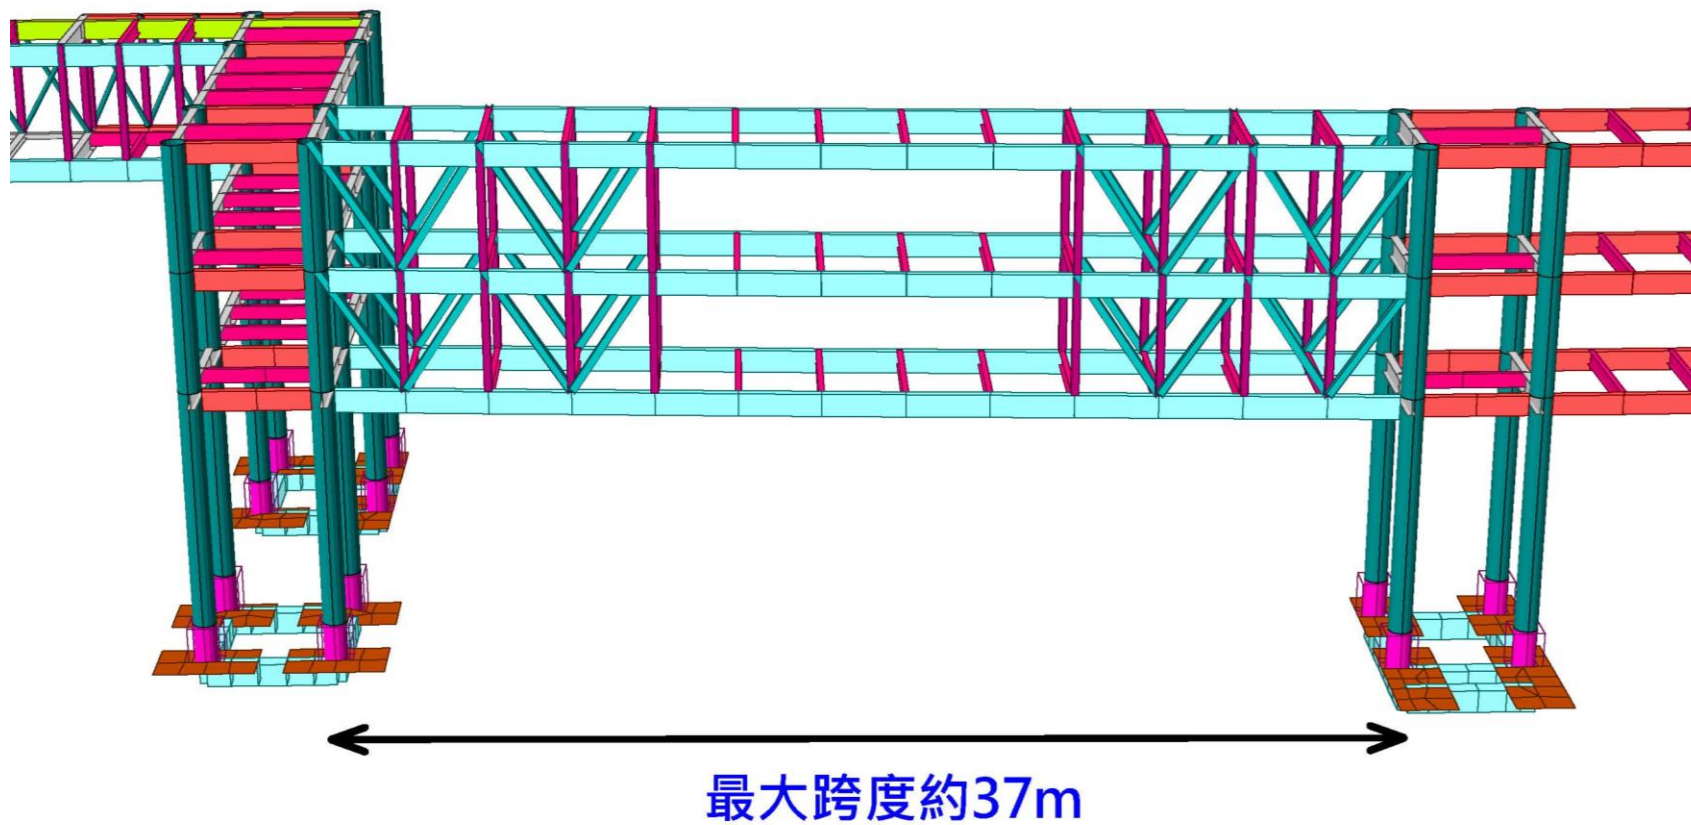



# 空橋結構示意圖


(依結構尺寸上色)

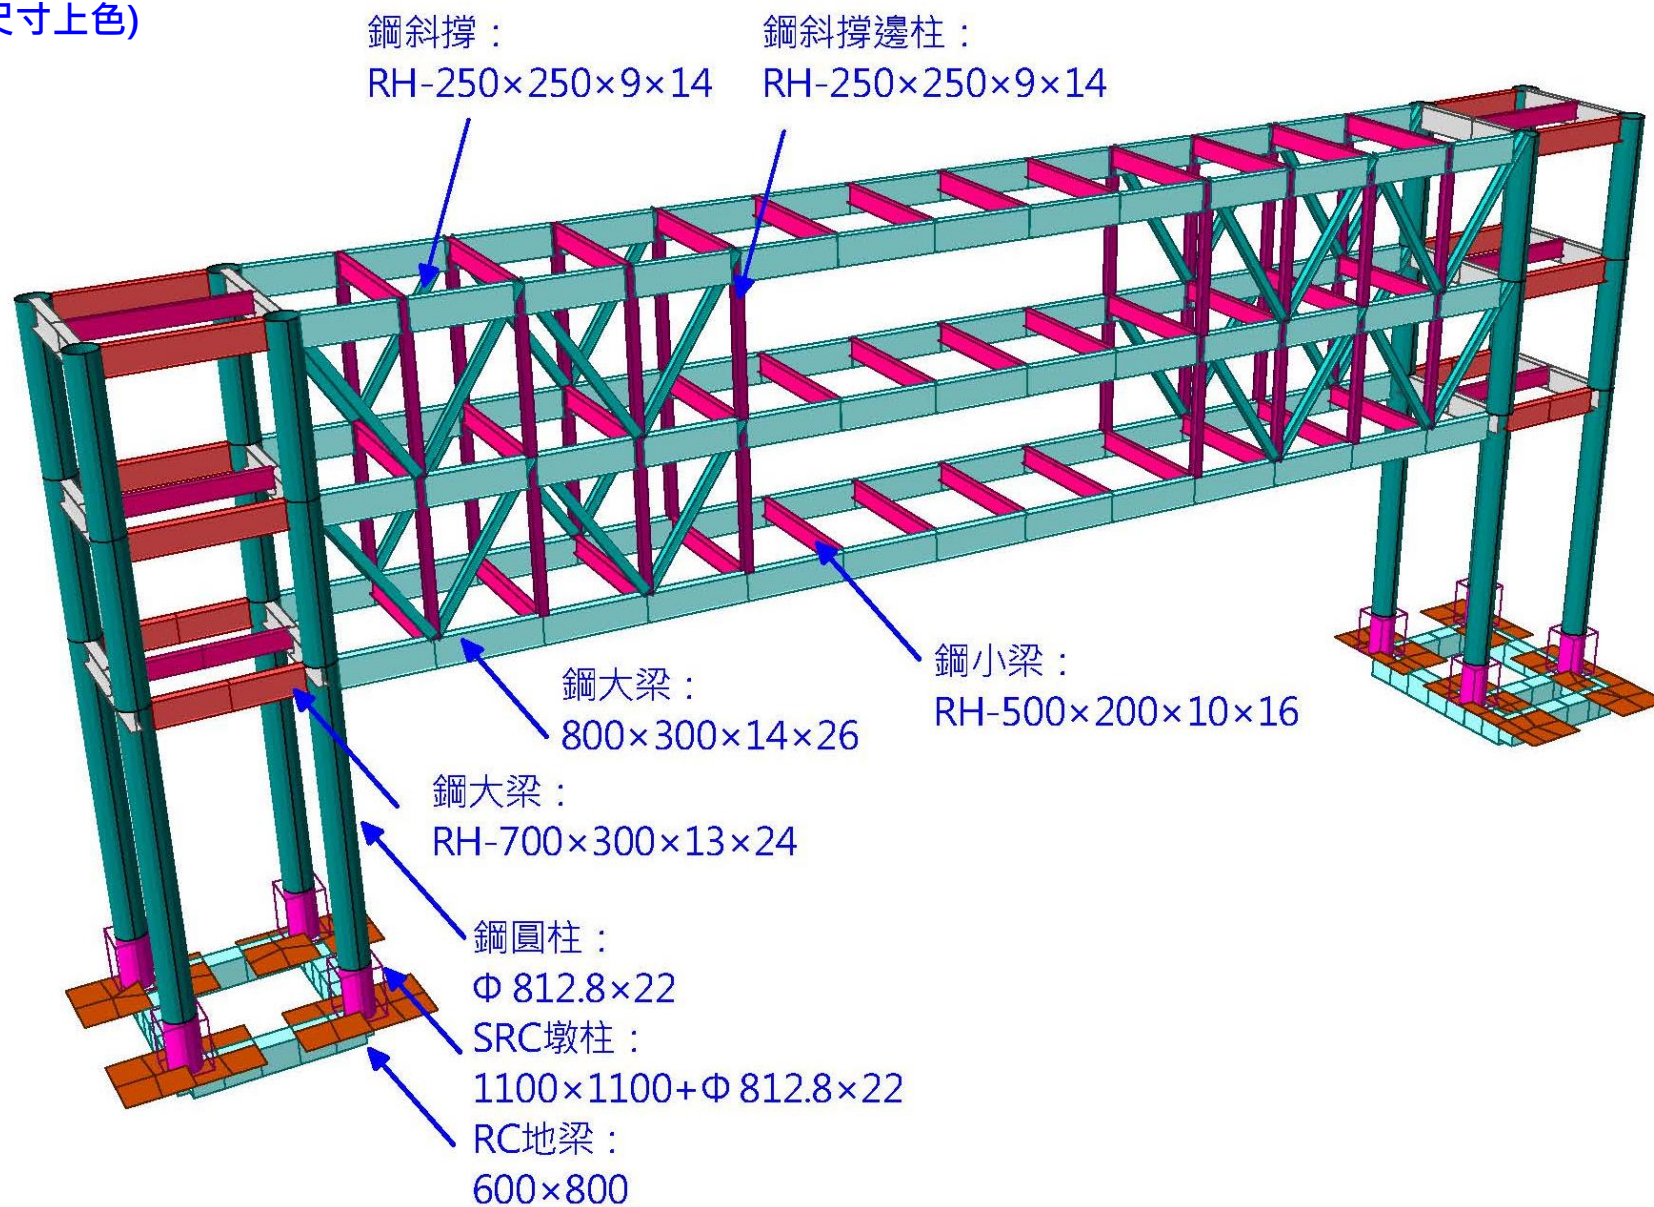




## 第三次變更設計-B2F平面圖

# 第三次變更設計-B2F平面圖

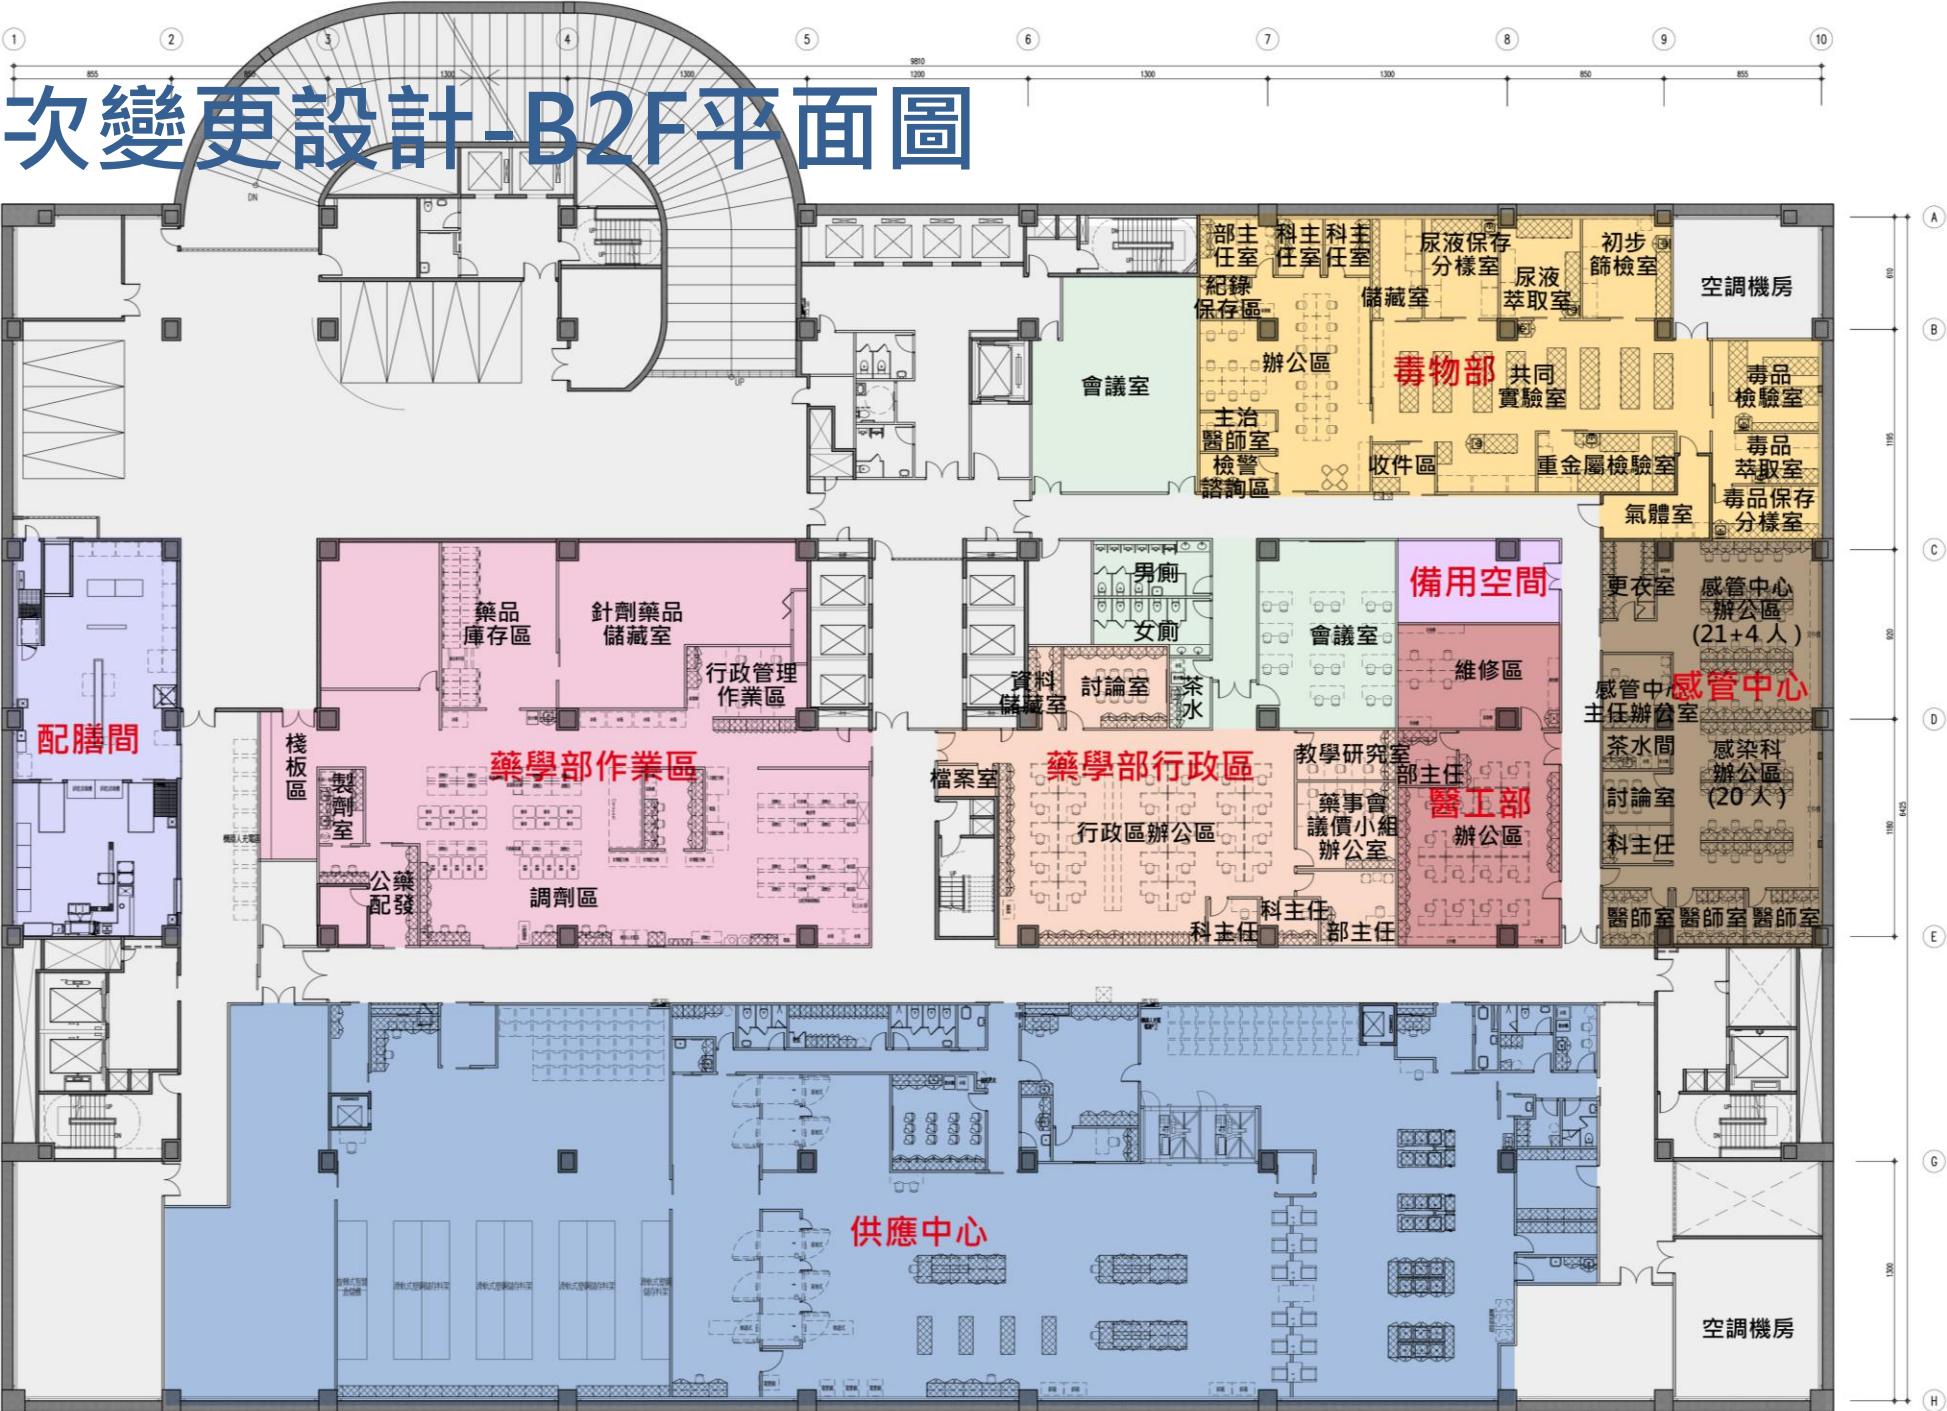


## 第三次變更設計-B2F平面圖

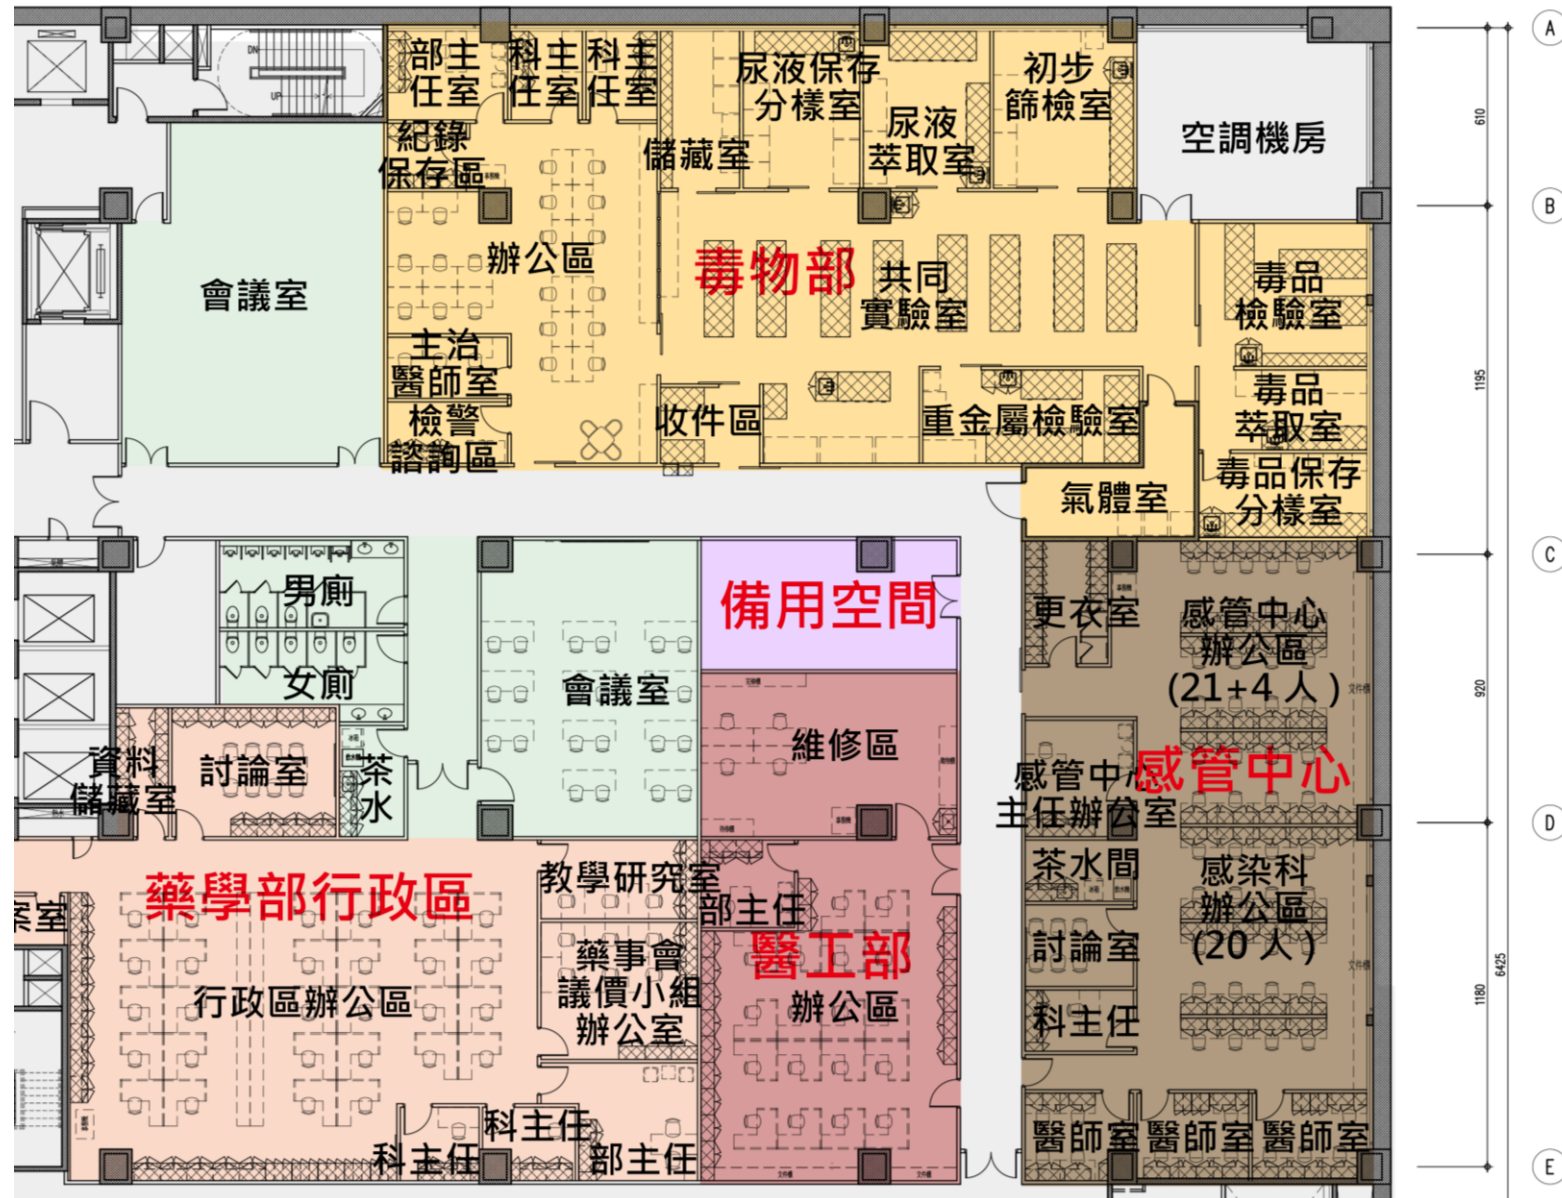


# 手術室器械櫃深度-(現況第一醫療大樓)

手術室淨寬  
720\*500(cm)

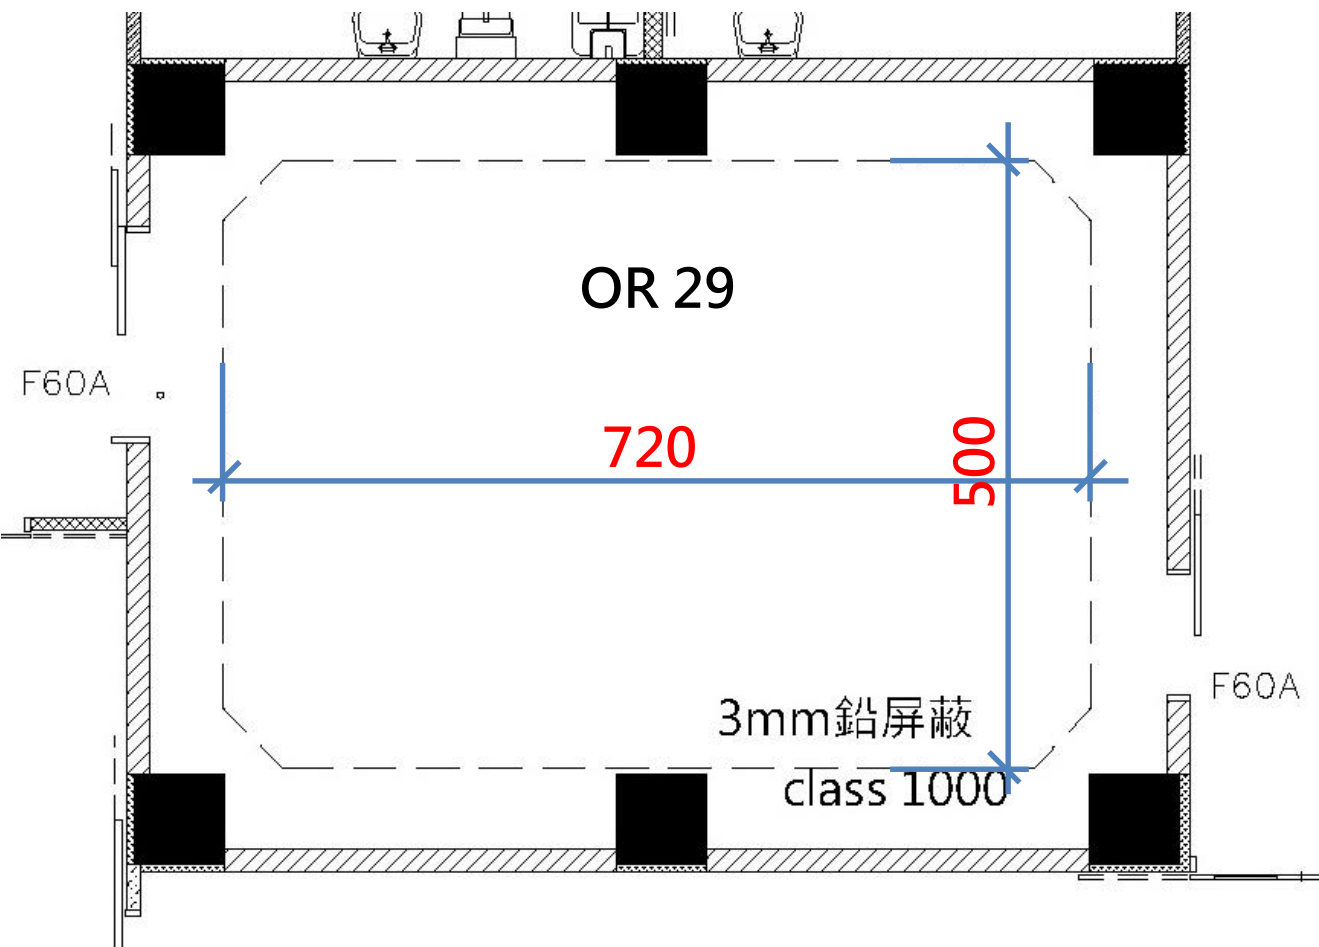

OR14器械櫃  
櫃子：深度 50cm  
抽屜：深度 40cm

手術室淨寬  
750\*580(cm)

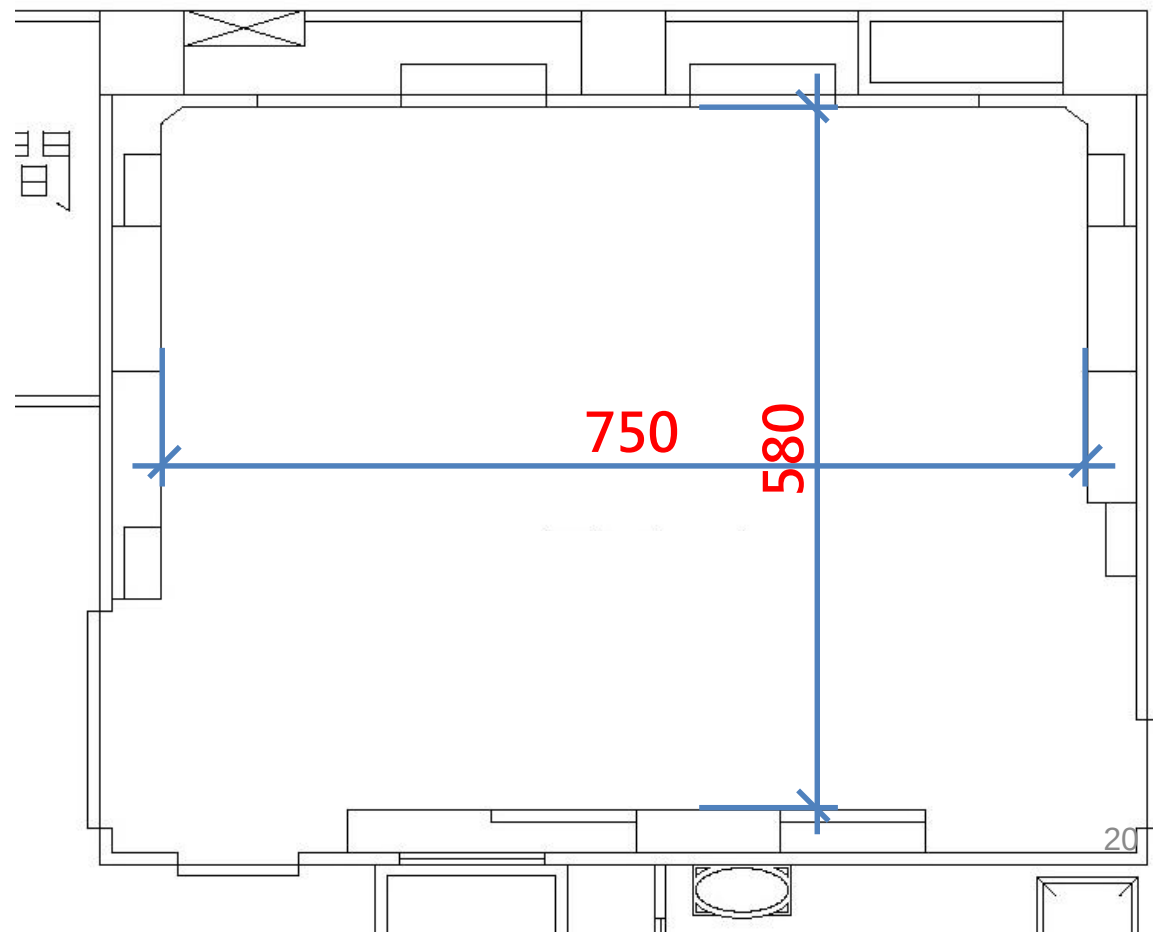



# 分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年11月30日止

| 項 目    | 應提送 | 已提送 | 審 查 中       |             |             | 已備查 | 逾期送審 |
|--------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----|------|
|        |     |     | 監造<br>審 查 中 | 專管<br>核 定 中 | 機關<br>備 查 中 |     |      |
| 分項施工計畫 | 107 | 104 | 1           | 0           | 1           | 102 | 0    |

1. 「緊急求救影音對講系統分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1141009002號函審查合宜 專管銘建(榮)字第1141015006號核定 院方：備查中
2. 「防火遮煙捲簾分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1140930004號函核定 院方：中榮工字第1149923515號函備查 本項解管
3. 「車道防水閘門分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1140930003號函核定 院方：中榮工字第1149923511號函備查 本項解管
4. 「護士呼叫系統設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第1014002646號函提送 監造：審查中
5. 「智慧醫療系統設備工程分項施工計畫」(管制提送時間：114年11月3日)
6. 「中央監控系統設備工程分項施工計畫」(管制提送時間：114年11月24日)
7. 「智慧建築整合系統工程分項施工計畫」(管制提送時間：114年11月24日)



# 分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年11月30日止

| 項 目                                                                         | 應提送 | 已提送 | 審 查 中       |             |             | 已核定 | 逾期送審 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----|------|
|                                                                             |     |     | 監造<br>審 查 中 | 專管<br>審 定 中 | 機關<br>核 定 中 |     |      |
| 材料/設備送審                                                                     | 123 | 120 | 6           | 1           | 5           | 108 | 0    |
| 1. 「手術室裝修及設備-1」：麗明：麗字第0915002423號函提送 監造：譚余中榮字第1140919007號函審退(管制時間：11月28日)   |     |     |             |             |             |     |      |
| 2. 「手術室裝修及設備-2」：麗明：麗字第0930002540號函提送 監造：譚余中榮字第1141003001號函審退(管制時間：12月5日)    |     |     |             |             |             |     |      |
| 3. 「櫥櫃設備」：麗明：麗字第0916002436號函提送 監造：譚余中榮字第1140922001號函審退(管制時間：11月14日)         |     |     |             |             |             |     |      |
| 4. 「Air Curtain設備」：專管：銘建(榮)字第1141002007號審定 院方：中榮工字第1149923654號函核定 本項解管      |     |     |             |             |             |     |      |
| 5. 「水箱不銹鋼人孔蓋」：專管：銘建(榮)字第1141003015號審定 院方：中榮工字第1149923751號函核定 本項解管           |     |     |             |             |             |     |      |
| 6. 「鍋爐設備(瓦斯)」：麗明：麗字第1015002655號函提送 監造：審查中                                   |     |     |             |             |             |     |      |
| 7. 「鍋爐設備(蒸氣)」：麗明：麗字第1015002654號函提送 監造：審查中                                   |     |     |             |             |             |     |      |
| 8. 「資通訊系統設備工程、無線AP設備工程」：(管制提送時間：10月27日)                                     |     |     |             |             |             |     |      |
| 9. 「BI/BO 過濾網箱」：麗明：麗字第1014002647號函提送 監造：審查中                                 |     |     |             |             |             |     |      |
| 10. 「防撞護角(含防撞扶手)」：監造：譚余中榮字第1141009003函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141015007號審定 院方：核定中   |     |     |             |             |             |     |      |
| 11. 「停車場護角及輪檔」：監造：譚余中榮字第1141013005號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141015012號審定 院方：核定中     |     |     |             |             |             |     |      |
| 12. 「空調機器設備-消音器」：監造：譚余中榮字第1141009004號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141015008號審定 院方：核定中   |     |     |             |             |             |     |      |
| 13. 「護士呼叫系統設備」：監造：譚余中榮字第1141013002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141015013號審定 院方：核定中     |     |     |             |             |             |     |      |
| 14. 「門禁管制系統、對講保全系統設備」：麗明：麗字第1006002601號函提送 監造：譚余中榮字第1141014002號函審查合宜 專管：審定中 |     |     |             |             |             |     |      |
| 15. 「緊急求救影音對講系統」：監造：譚余中榮字第1141009005號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141015010號審定 院方：核定中   |     |     |             |             |             |     |      |
| 16. 「泵浦組」：(管制提送時間：11月1日)                                                    |     |     |             |             |             |     |      |
| 17. 「沉水式污水泵浦」：(管制提送時間：11月1日)                                                |     |     |             |             |             |     |      |

# 分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年11月30日止

| 項 目 | 應提送 | 已提送 | 審 查 中        |              |              | 已 備 查 | 逾 期 送 審 |
|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|-------|---------|
|     |     |     | 監 造<br>核 定 中 | 專 管<br>備 查 中 | 機 關<br>備 查 中 |       |         |
| 施工圖 | 69  | 68  | 0            | 1            | 1            | 66    | 0       |

- 
1. 「電梯(含電扶梯)施工圖」：麗明：麗字第1007002609號函提送

監造：譚余中榮字第1141013003號函核定

專管：備查中
2. 「11F機水電各系統施工圖」：譚余中榮字第1141009001號函核定

專管：銘建(榮)字第1141015006號備查

院方：備查中
5. 「12F機水電各系統施工圖」：(管制提送時間：11月15日)

請施工單位接續簡報~  
謝謝

# 壹、本週及下週施工作業說明

## 本週(114年10月20日~114年10月26日)工程施工作業

1. 吊裝第八節鋼構梁柱及鋼樓梯、4F~5F鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
2. 2F鋼承鈑鋼網鋪設及東側車道版模板施作及鋼筋綁紮。
3. 1F牆面鋼網牆放樣及材料進場。

## 下週(114年10月27日~114年11月2日)預定施工作業

1. 吊裝第八節鋼構梁柱、4F~5F鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
2. 2F鋼承鈑鋼網鋪設及東側車道版模板施作及鋼筋綁紮。
3. 1F牆面鋼網牆材料進場及施作。

# 貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院  
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司  
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所  
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程  
三週進度表

| 日期  |                      | 起始日               | 完成日               | 天數  | 114 / 10 ~ 114 / 11 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      | 備 | 註 |
|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---|---|
| 編號  | 三週進度<br>綱圖時程<br>作業內容 | 預定進度              |                   |     | 上週進度                |       |       |       |       |       |       | 本週進度  |       |       |       |       |       |       | 下週進度  |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 實際進度              |                   |     | 10/13               | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 |   |   |
|     |                      |                   |                   |     | 一                   | 二     | 三     | 四     | 五     | 六     | 日     | 一     | 二     | 三     | 四     | 五     | 六     | 日     | 一     | 二     | 三     | 四     | 五     | 六    | 日    |   |   |
| 一、  | 地上層結構工程              | 開始時間<br>114/3/27  | 完成時間<br>114/11/30 | 249 |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 1   | #7鋼構梁柱吊裝及電焊          | 開始時間<br>114/9/17  | 完成時間<br>114/10/18 | 32  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 114/9/16          | 114/10/20         | 35  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 開始時間<br>114/10/23 | 完成時間<br>114/11/16 | 25  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 2   | #8鋼構梁柱吊裝及電焊          | 開始時間<br>114/10/23 | 完成時間<br>114/11/16 | 25  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 3   | 2F~5F鋼承板鋪設及剪力釘施作     | 開始時間<br>114/9/8   | 完成時間<br>114/10/24 | 47  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 114/9/8           |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 開始時間<br>114/10/16 | 完成時間<br>114/11/15 | 31  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 4   | 2FL~5FL點銲鋼線網鋪設及混凝土澆置 | 114/10/16         |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 開始時間<br>114/10/18 | 完成時間<br>114/11/15 | 29  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 5   | 1F鋼網牆及鋼筋綁紮           | 開始時間<br>114/10/18 | 完成時間<br>114/11/15 | 29  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 二、  | 地下室裝修工程              | 開始時間<br>114/7/16  | 完成時間<br>114/12/30 | 168 |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 1   | B2F~B1F輕隔間工程         | 開始時間<br>114/10/24 | 完成時間<br>114/11/30 | 38  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 2   | B3F~B6F電力照明及插座拉線     | 開始時間<br>114/8/5   | 完成時間<br>114/11/12 | 100 |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 114/8/5           |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 開始時間<br>114/9/5   | 完成時間<br>114/11/14 | 71  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 3   | B3F~B6F複壁排水          | 114/10/10         |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 開始時間<br>114/9/3   | 完成時間<br>114/10/31 | 59  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 114/9/3           |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 4   | B6F~B2F消防水配管         | 開始時間<br>114/9/3   | 完成時間<br>114/10/31 | 59  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 5   | B2F~B5F宅內電信箱配置安裝     | 開始時間<br>114/10/3  | 完成時間<br>114/10/12 | 10  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 114/10/3          | 114/10/12         | 10  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      | 開始時間<br>114/10/15 | 完成時間<br>114/10/30 | 16  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 6   | B3F~B6F電信線槽吊子安裝      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 7   | B6F~B3F空調水系統配管       | 開始時間<br>114/10/20 | 完成時間<br>114/11/18 | 30  |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
|     |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |
| 附註： |                      |                   |                   |     |                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |   |   |



(2025.09-2025.11)三月施工進度表

|                       |      |                          |        |            |            |                   |                                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
|-----------------------|------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|-------|----|------------|----|----|-------|----|--|
| 營造廠商:麗明營造股份有限公司       |      |                          |        |            |            | 臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程 |                                      |    |    |       |    | 2025/09/14 |    |    |       |    |  |
| 2025/9~2025/11工期預定進度表 |      |                          |        |            |            |                   |                                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 識別碼                   | 任務模式 | 任務名稱                     | 工期     | 開始時間       | 完成時間       | 前置任務              | Q2                                   | Q3 | Q4 | 2026年 | Q1 | Q2         | Q3 | Q4 | 2027年 | Q1 |  |
| 1                     |      | 結構體工期                    | 1145 d | 2024/1/15  | 2027/3/20  |                   | 結構體工期                                |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 2                     |      | 地下室工程                    | 537 d  | 2024/1/15  | 2025/7/12  |                   |                                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 213                   |      | 上部鋼構吊裝作業                 | 198 d  | 2025/6/11  | 2025/12/25 |                   |                                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 214                   |      | 第一區1~5line鋼構吊裝440塔吊      | 197 d  | 2025/6/11  | 2025/12/24 |                   |                                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 215                   |      | 塔吊安檢及核發(6/27取得合格證)       | 17 d   | 2025/6/11  | 2025/6/27  |                   | 塔吊安檢及核發(6/27取得合格證)<br>6/11 6/27      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 216                   |      | #4 1~5/D~G line          | 9 d    | 2025/6/28  | 2025/7/6   | 215               | #4 1~5/D~G line<br>6/28 7/6          |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 217                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/7/7   | 2025/7/8   | 216               | 校正及鎖斷<br>7/7 7/8                     |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 218                   |      | 電鉗                       | 14 d   | 2025/7/9   | 2025/7/22  | 217               | 電鉗<br>7/9 7/22                       |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 219                   |      | #5 1~5/D~G line (遇雨延後5天) | 21 d   | 2025/7/9   | 2025/7/29  | 217               | #5 1~5/D~G line (遇雨延後5天)<br>7/9 7/29 |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 220                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/7/30  | 2025/7/31  | 219               | 校正及鎖斷<br>7/30 7/31                   |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 221                   |      | 電鉗                       | 20 d   | 2025/8/1   | 2025/8/20  | 220               | 電鉗<br>8/1 8/20                       |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 222                   |      | #6 1~5/A~G line          | 21 d   | 2025/8/21  | 2025/9/10  | 221               | #6 1~5/A~G line<br>8/21 9/10         |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 223                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/9/11  | 2025/9/12  | 222               | 校正及鎖斷<br>9/11 9/12                   |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 224                   |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/9/13  | 2025/10/3  | 223               | 電鉗<br>9/13 10/3                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 225                   |      | #7 1~5/A~G line          | 18 d   | 2025/9/17  | 2025/10/4  | 223FS+4           | #7 1~5/A~G line<br>9/17 10/4         |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 226                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/10/5  | 2025/10/6  | 225               | 校正及鎖斷<br>10/5 10/6                   |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 227                   |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/10/7  | 2025/10/27 | 226               | 電鉗<br>10/7 10/27                     |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 228                   |      | #8 1~5/A~G line          | 23 d   | 2025/10/7  | 2025/10/29 | 226               | #8 1~5/A~G line<br>10/7 10/29        |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 229                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/10/30 | 2025/10/31 | 228               | 校正及鎖斷<br>10/30 10/31                 |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 230                   |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/11/1  | 2025/11/21 | 229               | 電鉗<br>11/1 11/21                     |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 231                   |      | #9 1~5/A~G line          | 21 d   | 2025/11/1  | 2025/11/21 | 229               | #9 1~5/A~G line<br>11/1 11/21        |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 232                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/11/22 | 2025/11/23 | 231               | 校正及鎖斷<br>11/22 11/23                 |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 233                   |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/11/24 | 2025/12/14 | 232               | 電鉗<br>11/24 12/14                    |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 234                   |      | #10 1~5/A~G line         | 8 d    | 2025/11/24 | 2025/12/1  | 232               | #10 1~5/A~G line<br>11/24 12/1       |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 235                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/12/2  | 2025/12/3  | 234               | 校正及鎖斷<br>12/2 12/3                   |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 236                   |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/12/4  | 2025/12/24 | 235               | 電鉗<br>12/4 12/24                     |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 237                   |      | 第二區6~10line鋼構吊裝600塔吊     | 182 d  | 2025/6/27  | 2025/12/25 |                   |                                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 238                   |      | 塔吊安檢及核發(7/18取得合格證)       | 22 d   | 2025/6/27  | 2025/7/18  |                   | 塔吊安檢及核發(7/18取得合格證)<br>6/27 7/18      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 239                   |      | #4 5~10/D~G line         | 13 d   | 2025/7/19  | 2025/7/31  | 238               | #4 5~10/D~G line<br>7/19 7/31        |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 240                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/8/1   | 2025/8/2   | 239               | 校正及鎖斷<br>8/1 8/2                     |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 241                   |      | 電鉗                       | 14 d   | 2025/8/3   | 2025/8/16  | 240               | 電鉗<br>8/3 8/16                       |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 242                   |      | #5 5~10/D~G line         | 13 d   | 2025/8/3   | 2025/8/15  | 240               | #5 5~10/D~G line<br>8/3 8/15         |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 243                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/8/16  | 2025/8/17  | 242               | 校正及鎖斷<br>8/16 8/17                   |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 244                   |      | 電鉗                       | 14 d   | 2025/8/18  | 2025/8/31  | 243               | 電鉗<br>8/18 8/31                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 245                   |      | #6 5~10/D~G line         | 23 d   | 2025/8/18  | 2025/9/9   | 243               | #6 5~10/D~G line<br>8/18 9/9         |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 246                   |      | 校正及鎖斷                    | 2 d    | 2025/9/10  | 2025/9/11  | 245               | 校正及鎖斷<br>9/10 9/11                   |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |
| 247                   |      | 電鉗                       | 21 d   | 2025/9/12  | 2025/10/2  | 246               | 電鉗<br>9/12 10/2                      |    |    |       |    |            |    |    |       |    |  |

第 1 頁

## (2025.09-2025.11)三月施工進度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

## 臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2025/09/14

## 2025/9~2025/11工期預定進度表

| 識別碼 | 任務名稱              | 工期    | 開始時間       | 完成時間       | 前置任務    |
|-----|-------------------|-------|------------|------------|---------|
| 248 | #7 5~10/D~G line  | 21 d  | 2025/9/15  | 2025/10/5  | 246FS+3 |
| 249 | 校正及鎖斷             | 2 d   | 2025/10/6  | 2025/10/7  | 248     |
| 250 | 電鍍                | 21 d  | 2025/10/8  | 2025/10/28 | 249     |
| 251 | #8 5~10/D~G line  | 20 d  | 2025/10/8  | 2025/10/27 | 249     |
| 252 | 校正及鎖斷             | 2 d   | 2025/10/28 | 2025/10/29 | 251     |
| 253 | 電鍍                | 21 d  | 2025/10/30 | 2025/11/19 | 252     |
| 254 | #9 5~10/D~G line  | 20 d  | 2025/10/30 | 2025/11/18 | 252     |
| 255 | 校正及鎖斷             | 2 d   | 2025/11/19 | 2025/11/20 | 254     |
| 256 | 電鍍                | 21 d  | 2025/11/21 | 2025/12/11 | 255     |
| 257 | #10 5~10/D~G line | 8 d   | 2025/12/2  | 2025/12/9  | 234     |
| 258 | 校正及鎖斷             | 2 d   | 2025/12/10 | 2025/12/11 | 257     |
| 259 | 電鍍                | 14 d  | 2025/12/12 | 2025/12/25 | 258     |
| 260 | 上部結構工程            | 525 d | 2025/10/4  | 2027/3/20  |         |
| 261 | 2FL結構             | 21 d  | 2025/10/6  | 2025/10/26 | 248     |
| 262 | 3FL結構             | 21 d  | 2025/10/27 | 2025/11/16 | 261     |
| 263 | 4FL結構             | 21 d  | 2025/11/17 | 2025/12/7  | 262     |
| 264 | 5FL結構             | 21 d  | 2025/10/4  | 2025/10/24 | 224     |
| 265 | 6FL結構             | 21 d  | 2025/10/28 | 2025/11/17 | 251     |
| 266 | 7FL結構             | 21 d  | 2025/10/28 | 2025/11/17 | 251     |
| 267 | 8FL結構             | 21 d  | 2025/11/19 | 2025/12/9  | 254     |
| 268 | 9FL結構             | 21 d  | 2025/12/10 | 2025/12/30 | 267     |
| 269 | 10FL結構            | 21 d  | 2025/12/31 | 2026/1/20  | 268     |
| 270 | 11FL結構            | 21 d  | 2026/1/21  | 2026/2/10  | 269     |
| 271 | 12FL結構            | 21 d  | 2026/2/11  | 2026/3/7   | 270     |
| 272 | 13FL結構            | 21 d  | 2026/3/8   | 2026/3/28  | 271     |
| 273 | RF及水箱結構           | 21 d  | 2026/3/29  | 2026/4/18  | 272     |
| 274 | 裝修工程              | 315 d | 2025/11/18 | 2026/10/2  |         |
| 288 | 外牆裝修工程            | 210 d | 2026/8/19  | 2027/3/20  | 285     |
| 289 | 景觀工程              | 120 d | 2026/4/6   | 2026/8/3   | 280     |



## 參、上週工程施工照片



說明：工地空拍照。



說明：鋼構吊裝作業。



說明：鋼構柱對接UT檢測。



說明：鋼構柱位校正施工抽查。



## 參、上週工程施工照片



說明：消防拉線作業。



說明：消防管路配管。



說明：工程查核。



說明：工程查核。

簡報結束，謝謝
