

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

12月月會暨第260次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：114 年 12 月 23 日(星期二) 下午 04 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：姚鈺 主任秘書

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 114 年 12 月 21 日止，使用工期：1072 日曆天(不含免計工期 12 天)，剩餘 806 日曆天(展延工期 28 天)。
- 工程進度截至 114 年 12 月 21 日，預定進度 15.449%，實際進度 32.438%，超前進度：16.989%(約超前 220 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
下構結構體工程	115/04/13			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 結構體工程：3F 內牆鋼筋綁紮、10FL 鋼線網鋪設/綁紮、1F、2F 內外牆收尾、8FL 遮斷拆除。
 2. 機電工程：10F 底板、樓板套管、排水套管配管施作、B1F 泡沫、撇水管材預製及管路配管。
 3. 安全監測：數據無異常。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。
2. 依 113/09/26 第七次臺中市政府公共藝術審議委員會決議，本案未通過。目前進度：

第五次執行小組會議已於 113/11/14(四)召開，專管單位將依會議決議修正後再行提請院方召開執行小組會議供委員審查。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為吊裝第九、10 節鋼構梁電焊、11F~12F 鋼承板鋪設及剪力釘施作、2F 內外牆混凝土澆置、3F 牆模板施作及鋼筋綁紮，工程進度超前中。
2. 議題追蹤：
 - (1) 院部晨會紀錄：114/12/18 院部晨會紀錄如下。
 - A. 同意本案鋁包版、鋁格柵、鋁門窗、鋁帷幕等選色選樣採用建議方案(詳簡報 P.4)。
 - B. 地下 B6F-B3F 規劃戰備病床案，病房床間距應維持至少 1 公尺以上，確保有點滴架與護理治療空間，避免過於密閉以降低感染控制風險。針對空間過於擁擠及缺乏治療空間之問題，請參考成大沙崙醫院案例進行優化。
B3F 戰備病床之配置請縮小手術室冗餘空間以增加病床間距，請工務室提出規畫方案。
 - (2) 建照變更：經設計單位說明，於第 259 次專技會議雖決議本案第四次建照變更須待六樓 PAC 病房規劃確認後始得啟動，惟考量整體作業期程，仍建議於施工單位完成結構體勘驗後立即啟動第四次建照變更程序，屆時六樓 PAC 病房相關內容再以抽換方式更新文件；經主席裁示同意辦理。
 - (3) 架空走廊施工範圍內管線遷移：各單位於 114/12/12 至現場會勘並制定相關處置方案，惟目前相關單位尚未提供資訊，經主席裁示，請工務室(設計施工組)邀集各單位及專業廠商再次進行研討會，共同釐清問題以利加速工程進度；另關於架空走廊施工範圍內植栽移植乙事，施工單位已完成樹木修枝，待後續院方確認樹木移植地點。
 - (4) 靠福順路側工程：設計單位已規劃本案靠福順路側工程高程調整(詳後簡報 P.9-P.10)，經主席裁示請將此變更納入第四次建照變更及第四次變更設計辦理。
 - (5) 戰備病房：設計單位已規劃傷病患臨時收置空間規劃(詳後簡報 P.11-P.14)，惟經設計單位說明，本案空間限制如下。
 - A. 建築物高度不足。

- a. B6F~B3F 樓高 360cm，淨高度 310cm，仍需設置空調、氣體相關管路。
- b. 排水洩水坡度難以維持。
- B. 結構體特殊(無梁板系統)樓板 50cm 厚，已施作樓板並未留設排水口，洗孔難度高，且需避開結構配筋位置。
- C. 原規劃病床電梯並未停靠 B6F~B3F，病床運送困難。
- D. 負壓隔離病床設置於地下室，空調難以達到負壓是否有交叉感染之疑慮。
- E. 相關硬體(隔間、衛浴…等)難以即時轉換為臨時收置空間。

經主席裁示，請以下調整空間。

- 縮減左側簡易負壓隔離病床之配置空間。
- 縮減右側手術室空間，手術室數量由原規劃六間調整為四間。
- 調整護理站之空間規模及設置位置。
- 調整下排加護病房設置位置，並將下排空間全數規劃為一般病房使用。
- 戰備病房規劃於 B3F(病房、手術室及急診空間)、B4F(各類庫房)兩層。

請設計單位依上述原則修正相關圖面，並以最少空間配置，達成最大功能效益。

(6) B2F 空間調整-醫工部：經主席裁示同意醫工部需求，請設計單位依其修正。

(7) 選色選樣：經主席確認選色選樣材質如下。

- a. 手術室樣品間材料-導電地坪選用 Tarkett 3093 100 灰色、抗菌版選用 AICA FKM6000 白色。
- b. 櫥櫃板材及人造石(白色)選色選樣採用與質子治療中心新建工程相同。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

伍、散會(下午 04 時 40 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
114年12月份工程月會報暨第260次專業技術協調會
會議簽到表

- 壹、會議時間：114年12月23日(星期二)下午4時00分
貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室
參、主持人：李副院長 政鴻 (姚鈺玉 主任秘書 代)
肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院			
副院長			
主任秘書	姚鈺		
醫企部	李富勳 賴銘昌 黃浩升	醫工部	王聖魁
工務室	何南訓 張志遠 張漢洲 林明龍 陳建 鍾星凱		
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司			
葉雅怡 王威 陳秋屏 江意萱			
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所			
李三學 楊雅琪 楊雅琪 廖聖奇			
施工廠商-麗明營造股份有限公司			
黃江 林銘 楊雅琪 黃雅琪			

第三醫療大樓新建工程

114年12月月會暨第260次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明

工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.17	目標第一階段開放	115年7月31日
		目標整體完工日期	116年3月19日
使用工期 (截至114.12.21止)	1072日曆天(不含免計工期12天)，剩餘 <u>806</u> 日曆天(展延工期28天)		
工程進度 (截至114.12.21止)	預計：15.449% 實際：32.438%	進度差	+16.989% (約超前220天)
目前工程施作項目	① 結構體工程：3F內牆鋼筋綁紮、10FL鋼線網鋪設/綁紮、1F、2F內外牆收尾、8FL遮斷拆除 ② 機電工程：10F底板,樓板套管.排水套管配管施作、B1F泡沫、撒水管材預製及管路配管 ③ 安全監測：數據無異常		



本案三週進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	114 / 12 ~ 115 / 1																								備註	
		預定進度			上週進度								本週進度								下週進度									
					12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4					
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日					
一、	地上層結構工程	開始時間 114/3/27	完成時間 114/11/30	249																										
1	#9鋼構梁柱吊裝及電焊	114/11/29	114/12/22	24																										修正進度12/22
		114/11/29	114/12/22	24																										
2	11~12F鋼承板鋪設及剪力釘施作	114/12/18	114/12/30	13																										
		114/12/18																												
3	10FL點焊鋼線網鋪設及混凝土澆置	114/12/19	114/12/23	5																										
		114/12/19																												
二、	地下室裝修工程	開始時間	完成時間																											
		114/7/16	114/12/30	168																										
1	B1F牆面輕隔間施作	114/11/25	115/1/30	67																										
		114/11/25																												
2	B2F牆面輕隔間施作	114/12/10	115/1/30	52																										
		114/12/6																												
三、	地下室機電工程	開始時間	完成時間																											
		114/7/16	115/3/30	258																										
1	B6F筏基排水吊管	114/11/11	114/12/27	47																										
		114/11/11	114/12/20	40																										
2	B1F排水吊管	114/11/22	115/1/5	45																										
		114/11/22																												
3	B2F排水吊管	114/12/20	115/1/20	32																										
		114/12/20																												

議題追蹤-院部會議紀錄

鋁包版等選色選樣

同意本案鋁包版、鋁格柵、鋁門窗、鋁帷幕等選色選樣採用設計單位建議方案。

- ① 「鋁包版(室外圓柱、雨遮)、鋁格柵及矽利康」：建議白色，搭配白色矽利康。
- ② 「鋁包版(室內圓柱)及矽利康」：建議白色，搭配白色矽利康。
- ③ 「鋁帷幕及矽利康」：建議白色搭配白色矽利康；灰色搭配灰色矽利康。
- ④ 「鋁門窗及矽利康」：建議白色搭配白色矽利康；灰色、深灰搭配灰色矽利康。

戰備病床空間規劃

1. 地下B6F-B3F規劃戰備病床案，病房床間距應維持至少1公尺以上，確保有點滴架與護理治療空間，避免過於密閉以降低感染控制風險。針對空間過於擁擠及缺乏治療空間之問題，請參考成大沙崙醫院案例進行優化。
2. B3F戰備病床之配置請縮小手術室冗餘空間以增加病床間距，請工務室提出規畫方案。

進度追蹤

事項	辦況說明
建照變更	1. 設計單位已著手準備第四次建照變更相關文件。 2. 依第259次專技會議，本案第四次建照變更請待六樓PAC病房確認後啟動。
部分空間先行開放	1. 經與都發局詢問後，需先依《建築物部分使用執照核發辦法》第三條第一項第三點：「高度超過三十六公尺或十二層樓以上，或建築面積超過八〇〇〇平方公尺以上之建築物，其中任一樓層至基地地面間各層業經施工完竣。」檢討本案狀況。 2. 院方已於114/03/04發文請示中央機關(內政部國土署)解釋法律定義。 3. 依都發局於114/03/13之公文說明，本案涉及個案事實認定，仍須請建築師依規檢討辦理。 4. 依第221次專技會議，本案將於完成建照變更後依規申請B6F至1F各樓層經施工完竣之部分使用執照。 5. 依第251次專技會議，配合院方後續整體規劃，本案目標於115年7月先行開放1F以下空間。
空橋	1. 於第255次專技會議設計單位已重新調整梁柱位置以利將空橋廊道與建築物平行。 2. 依第259次專技會議，施工範圍內需移植樹木待總務室清除北院區樹木後，本案再行移植；另移除菩提樹。
靠福順路側工程	1. 依第256次專技會議，因應福順路打通方案，設計單位已報告靠福順路側區域規劃採整體高程抬高方式。 2. 依114/11/20院部晨會紀錄，請考量縮短施作工期及替代機車停車方案。 3. 依第259次專技會議，請設計單位於本次會議提報圖說；請詳後簡報。

進度追蹤

事項	辦況說明
B2F 空間調整 (醫工部)	1. 醫工部已派員至工區現場勘查並確認插座位置並已提供圖說，目前設計單位修改中。
戰備病房	1. 依第259次專技會議，請設計單位於本次會議提報相關配置及預算；設計單位已提出初步規劃方案(詳後簡報)。


職安衛安全管理

職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	本工程工區同時多處進行吊掛作業，若受限工區環境無法圈圍管制，仍應設置專人指揮，吊掛作業時應管制吊掛物下方暫停人員通行並避免施工人員於吊掛物下方進行施工作業，確保安全。
4	本工程案內施工電梯排程於 12 月20 日辦理檢查機構執行昇降設備安全檢查作業，並俟取得檢查合格證後開放使用，相關使用安全規定應公告張貼於明顯處，其操作人員應具升降機基本知識，並熟悉機械操作之各項規定，每日作業前應對各安全裝置做徹底檢查並留存紀錄備查。
5	工區進行施工架搭設作業，應依規定落實設置「施工架作業主管」進行安全檢查及監督施工人員正確使用防護具（包含落實使用背負式安全帶並正確附掛於安全母索等），確保人員作業安全。

請設計監造單位接續簡報~
謝謝

建物北側高程調整規劃

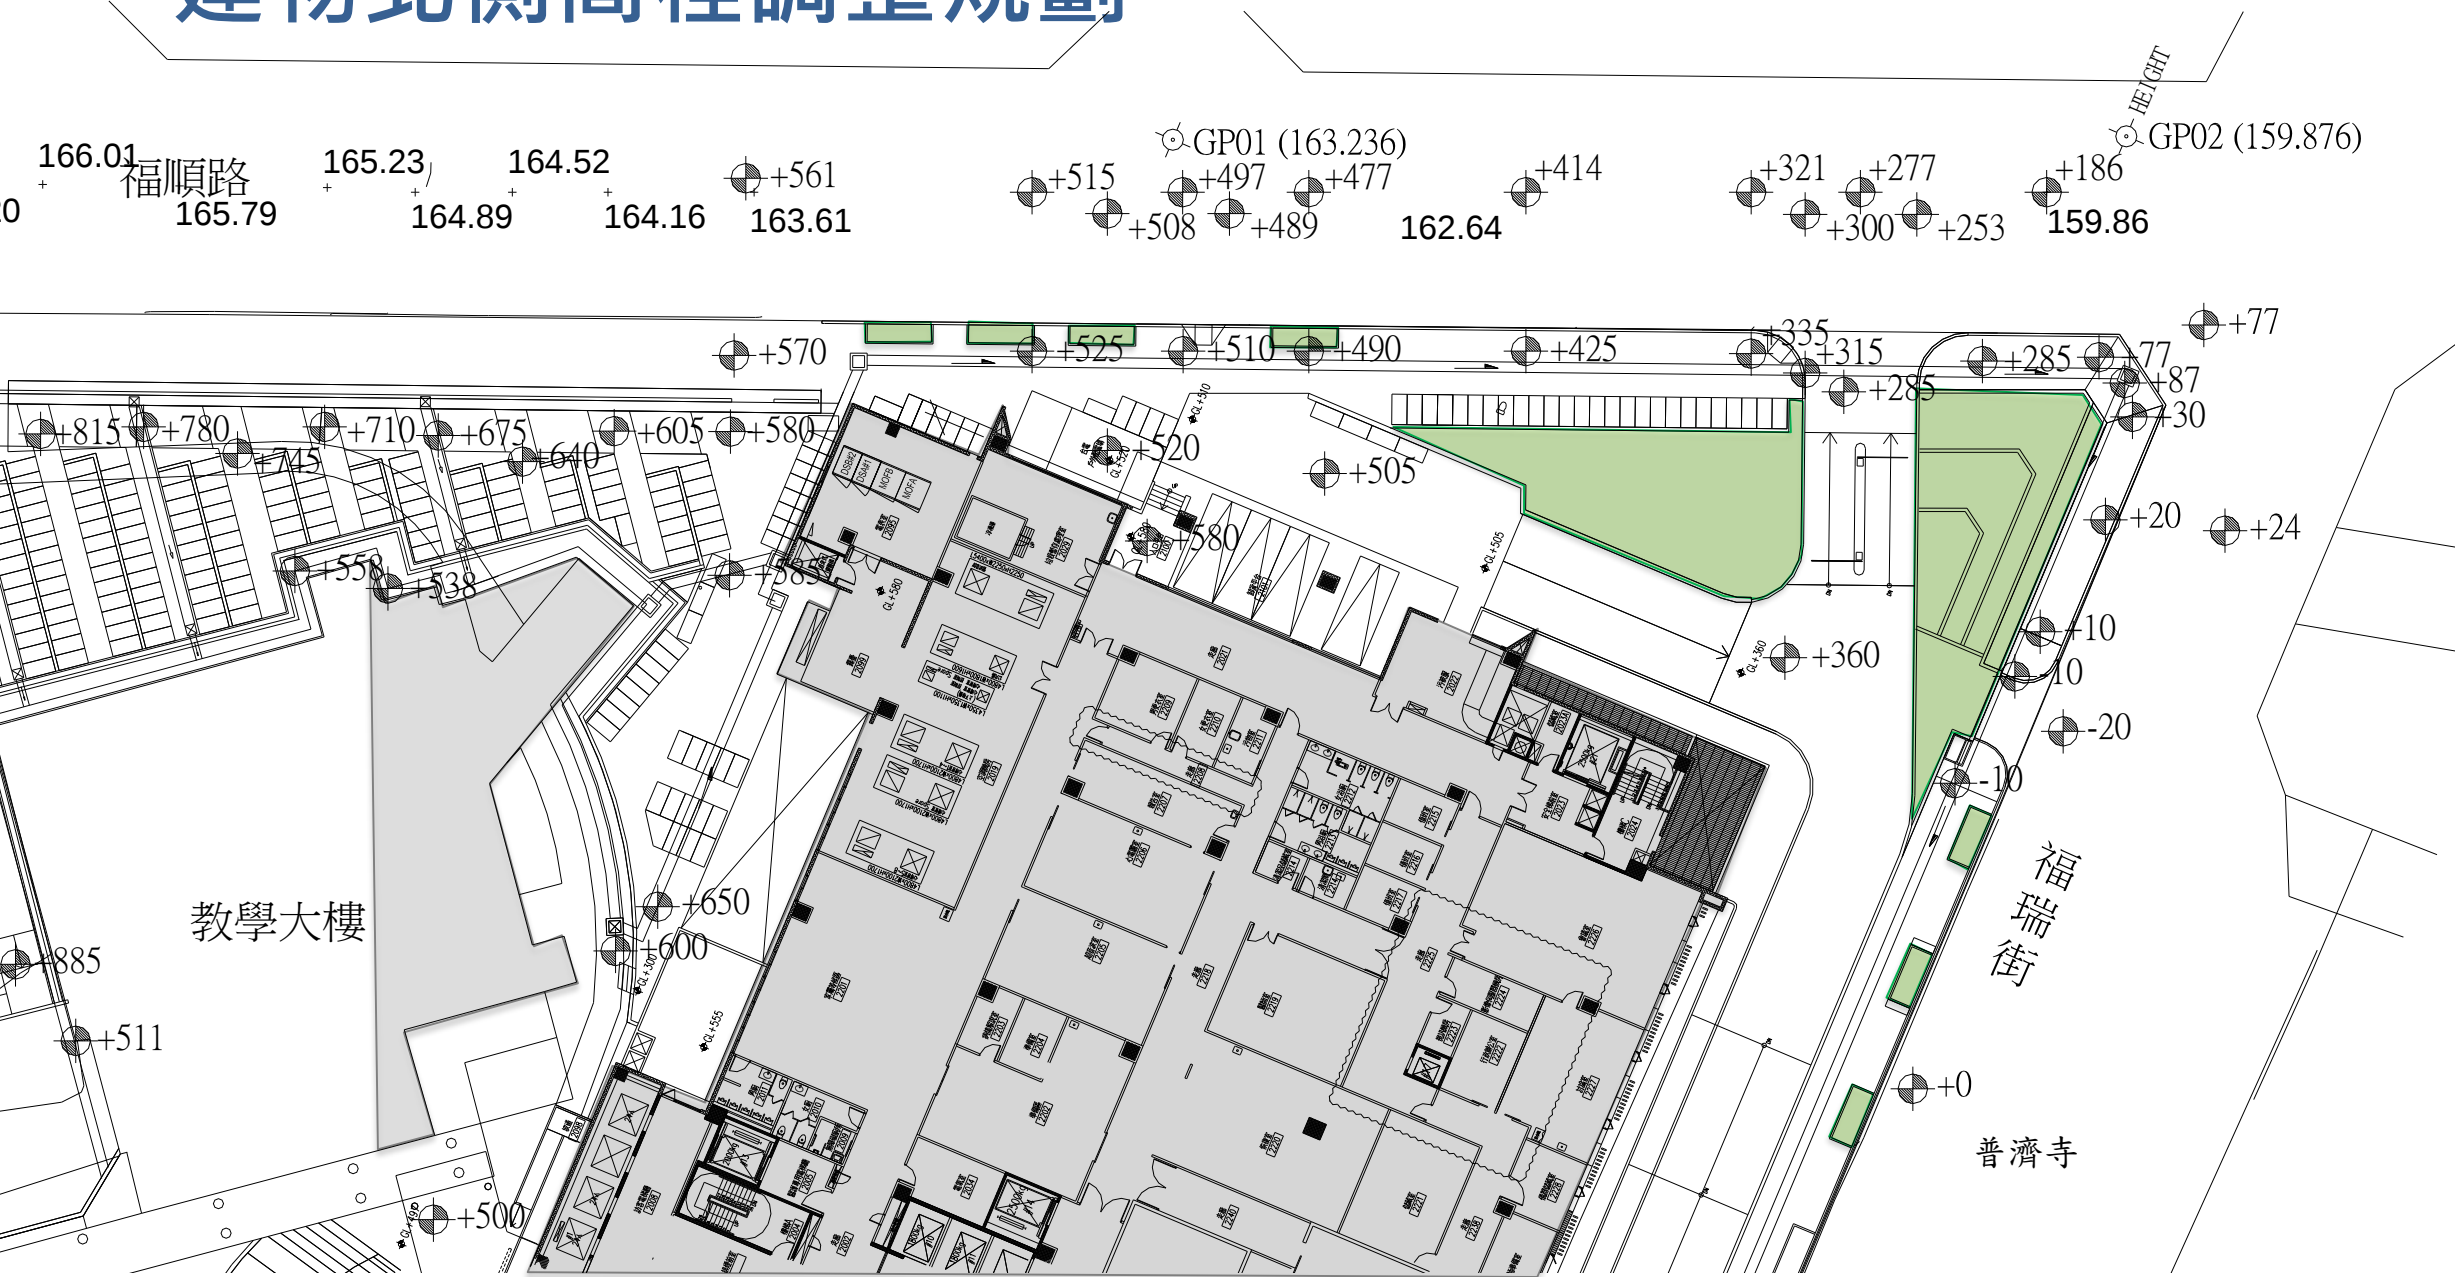

機車停車高程調整規劃



傷病患臨時收治空間規劃

第三醫療大樓之限制

1. 建築物高度不足

a) B6F~B3F 樓高360cm，淨高度310cm，仍需設置空調、氣體相關管路。

b) 排水洩水坡度難以維持。

2. 結構體特殊(無梁板系統)樓板50cm厚，已施作樓板並未留設排水口，洗孔難度高，且需避開結構配筋位置。


3. 原規劃病床電梯並未停靠B6F~B3F，病床運送困難。

4. 負壓隔離病床設置於地下室，空調難以達到負壓是否有交叉感染之疑慮。

5. 相關硬體(隔間、衛浴...等)難以即時轉換為臨時收治空間。


傷病患臨時收治空間規劃-B3F

簡易隔離(20床)
加護病房(60床)
一般病房(48床)

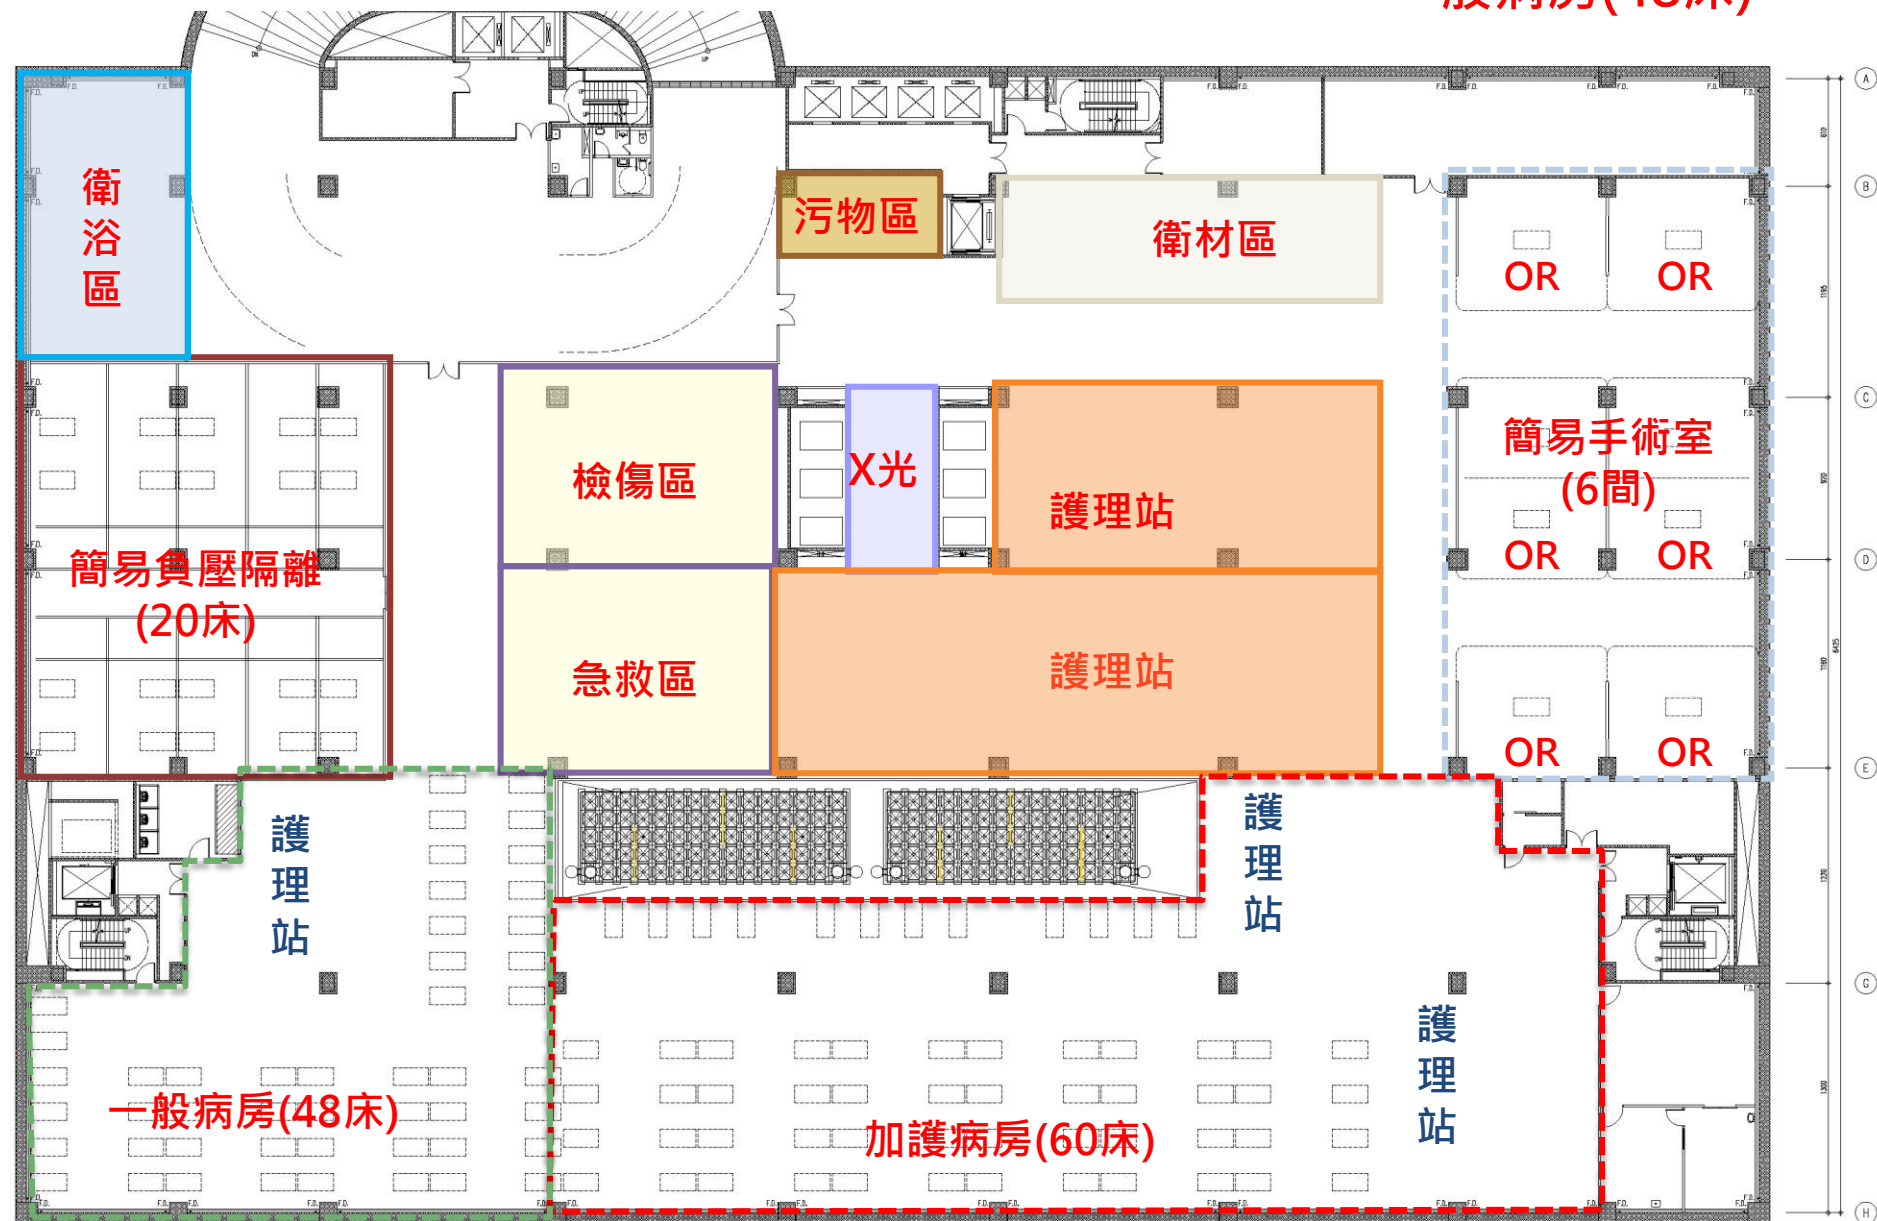


傷病患臨時收治空間規劃-B4F

一般病房(272床)

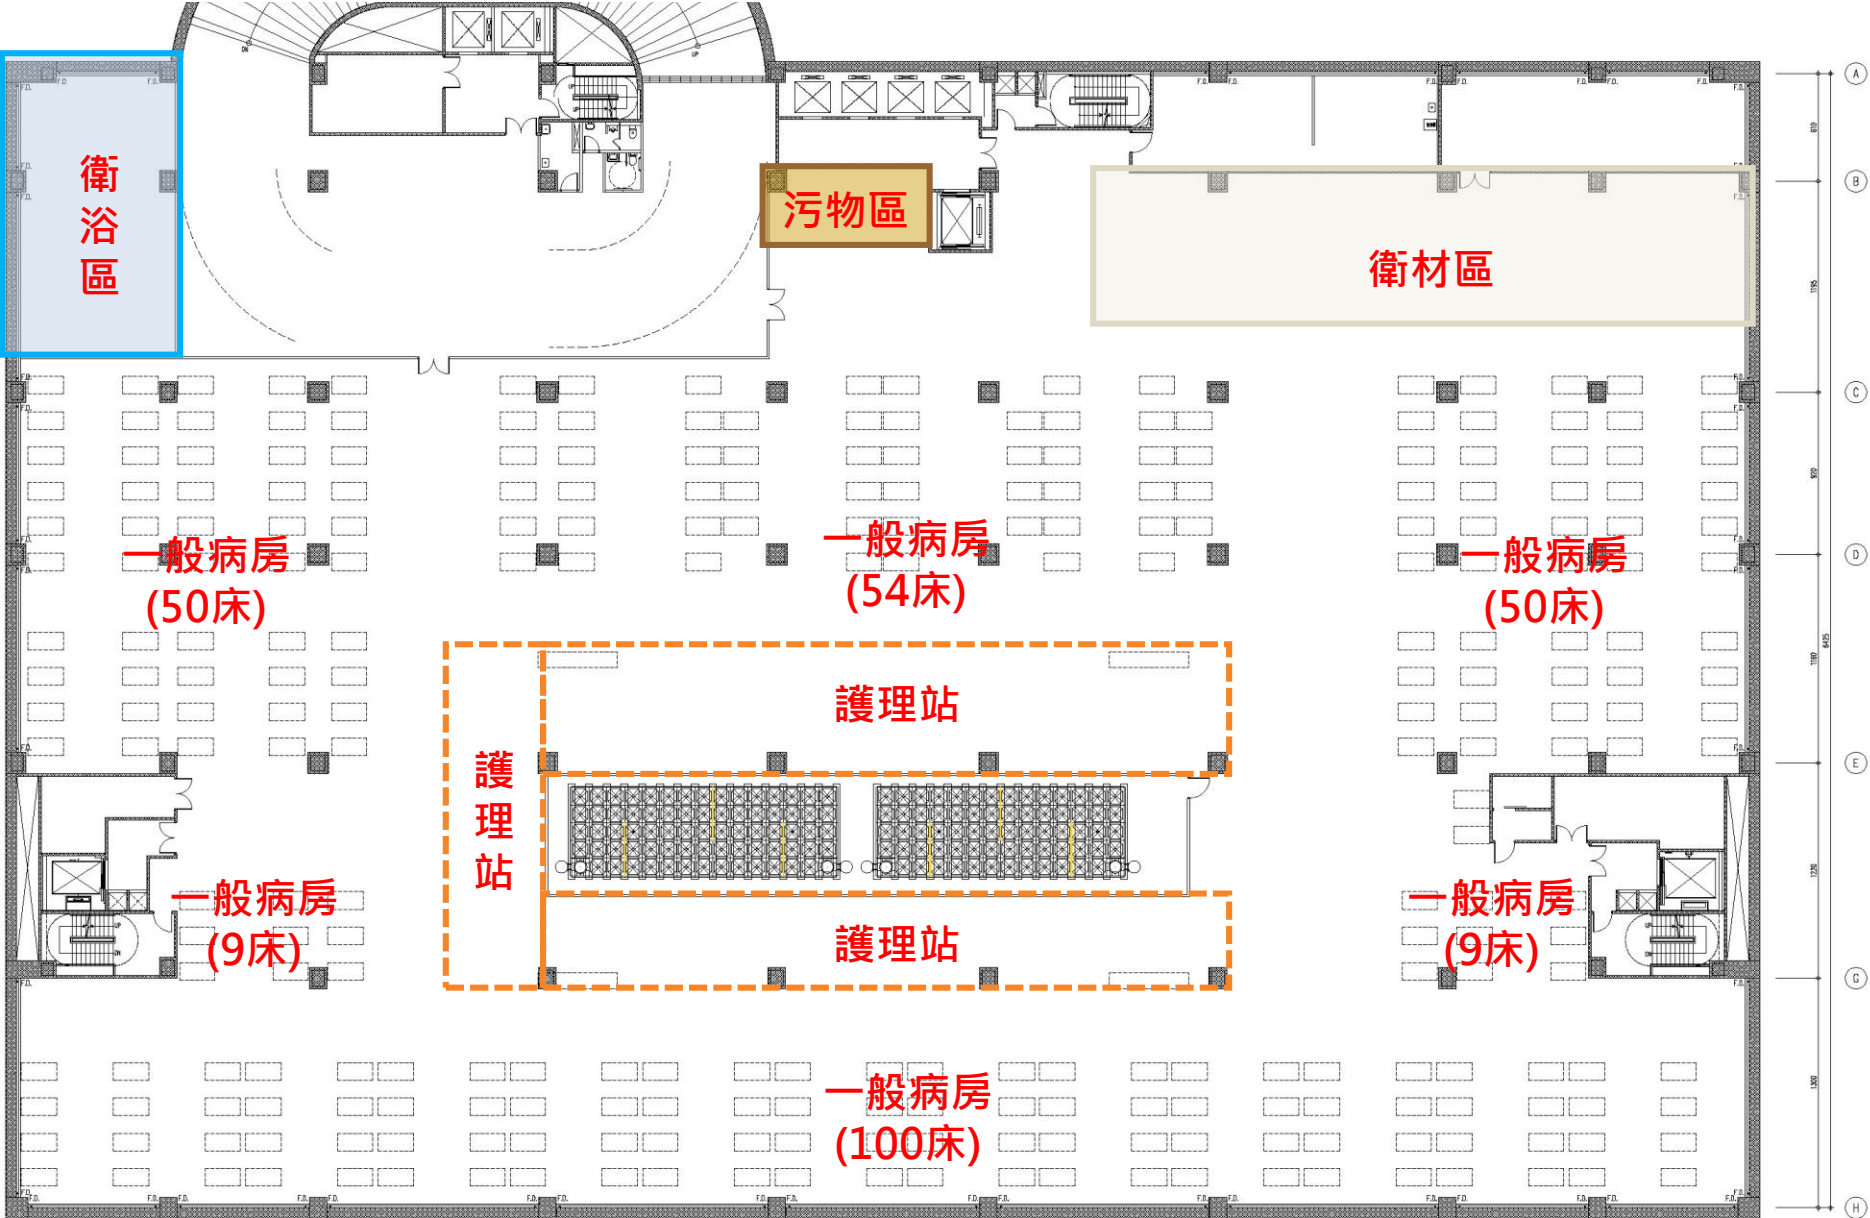

傷病患臨時收治空間規劃-B5F

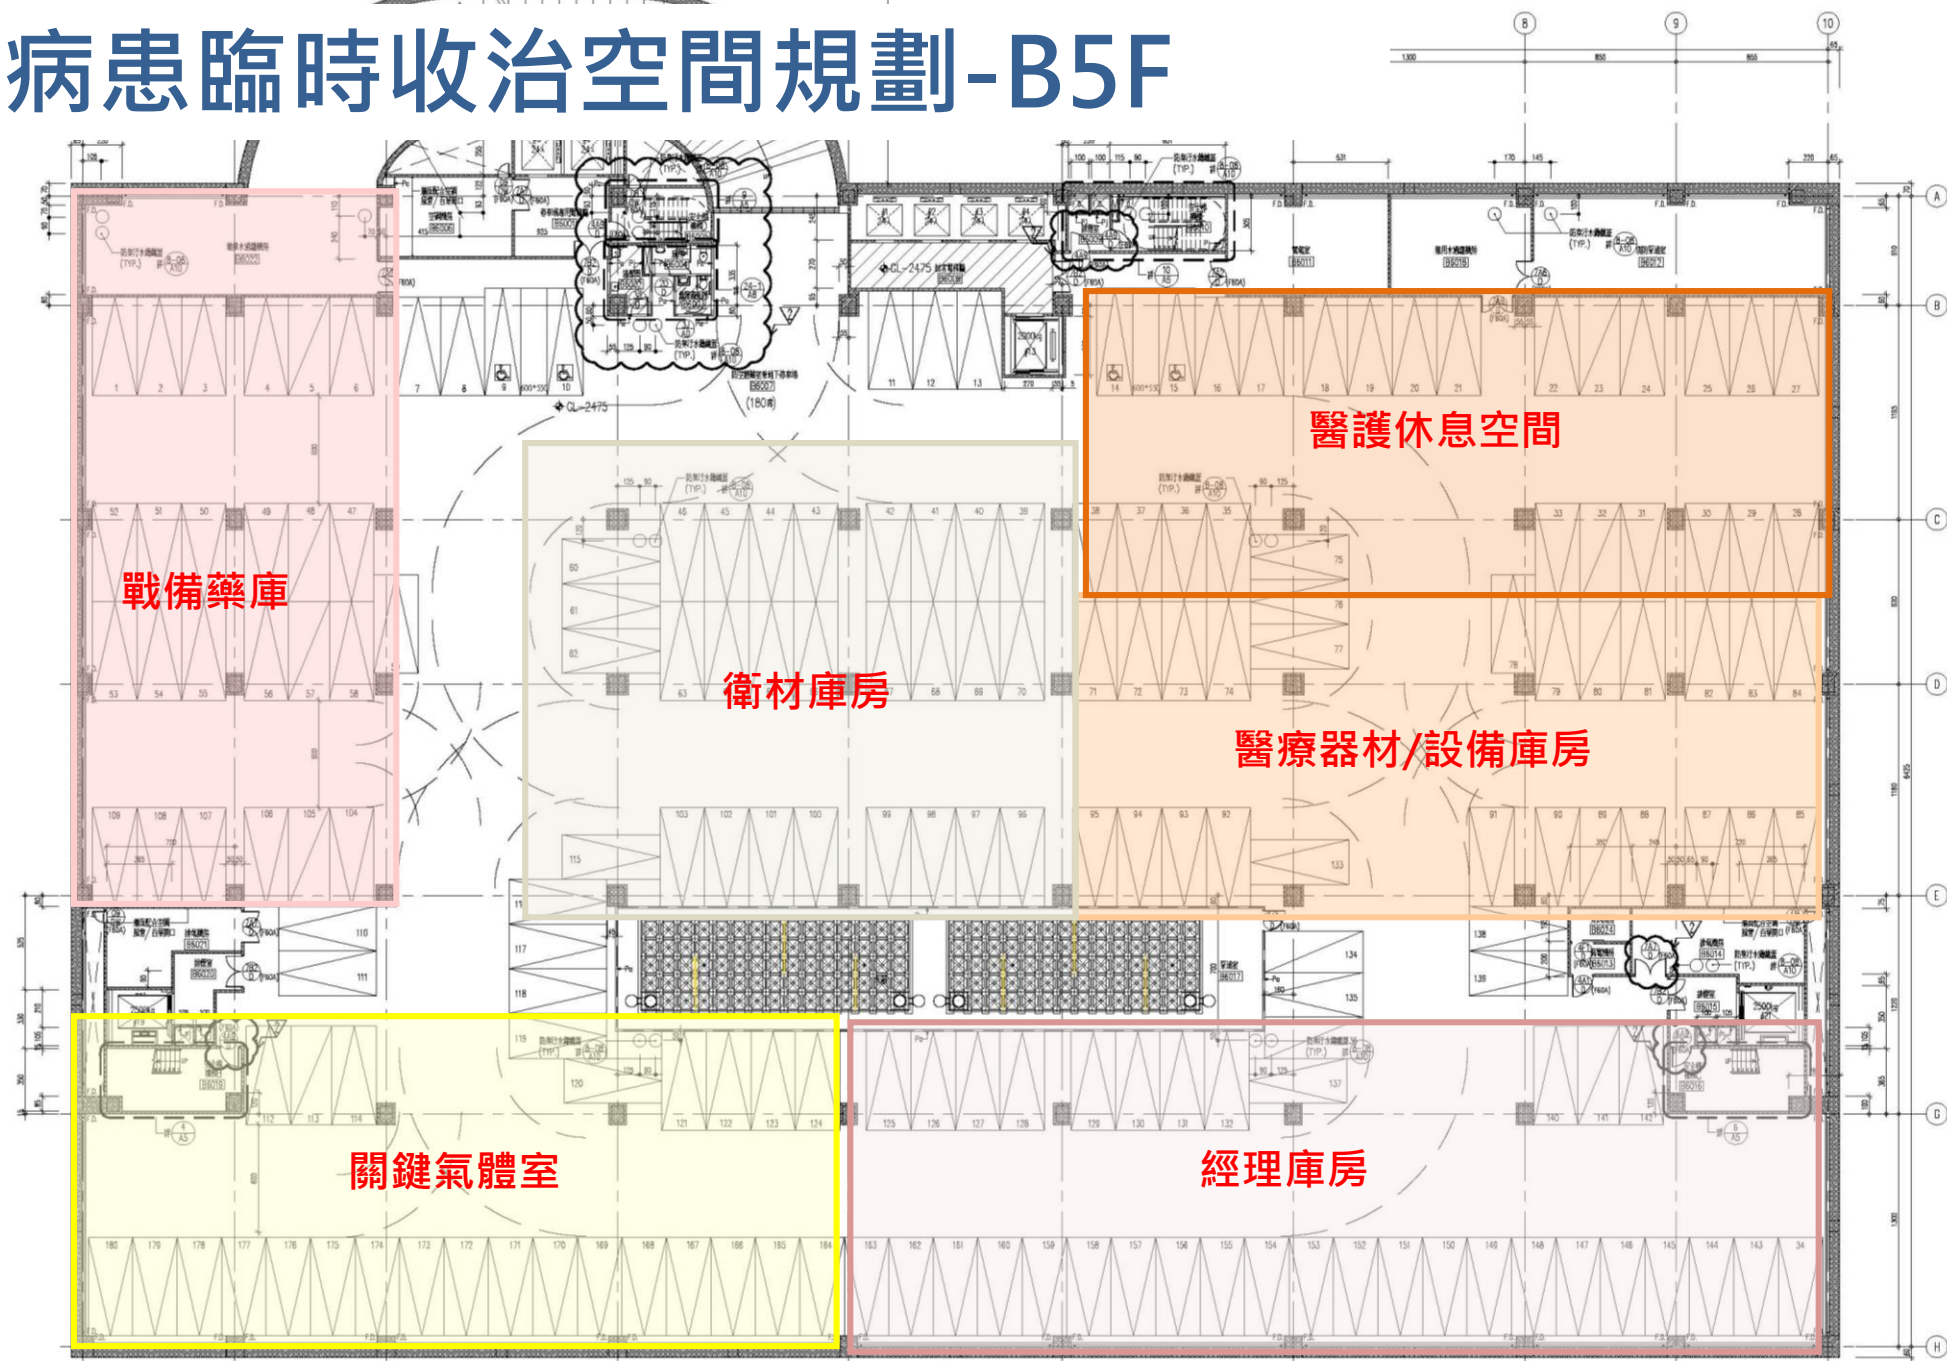

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年1月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 審 查 中	專管 核 定 中	機關 備 查 中		
分項施工計畫	113	113	0	0	2	111	0

-
- 「無線電通信輔助設備工程分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1141210008號核定 院方：中榮工字第1149927124號函備查 本項解管
 - 「組合式水箱工程」：監造：譚余中榮字第1141215003號審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141217005號核定 院方：備查中
 - 「外牆仿石塗料工程」：監造：譚余中榮字第1141216004號審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141218008號核定 院方：備查中

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年1月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已 核 定	逾 期 送 審
			監 造 審 查 中	專 管 審 定 中	機 關 核 定 中		
材料/設備送審	138	134	2	0	2	130	0
1. 「手術室裝修及設備-1」：監造：譚余中榮字第1141205001號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141209016號審定 院方：核定中							
2. 「手術室裝修及設備-2」：麗明：麗字第1141200024號函提送(第3版) 監造：譚余中榮字第1141212004號函審退(管制12月26日重新提送)							
3. 「櫥櫃設備」：麗明：麗字第0916002436號函提送 監造：譚余中榮字第1140922001號函審退(申請展延至：115年3月30日)							
4. 「防撞護牆板」：專管：銘建(榮)字第1141215001號審定 院方：中榮工字第1149927319號函核定 本項解管							
5. 「空調-鍍鋅鋼管」：監造：譚余中榮字第1141216003號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141218009號審定 院方：核定中							
6. 「泵浦組」：(管制提送時間：12月30日)							
7. 「沉水式污水泵浦」：(管制提送時間：12月30日)							
8. 「直昇機停機坪燈光及控制設備」：(管制提送時間：115年1月15日)							
9. 「殼管式熱交換器」：(管制提送時間：115年1月25日)							

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年1月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已 備 查	逾 期 送 審
			監 造 核 定 中	專 管 備 查 中	機 關 備 查 中		
施工圖	77	77	3	0	1	73	0

-
- 「6~10F樓(柱、牆、板)鋼筋施工圖」：監造：譚余中榮字第1141216002號函審定 專管：：銘建(榮)字第1141218007號備查 院方：備查中
 - 「11~12F樓(柱、牆、板)鋼筋施工圖」：麗明：麗字第1141200145號函提送 監造：核定中
 - 「13F機水電各系統施工圖」：麗明：麗字第1141200138號函提送(第3版) 監造：核定中
 - 「RF機水電各系統施工圖」：麗明：麗字第1141200139號函提送(第2版) 監造：核定中

請施工單位接續簡報~
謝謝

壹、本週及下週施工作業說明

本週(114年12月22日~114年12月28日)工程施工作業

1. 第九、10節鋼構梁電焊、11F~12F鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
2. 10FL鋼線網鋪設及混凝土澆置。
3. 2F內外牆混凝土澆置、3F牆模板施作及鋼筋綁紮。

下週(114年12月29日~115年1月4日)預定施工作業

1. 第10節鋼構梁電焊、12F、屋突層鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
2. 9FL、11FL鋼線網鋪設及混凝土澆置。
3. 3F內外牆混凝土澆置、4F牆面模板施作。

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	114 / 12 ~ 115 / 1																備註					
		預定進度			上週進度						本週進度						下週進度									
					12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30		12/31	1/1	1/2	1/3	1/4
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二		三	四	五	六	日
一、地上層結構工程		開始時間	完成時間																							
		114/3/27	114/11/30	249																						
1	#9鋼構梁柱吊裝及電焊	114/11/29	114/12/22	24																					修正進度12/22	
		114/11/29	114/12/22	24																						
2	11~12F鋼承板鋪設及剪力釘施作	114/12/18	114/12/30	13																						
		114/12/18																								
3	10FL點銲鋼線網鋪設及混凝土澆置	114/12/19	114/12/23	5																						
		114/12/19																								
二、地下室裝修工程		開始時間	完成時間																							
		114/7/16	114/12/30	168																						
1	B1F牆面輕隔間施作	114/11/25	115/1/30	67																						
		114/11/25																								
2	B2F牆面輕隔間施作	114/12/10	115/1/30	52																						
		114/12/6																								
三、地下室機電工程		開始時間	完成時間																							
		114/7/16	115/3/30	258																						
1	B6F筏基排水吊管	114/11/11	114/12/27	47																						
		114/11/11	114/12/20	40																						
2	B1F排水吊管	114/11/22	115/1/5	45																						
		114/11/22																								
3	B2F排水吊管	114/12/20	115/1/20	32																						
		114/12/20																								

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	114 / 12 ~ 115 / 1																								備註
		預定進度 	實際進度 		上週進度							本週進度							下週進度										
					12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2	1/3	1/4				
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日				
4	B6F~B3F電氣線槽	114/12/10	115/1/15	37																									
		114/12/12																											
5	B2F~B1F消防水主管配管 (消防栓、撇水、泡沫、採水)	114/11/3	115/1/30	89																									
		114/11/10																											
6	B5F電信線槽安裝	114/11/14	114/12/21	38																									
		114/11/14	114/12/21	38																									
7	B3F電信線槽安裝	114/12/22	115/2/4	45																									
		114/12/22																											
8	B6F~B3F空調水系統配管	114/11/5	115/12/19	410																									
		114/11/5	114/12/19	45																									
9	B1F空調水系統配管	114/12/22	115/1/30	40																									
		114/12/22																											
10	B1F空調風管配管	114/11/24	114/12/30	37																									
		114/11/24																											
11	B6F~B3F空調導流風機安裝	114/11/24	114/12/30	37																									
		114/11/24																											
附註：																													

(2025.12-2025.2)三月施工進度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司							臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程				2025/12/14	
2025.12~2026.2工期預定進度表												
識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	第四季				第一季	
							2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月		
1		結構體工期	819 d	2024/1/15	2026/4/24							結構體工期
2		地下室工程	537 d	2024/1/15	2025/7/12							
213		鋼構工程	88 d	2025/9/25	2025/12/21							
214		鋼梯&雨披&修改&電焊	28 d	2025/10/15	2025/11/11							
236		440	88 d	2025/9/25	2025/12/21							
237		# 7_8FL~9FL	44 d	2025/9/25	2025/11/7							
260		# 8_10FL~11FL	32 d	2025/10/28	2025/11/28							
277		# 9_12FL~13FL	15 d	2025/11/29	2025/12/13							
289		# 10_R1FL~PRFL	8 d	2025/12/14	2025/12/21							
296		600	71 d	2025/10/5	2025/12/14							
297		5FL修改工程	3 d	2025/10/16	2025/10/18							
298		# 7_8FL~9FL	27 d	2025/10/5	2025/10/31							
310		# 8_10FL~11FL	25 d	2025/11/2	2025/11/26							
319		# 9_12FL~13FL	14 d	2025/11/26	2025/12/9							
327		# 10_R1FL~PRFL	10 d	2025/12/5	2025/12/14							
332		鋼承板工程	90 d	2025/10/2	2025/12/30							
333		2FL_DECK	6 d	2025/10/2	2025/10/7	124						
334		3FL_DECK	5 d	2025/10/13	2025/10/17							
335		4FL_DECK	7 d	2025/10/18	2025/10/24							
336		5FL_DECK	5 d	2025/10/8	2025/10/12	121						
337		5FL_DECK修改區(含開孔)	3 d	2025/10/26	2025/10/28	85,38						
338		6FL_DECK	7 d	2025/11/14	2025/11/20							
339		7FL_DECK	4 d	2025/11/21	2025/11/24	338						
340		8FL_DECK	7 d	2025/11/25	2025/12/1							
343		9FL_DECK	8 d	2025/11/28	2025/12/5							
346		10FL_DECK	7 d	2025/12/6	2025/12/12	343						
349		11FL_DECK	7 d	2025/12/13	2025/12/19	346						
352		12FL_DECK	7 d	2025/12/16	2025/12/22							
355		13FL模板	8 d	2025/12/23	2025/12/30	352						
358		RFL_DECK	5 d	2025/12/23	2025/12/27	354						
359		剪力釘	86 d	2025/10/8	2026/1/1							
409		點焊鋼網鋪設	102 d	2025/10/12	2026/1/21							
410		2FL_wire mesh	2 d	2025/10/12	2025/10/13	175						
411		3FL_wire mesh	2 d	2025/10/25	2025/10/26	176						
412		4FL_wire mesh	4 d	2025/11/19	2025/11/22							
413		5FL_wire mesh	2 d	2025/11/1	2025/11/2	178						
414		6FL_wire mesh	4 d	2025/11/27	2025/11/30							
415		7FL_wire mesh	4 d	2025/12/3	2025/12/6	414FS+2						
416		8FL_wire mesh	5 d	2025/12/14	2025/12/18							
419		9FL_wire mesh	4 d	2025/12/19	2025/12/22							

2FL_DECK10/7

3FL_DECK10/13

4FL_DECK10/17

5FL_DECK10/8

5FL_DECK修改區(含開孔)10/26

6FL_DECK11/14

7FL_DECK11/21

2FL_wire mesh10/12

3FL_wire mesh10/25

4FL_wire mesh11/19

5FL_wire mesh11/1

6FL_wire mesh11/27

7FL_wire mesh12/3

8FL_wire mesh

9FL_wire mesh

10FL_DECK

11FL_DECK

12FL_DECK

13FL模板

RFL_DECK12/23

5FL修改工程10/16

2FL_wire mesh10/12

3FL_wire mesh10/25

4FL_wire mesh11/19

5FL_wire mesh11/1

6FL_wire mesh11/27

7FL_wire mesh12/3

8FL_wire mesh

9FL_wire mesh

10FL_DECK

11FL_DECK

12FL_DECK

13FL模板

RFL_DECK12/23

5FL修改工程10/16

第 1 頁

(2025.12-2025.2)三月施工進度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司							臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程					2025/12/14
2025.12~2026.2工期預定進度表												
識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	第四季	2025年10月	2025年11月	2025年12月	第一季	2026年1月
422		10FL_wire mesh	4 d	2025/12/23	2025/12/26							
425		11FL_wire mesh	8 d	2025/12/30	2026/1/6							
428		12FL_wire mesh	4 d	2026/1/7	2026/1/10							
431		13FL_鋼筋綁紮	7 d	2026/1/13	2026/1/19							
434		RFL_wire mesh	1 d	2026/1/20	2026/1/20	433						
435		混凝土澆置(含標高、遮斷、開孔、預留筋)	79 d	2025/11/4	2026/1/21							
436		2FL_RC	1 d	2025/11/6	2025/11/6	230FF+1						
437		3FL_RC	1 d	2025/11/7	2025/11/7	436						
438		4FL_RC	1 d	2025/12/9	2025/12/9							
439		5FL_RC	1 d	2025/11/4	2025/11/4	204						
440		6FL_RC	1 d	2025/12/2	2025/12/2							
441		7FL_RC	1 d	2025/12/7	2025/12/7	415						
442		8FL_RC	1 d	2025/12/19	2025/12/19	416						
443		9FL_RC	1 d	2025/12/23	2025/12/23	419						
444		10FL_RC	1 d	2025/12/27	2025/12/27	422						
445		11FL_RC	1 d	2025/12/23	2025/12/23	421						
446		12FL_RC	1 d	2026/1/7	2026/1/7	425						
447		13FL_RC	1 d	2026/1/20	2026/1/20	433						
448		RFL RC	1 d	2026/1/21	2026/1/21	434						
449		內外牆結構工程	151 d	2025/11/21	2026/4/24							
450		2F	25 d	2025/11/21	2025/12/15	436FS+14						
451		3F	14 d	2025/12/16	2025/12/29	450						
452		4F	14 d	2025/12/30	2026/1/12	451						
453		5F	14 d	2026/1/13	2026/1/26	452						
454		6F	14 d	2026/1/27	2026/2/9	453						
455		7F	10 d	2026/2/10	2026/2/23	454						
456		8F	10 d	2026/2/24	2026/3/5	455						
457		9F	10 d	2026/3/6	2026/3/15	456						
458		10F	10 d	2026/3/16	2026/3/25	457						
459		11F	10 d	2026/3/26	2026/4/4	458						
460		12F	10 d	2026/4/5	2026/4/14	459						
461		13F	10 d	2026/4/15	2026/4/24	460						
462		地下室隔間工程	62 d	2025/11/27	2026/1/27							
463		B1F	62 d	2025/11/27	2026/1/27							
467		B2F	49 d	2025/12/9	2026/1/26							

The Gantt chart visualizes the construction schedule from November 21, 2025, to January 26, 2026. It details the timing for various tasks across different floors and structural components. Key tasks include the construction of floors 2F through 13F, as well as the RFL RC (Reinforced Concrete) work. The chart uses color-coded bars to represent different task types and includes labels for specific dates and task identifiers.

第 2 頁

參、上週工程施工照片



說明：工地空拍照。



說明：鋼線網鋪設。



說明：鋼承板鋪設。



說明：鋼線網鋪設。

參、上週工程施工照片



說明：預埋套管安裝。



說明：排水管配管。



說明：混凝土抗壓試驗。



說明：樓版混凝土澆置及粉光作業。

簡報結束，謝謝
