

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

11月月會暨第255次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：114 年 11 月 18 日(星期二) 下午 02 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 114 年 11 月 16 日止，使用工期：1031 日曆天(不含免計工期 12 天)，剩餘 846 日曆天(展延工期 27 天)。
- 工程進度截至 114 年 11 月 16 日，預定進度 14.829%，實際進度 30.930%，超前進度：16.101%(約超前 214 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
下構結構體工程	115/04/13			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 結構體工程：第八節 D 區鋼梁吊裝、第八節塔吊區(440)柱對接電焊、第八節塔吊區(600)調整柱位偏差、1FL 變更水電開孔施作、4FL 及 6FL 剪力釘植焊、9F 吊裝平台連結版施作。
 2. 機電工程：B5F 泡沫管路補漆、泡沫幹管配管、B6~B3F 水配管、3F 頂版探測器預埋配管。
 3. 安全監測：數據無異常。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於 112/03/10 發文予院方，院方於 112/03/22 發文向文化部申請預繳展期；文化部於 112/03/28 函復同意本案公共藝術經費得展延至民國 115 年 12 月 31 日前繳納。

2. 依 113/09/26 第七次臺中市政府公共藝術審議委員會決議，本案未通過。目前進度：第五次執行小組會議已於 113/11/14(四)召開，專管單位將依會議決議修正後再行提請院方召開執行小組會議供委員審查。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為吊裝第八節鋼構梁柱及電焊、6F~9F 鋼承板鋪設及剪力釘施作、4FL 機電管路放樣及配管、鋼線網進料吊運，工程進度超前中。

2. 議題追蹤：

- (1) 建照變更：經設計單位說明，第三次建照變更業經臺中市政府都市發展局簽准，預計可於今日取得；同時將啟動第四次建照變更之相關文書作業，以利後續程序辦理。

- (2) 部分空間先行開放：經設計單位提醒，本案目標為 115 年 7 月先行開放一樓以下空間，除建築與機電工程外，景觀工程亦須如期完成。經主席裁示，為確保先行使用目標順利達成，請施工單位與列管單位先行研議景觀工程是否可拆案施作；若無法拆案，請院方與臺中市政府召開專案會議共同協調。

(3) 變更設計相關審查會：

- A. 針對第二次變更設計審查會委員所提「評估常開式雙扇防火門是否需增設門扇閉合順位器（以確保雙開門依正確順序關閉，達到防火與防煙效果）」，經本次會議主席裁示，採施工單位所提調整門扇閉合速度之方式即可達成相同效益，故本案不另行增設相關項目。

- B. 第三次變更設計聯合圖審修正圖說，請設計單位於 114/11/19 前提送；並經主席裁示，第三次變更設計圖說請工務室於 114/11/30 前完成核定。

另經施工單位提問，考量須待第四次建照變更完成後方能提送消防局進行消防圖說變更，若現階段依第三次變更設計圖說施作，後續消防局如提出審查意見將需再行調整。經主席裁示，同意施工單位得先行依第三次變更設計圖說施作消防工程；另請設計單位先行提供消防圖說，由院方轉請消防局預先審查，若後續仍有審查意見且已完成管路配置部分（依第三次變更設計圖說施作部分）；相關拆除及重置費用，一併於第四次變更設計中辦理。

- (4) 空橋：依第 254 次專技會議內容，設計單位已調整梁柱位置，使空橋廊道得以與建築物平行（詳簡報 P.12）。經施工單位說明，待設計單位提送相關圖說後，將儘速

安排試挖作業，另針對空橋工期安排需於年底開工；經主席裁示，請施工單位於施工期間協助維持院內交通動線之順暢，以利院方運作。

(5) 機車停車場規劃：

- A. 因應臺中市新建工程處於 114/06/27 至本案會勘福順路打通工程施工界面研討，後因本案基地地標高較福順路低，為避免日後院區發生淹水情形，請設計單位針對本案重新進行高程檢討(包含 112/10/24 完成部分驗收之教學大樓後方機車停車場)。
- B. 設計單位檢討方案詳後簡報 P.8~P.9，經主席裁示採方案 2 進行，請設計單位估算該方案所需土方量；另請工務室確認灣橋分院工程產生之廢棄土方量，評估二者是否得相互配合，相關評估及配合事宜請於下周提報；本案靠福順路側高層檢討乙案，納入後續第四次變更設計辦理。

(6) B2F 變更設計-營養室：營養室變更設計需求詳後簡報 P.16~P.17，經主席同意變更並納入第三次變更設計辦理，另提醒目前簡報資料之用印簽認尚未包含該科室主任簽章，請設計單位補充完成相關簽認程序。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

伍、散會(下午 03 時 00 分)

陸、會議照片



臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

114年11月份工程月會報暨第255次專業技術協調會 會議簽到表

- 壹、 會議時間：114 年 11 月 18 日(星期二) 下午 2 時 00 分
 貳、 會議地點：行政大樓 七樓會議室
 參、 主持人：李副院長 政鴻
 肆、 出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院			
副院長	李政鴻		
主任秘書	姚銘		
醫企部	李吉勳 李銘中 李銘中	醫工部	王聖魁
工務室	江南 陳建輝 馬志遠 鍾景輝		
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司			
賴銘昌 賴銘昌 陳秋屏 江意萱			
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所			
譚俊彥 余曉嵐 楊雅麗			
施工廠商-麗明營造股份有限公司			
黃仁政 林建銘 楊雅麗 黃建輝			

第三醫療大樓新建工程

114年11月月會暨第255次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明

工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.17	目標第一階開放	115年7月31日
		目標整體完工日期	116年3月19日
使用工期 (截至114.11.16止)	1031日曆天(不含免計工期12天)，剩餘 <u>846</u> 日曆天(展延工期27天)		
工程進度 (截至114.11.16止)	預計：14.829% 實際：30.930%	進度差	+16.101% (約超前214天)
目前工程施作項目	① 結構體工程：第八節D區鋼梁吊裝、第八節塔吊區(440)柱對接電焊、第八節塔吊區 (600) 調整柱位偏差、1FL變更水電開孔施作、4FL及6FL剪力釘植焊、9F吊裝平台連結版施作 ② 機電工程：B5F泡沫管路補漆、泡沫幹管配管、B6~B3F水配管、3F頂版探測器預埋配管 ③ 安全監測：數據無異常		



本案三週進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	114 / 11 ~ 114 / 11																								備	註
		預定進度			上週進度							本週進度							下週進度											
		實際進度			11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30					
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日					
一、地上層結構工程		開始時間 2025/3/27	完成時間 2025/11/30	249																										
1	#8鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間 2025/10/23	完成時間 2025/11/16	25																										
		2025/10/25																												
2	6F~9F鋼承板鋪設及剪力釘施作	開始時間 2025/10/25	完成時間 2025/11/24	31																										
		2025/10/25																												
3	2FL~5FL點銲鋼線網鋪設及混凝土澆置	開始時間 2025/10/16	完成時間 2025/11/15	31																										
		2025/10/16	2025/11/15	31																										
4	1F鋼網牆及鋼筋綁紮	開始時間 2025/10/18	完成時間 2025/11/15	29																										
		2025/10/18	2025/11/14	28																										
二、地下室裝修工程		開始時間 2025/7/16	完成時間 2025/12/30	168																										
1	B2F~B1F輕隔間工程	開始時間 2025/10/24	完成時間 2025/11/30	38																										
		2025/10/24																												
2	B6F~B3F電力照明及插座拉線	開始時間 2025/8/5	完成時間 2025/11/12	100																										
		2025/8/5	2025/11/12	100																										
3	B6F~B3F複壁排水	開始時間 2025/10/5	完成時間 2025/11/14	41																										
		2025/10/10	2025/11/14	36																										
4	B2F~B1F複壁排水	開始時間 2025/11/14	完成時間 2025/11/29	16																										
		2025/11/14																												
5	B6F複基排水吊管	開始時間 2025/11/11	完成時間 2025/12/7	27																										
		2025/11/11																												
6	B2F~B1F消防水主管配管 (消防栓、撇水、泡沫、採水)	開始時間 2025/11/3	完成時間 2026/1/30	89																										
		2025/11/10																												
7	B6F~B3F電信線槽吊子安裝	開始時間 2025/10/20	完成時間 2025/12/20	62																										
		2025/10/21																												
8	B6F電信線槽安裝	開始時間 2025/11/10	完成時間 2025/12/9	30																										
		2025/11/10																												

進度追蹤

事項	辦況說明
建照變更	1. 依第245次專技會議，經評估若長青分院於114年10月核准後，<u>第四次建照變更</u>行政流程至少仍需14.5個月。 2. 目前辦況：第三次建照變更已經建管處簽准，預計於本周取得。
部分空間 先行開放	1. 經與都發局詢問後，需先依《建築物部分使用執照核發辦法》第三條第一項第三點：「高度超過三十六公尺或十二層樓以上，或建築面積超過八〇〇〇平方公尺以上之建築物，其中任一樓層至基地地面間各層業經施工完竣。」檢討本案狀況。 2. 院方已於114/03/04發文請示中央機關(內政部國土署)解釋法律定義。 3. 依都發局於114/03/13之公文說明，本案涉及個案事實認定，仍須請建築師依規檢討辦理。 4. 依第221次專技會議，本案將於完成建照變更後依規申請B6F至1F各樓層經施工完竣之部分使用執照。 5. 依第251次專技會議，配合院方後續整體規劃，本案目標於115年7月先行開放1F以下空間。
變更設計 相關審查會	1. 第二次變更設計審查會已於114/11/11召開，請設計單位於<u>114/11/25前提送相關補正文件</u>，後續由院方審核無誤後通過。 2. 第三次變更設計聯合圖審已於114/11/05召開，請設計單位於<u>114/11/19前提送修正版圖說</u>。
空橋	1. 依第253次專技會議，各單位會後共同至現場會勘空橋落柱位置及施工圍籬範圍，依該日決議：須請施工單位於施作期間至少留設一道車道供院內民眾通行、並請設計單位結構技師檢討調整空橋基礎尺寸設計方案。 2. 依第254次專技會議，需請設計單位重新調整梁柱位置以利將空橋廊道與建築物平行。(詳後簡報)
高層檢討	1. 依第254次專技會議，因應福順路打通方案，需請設計單位進行高層檢討。(詳後簡報)

職安衛安全管理


職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	本工程工區同時多處進行吊掛作業，若受限工區環境無法圈圍管制，仍應設置專人指揮，吊掛作業時應管制吊掛物下方暫停人員通行並避免施工人員於吊掛物下方進行施工作業，確保安全。
4	本工程現階段施工有諸多高空作業之工項，請施工團隊於存在墜落風險之工作區域設置適當之墜落災害防止設施，並請持續向施工人員宣導墜落預防意識並加強糾正施工人員不安全之行為，近日偶有發現「施工人員於鋼樑上行進時，未將安全帶掛置於安全母索」之情事，請加強巡檢及糾正改善。
5	施工現場進行燒焊作業，焊接過程產生的火花、高溫和電弧會引燃可燃物料，使火災或爆炸發生。故須採取適當的防火和防爆措施，如清空焊接周圍的雜物或使用防火物料包覆工作區域以防止火花噴濺直接接觸可燃物質，施工範圍內應設置滅火設備及監火人員，以確保安全。

請設計監造單位接續簡報~
謝謝

機車停車場規劃說明

方案1:機車停車場不變，靠近道路側做擋土牆

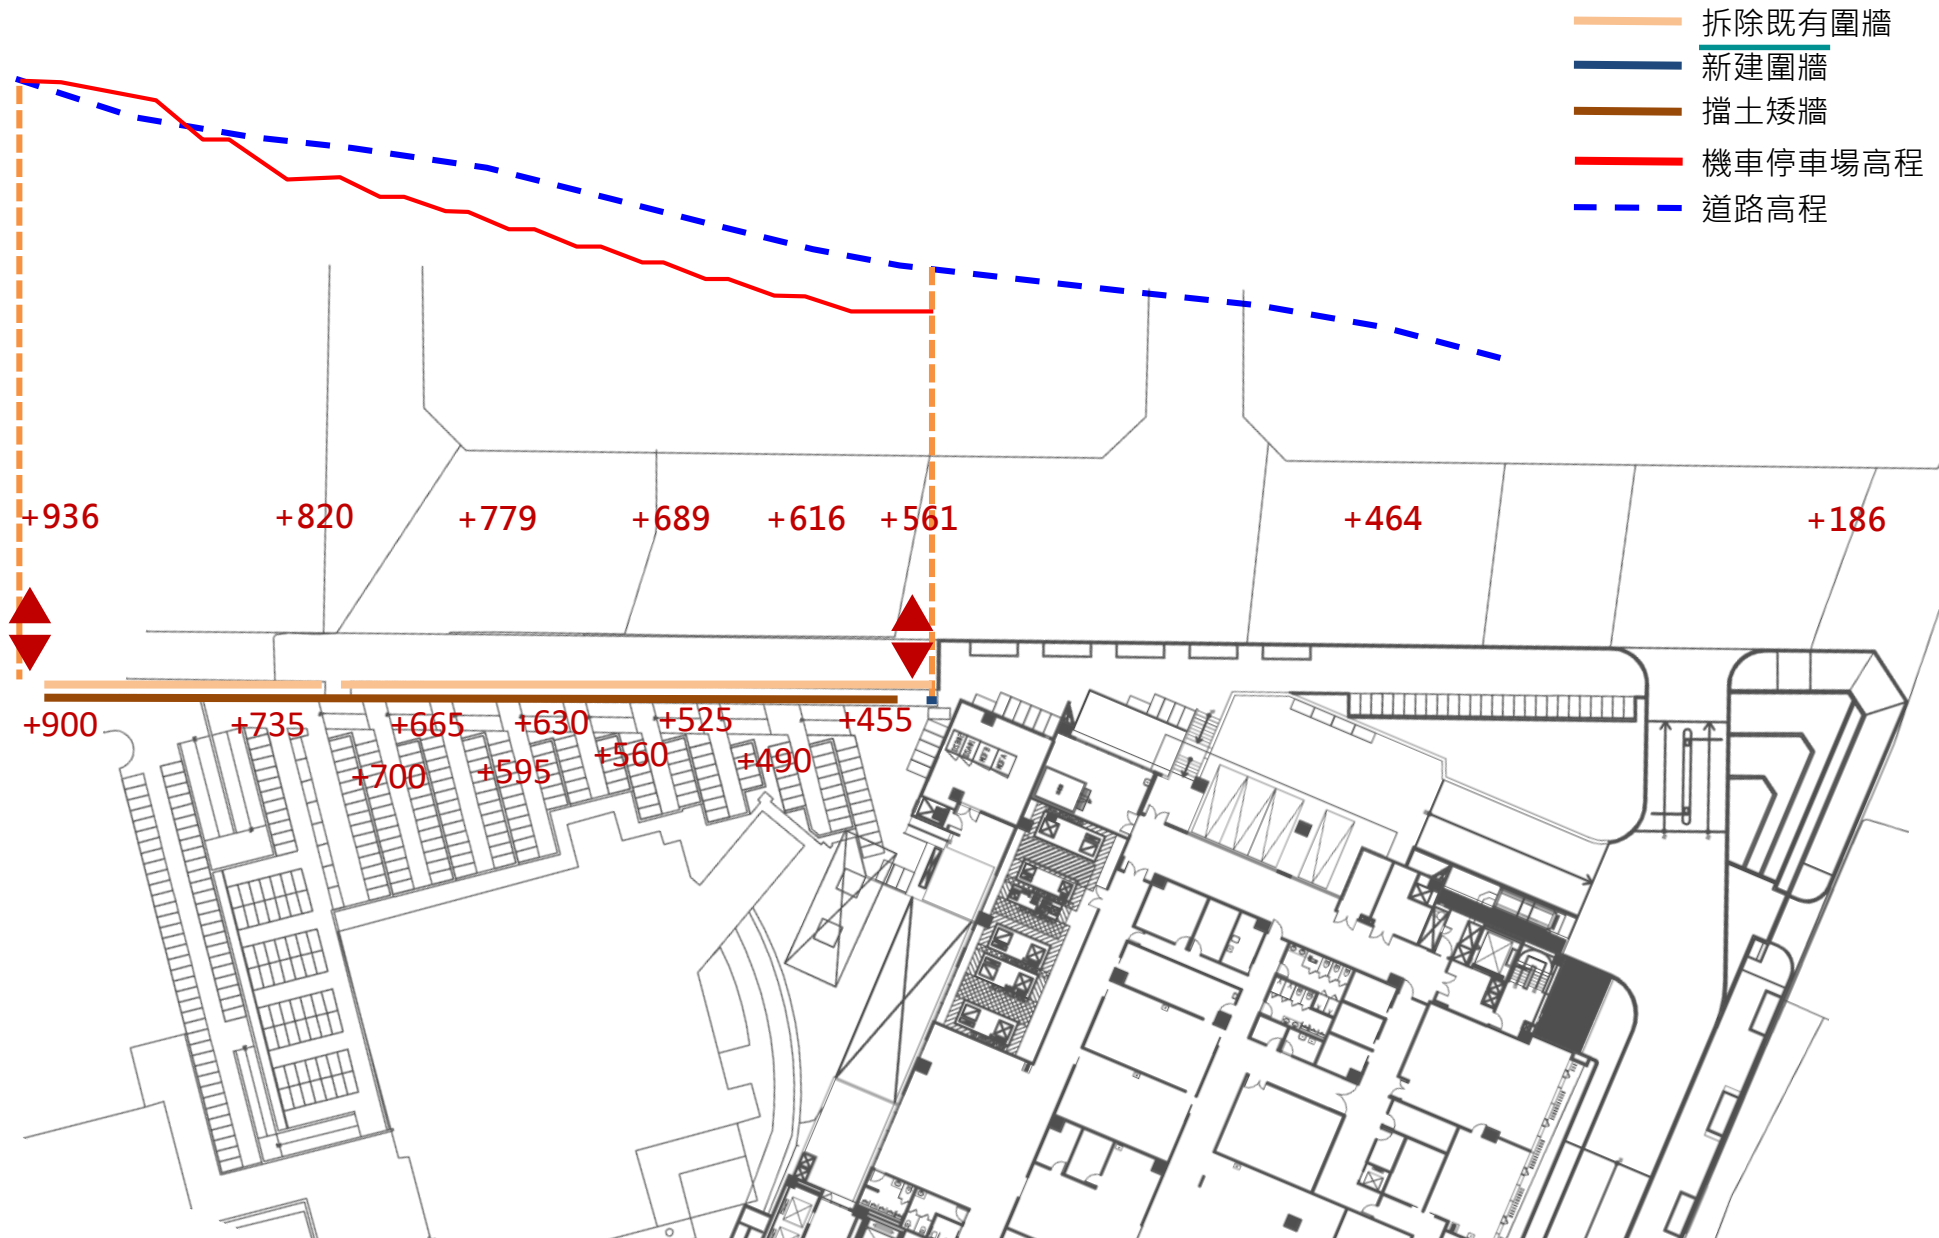


方案 2: 整體高程抬高，靠近行政大樓處做擋土牆




空橋規劃說明


空橋配置 1F 變更前(10/17開會版本)

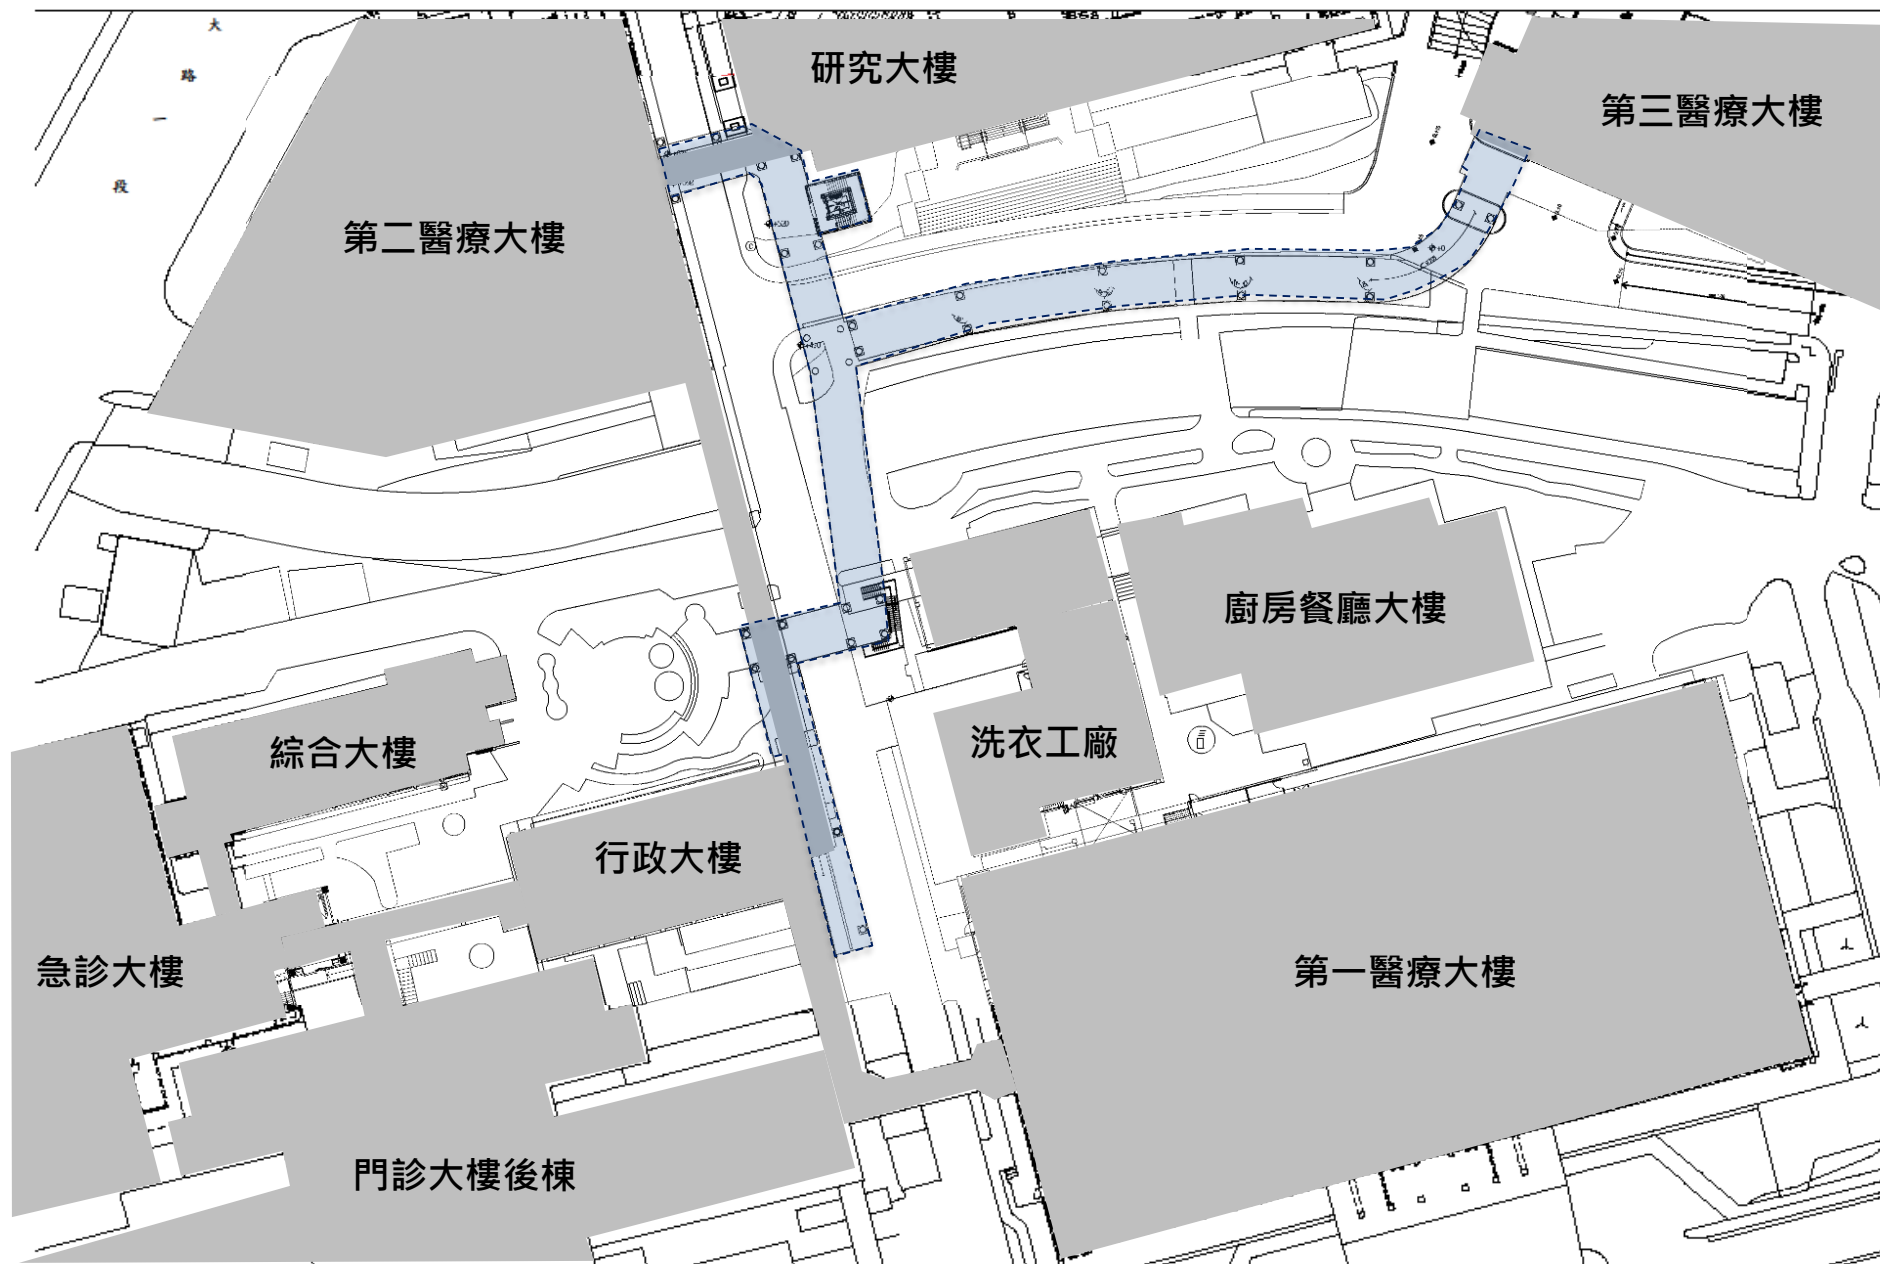


空橋配置 1F 變更後

管線位置

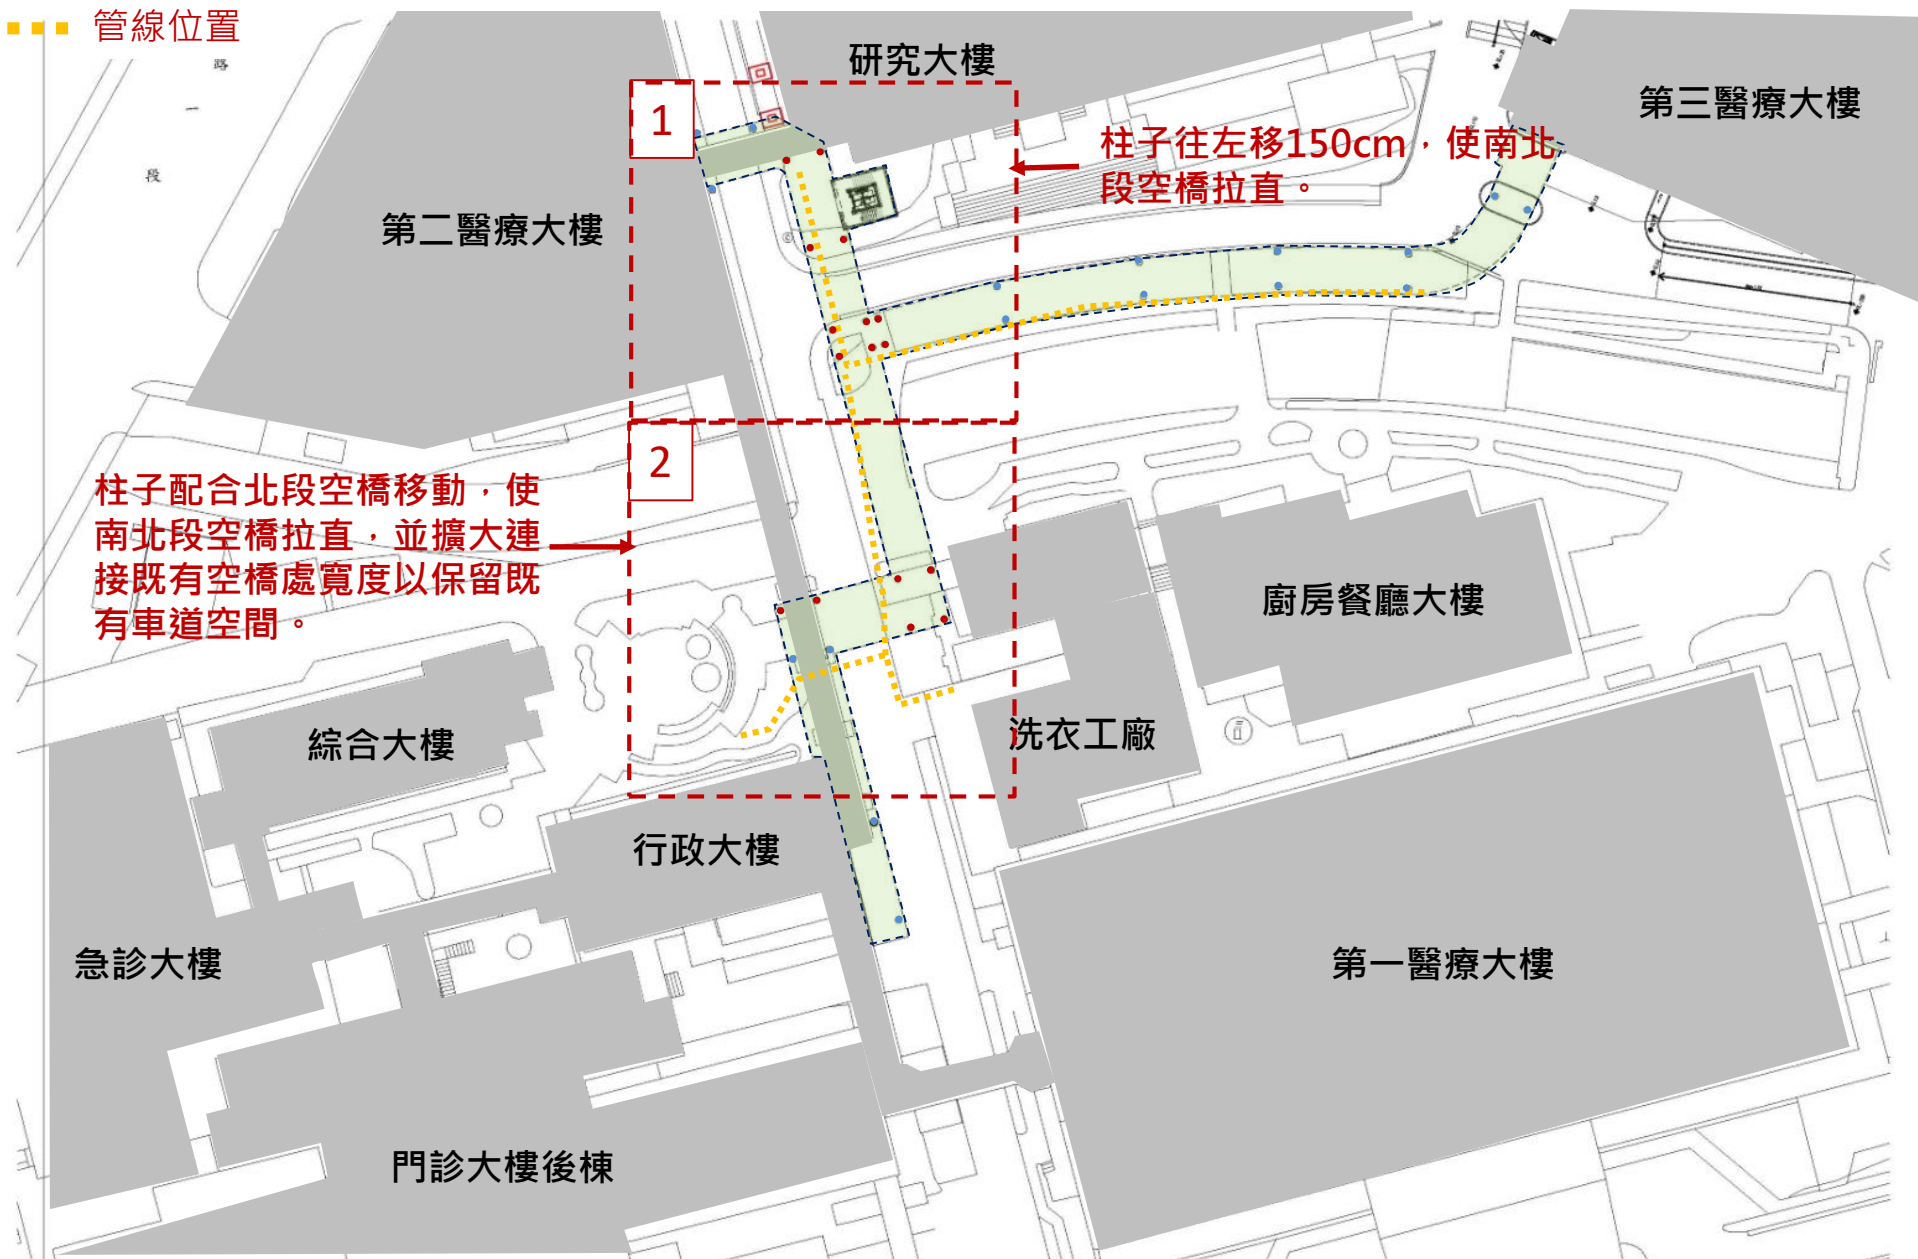

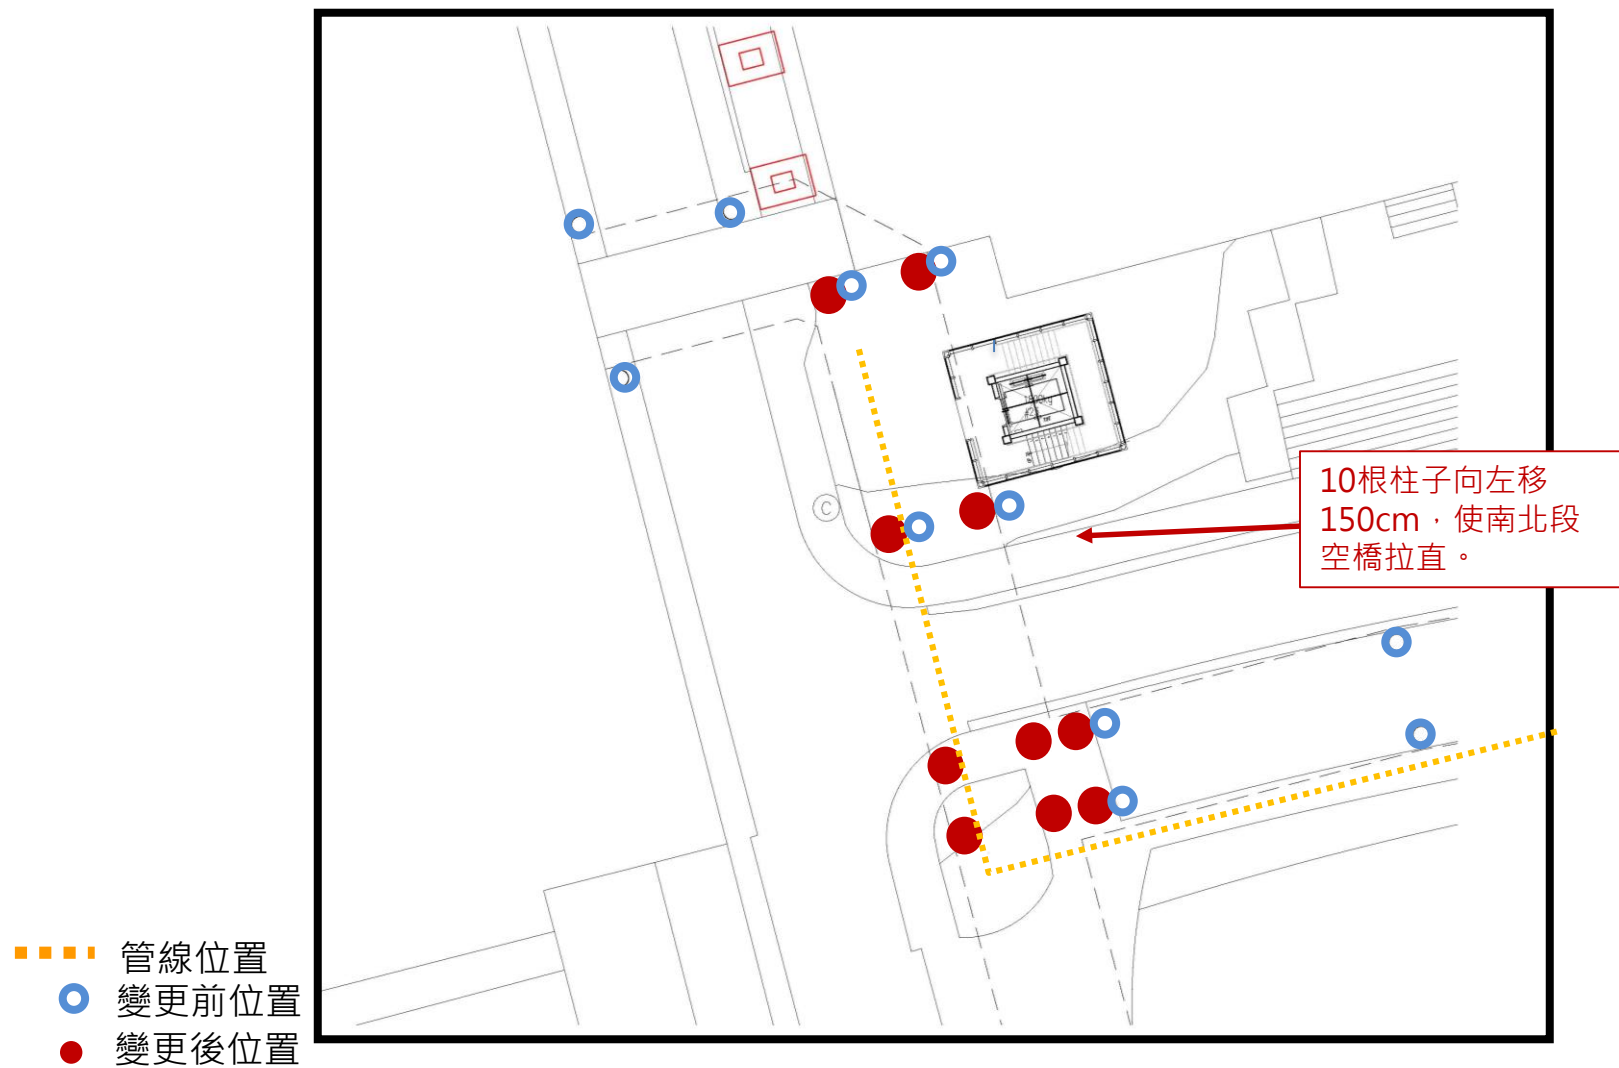

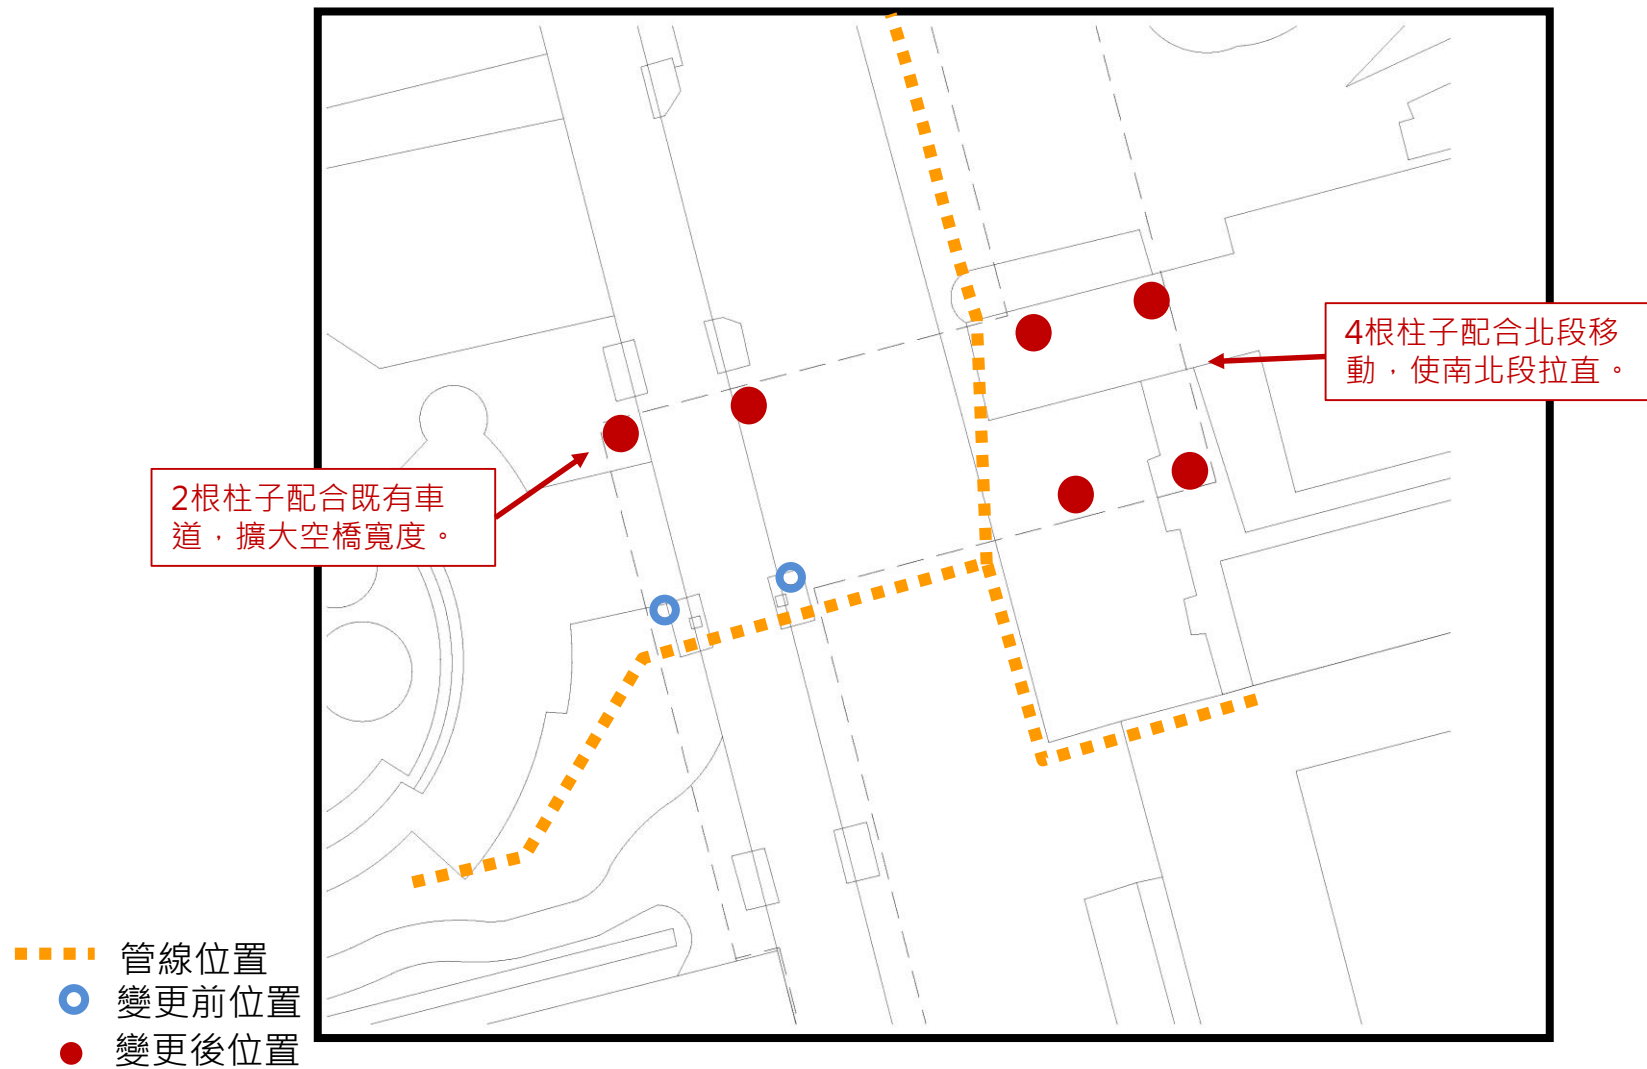

營養室規劃說明

B2F變更設計-營養室

新增需求：


- 1.配膳輸送帶兩側及設有電源插座，取消垂吊插座組。
- 2.考量推車動線陰井下方水槽櫃移設置左側。
- 3.考量配膳區有洗地需求，因感控考量配膳區不能設置水溝，水溝設置於洗碗區殷井旁。
- 4.烘乾消毒櫃增加活動推車12台。
- 5.拖把槽、清潔用品櫃移至洗碗區。
- 6.洗碗區塵土清潔墊及陰井尺寸修正。

使用單位用印：

王華寧

營養室王華寧
營養師兼組長


1111
1200

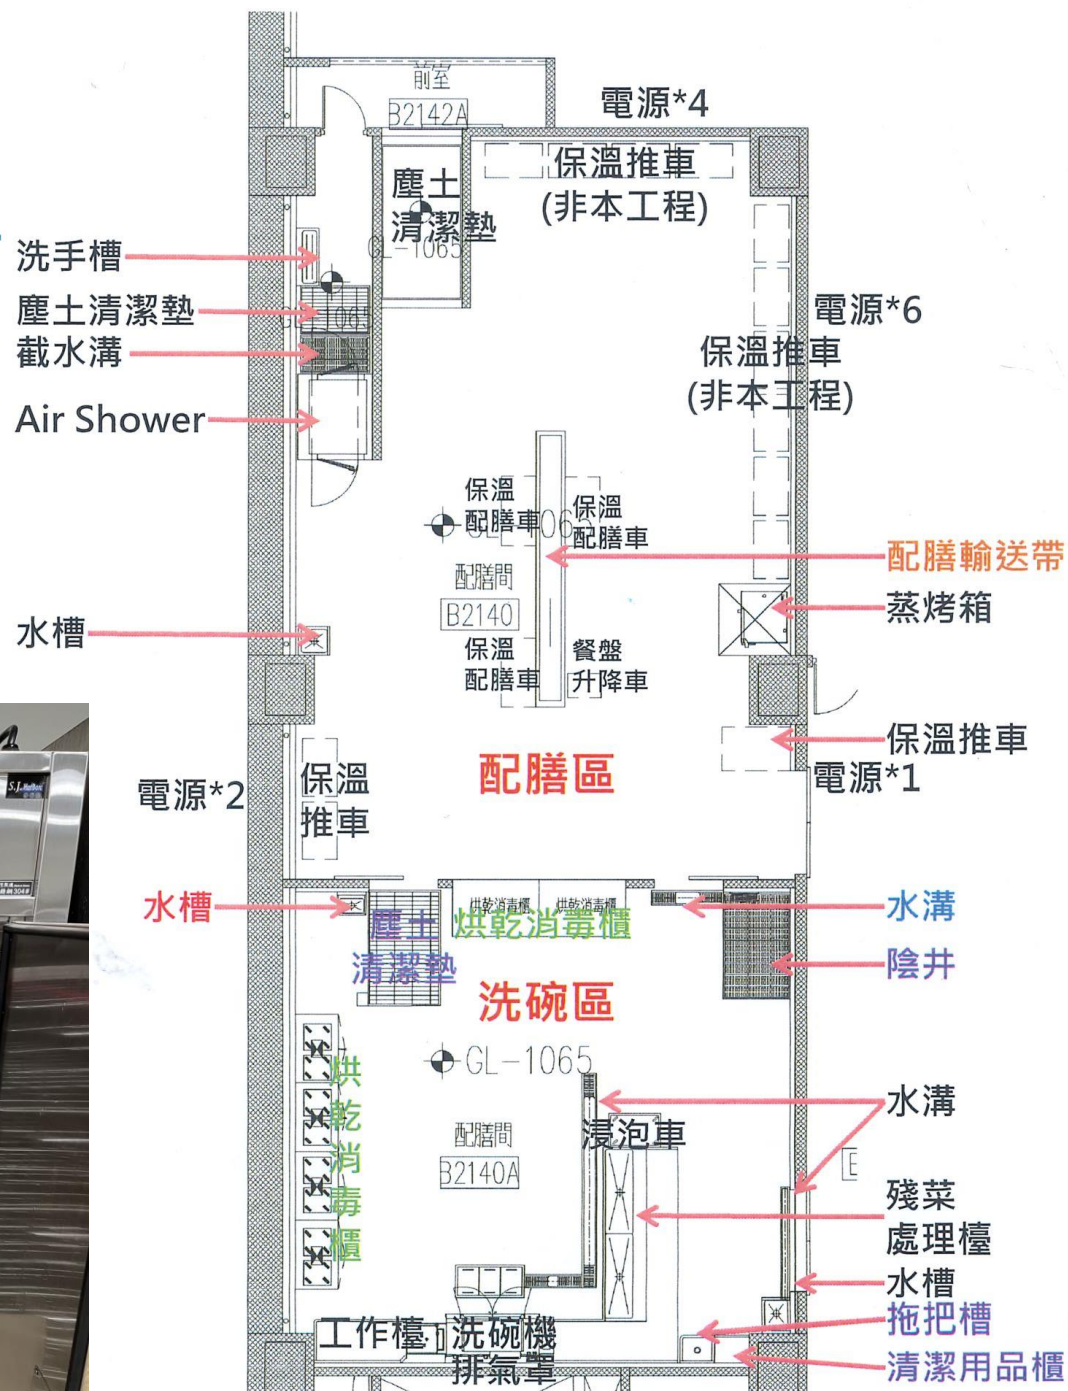

B2F變更設計-營養室

第三次變更內容(114年3月12日第220次專技會議決議核定)：

- 1.入口洗手槽需設置感應龍頭，冷水。
- 2.配膳區水槽需設置一般龍頭，冷/熱水。
- 3.拖把槽取消，清潔用品櫃移至洗碗區
- 4.保溫推車停靠牆面需設置110V(三孔)插座，高度120cm
- 5.活動工作檯取消
- 6.垂吊插座組調整與輸送帶同向，並設置燈管(200cd)與燈罩
- 7.配膳輸送帶前移
- 8.洗碗區2處水槽需設置一般龍頭，冷/熱水。
- 9.殘菜處理檯水槽取消殘菜孔，將洗碗機旁之水槽移置前方
將2處水槽並排設置即可，型式比照現況水槽為長型且前方有作業平台
- 10.浸泡槽車原3座，現僅保留1座
- 11.地坪改為工業地坪。

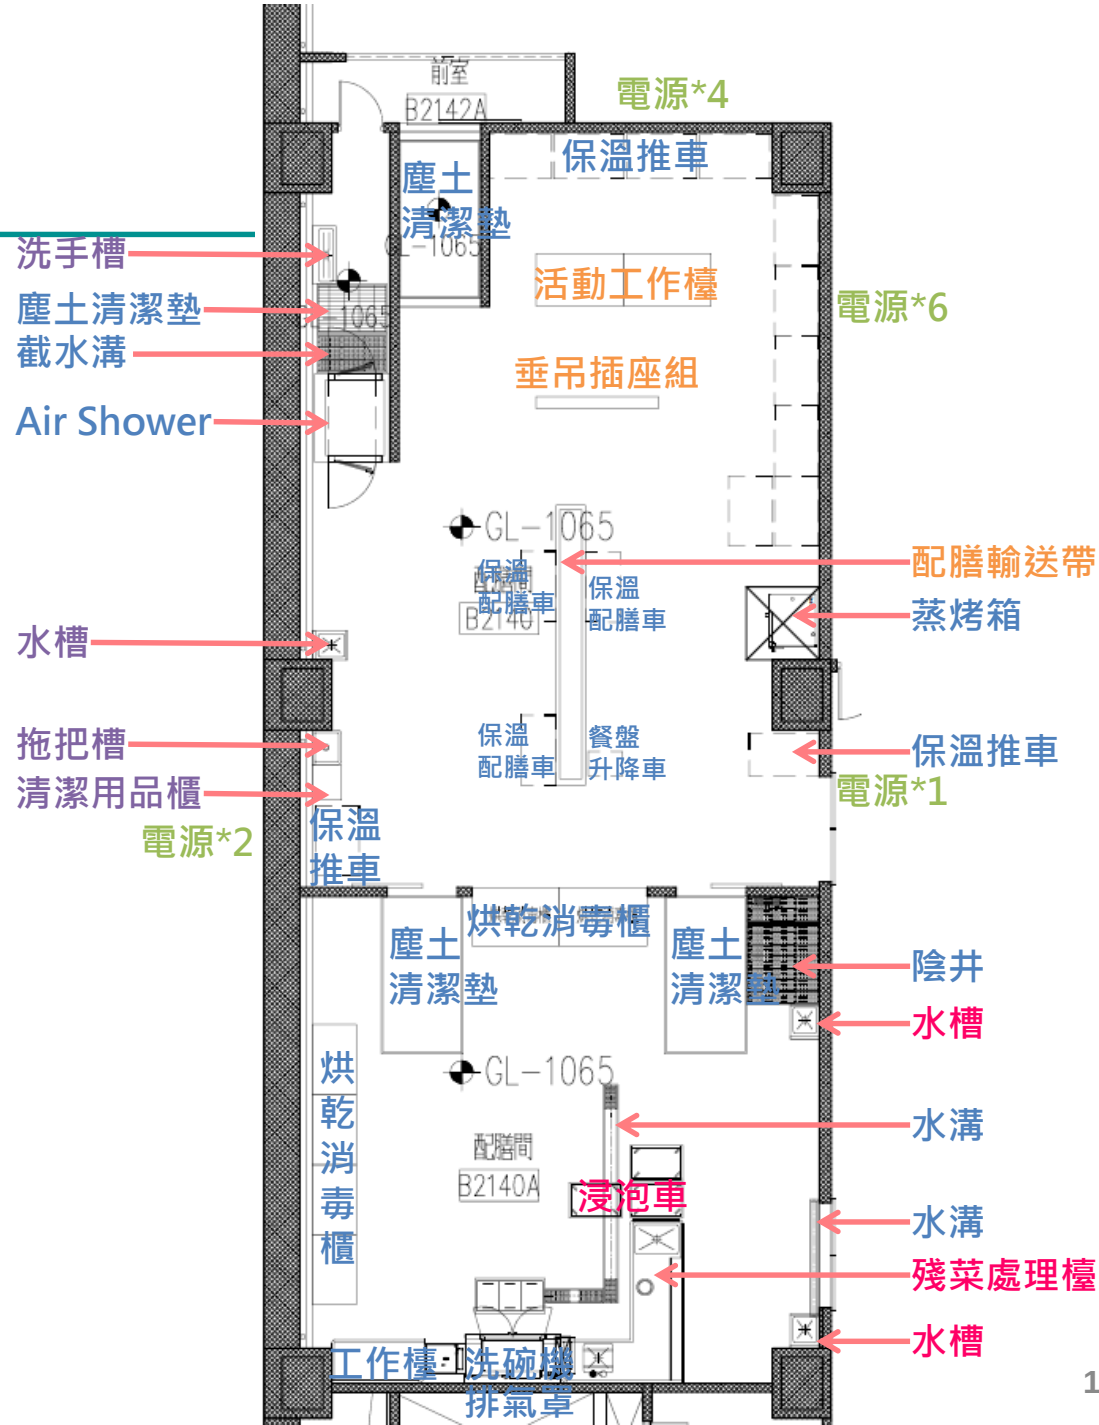

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年12月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 審 查 中	專管 核 定 中	機關 備 查 中		
分項施工計畫	110	110	2	1	2	105	0

-
1. 「護士呼叫系統設備工程分項施工計畫」：專管：銘建(榮)字第1141023004號核定 院方：中榮工字第1140302664號函備查 **本項解管**

2. 「智慧醫療系統設備工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1141110002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141114008號核定 院方：備查中

3. 「中央監控系統設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第1105002806號函提送 監造：譚余中榮字第1141111003號函審查合宜 專管：核定中

5. 「智慧建築整合系統工程分項施工計畫」：麗明：麗字第1111002850號函提送 監造：譚余中榮字第1141117003號函審退(管制時間：12月1日)

6. 「扶手欄杆工程分項施工計畫」：麗明：麗字第1106002816號函提送 監造：譚余中榮字第1141111002號函審退(管制時間：11月25日)

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年12月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已 核 定	逾 期 送 審
			監 造 審 查 中	專 管 審 定 中	機 關 核 定 中		
材料/設備送審	129	127	3	0	7	117	0
1. 「手術室裝修及設備-1」：麗明：麗字第0915002423號函提送 監造：譚余中榮字第1140919007號函審退(管制時間：11月28日)							
2. 「手術室裝修及設備-2」：麗明：麗字第0930002540號函提送 監造：譚余中榮字第1141003001號函審退(管制時間：12月5日)							
3. 「櫥櫃設備」：麗明：麗字第0916002436號函提送 監造：譚余中榮字第1140922001號函審退(申請展延至：115年3月30日)							
4. 「鍋爐設備(瓦斯)」：監造：譚余中榮字第1141105001號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141107015號審定 院方：核定中							
5. 「鍋爐設備(蒸氣)」：監造：譚余中榮字第1141105005號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141107016號審定 院方：核定中							
6. 「BI/BO 過濾網箱」：監造：譚余中榮字第1141105002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141107014號審定 院方：核定中							
7. 「智慧醫療系統設備」：專管：銘建(榮)字第1141023003號審定 院方：中榮工字第1140302654號函核定 本項解管							
8. 「化妝蓋板、仿石面溝蓋板」：專管：銘建(榮)字第1141106007號審定 院方：中榮工字第1149925295號函核定 本項解管							
9. 「風管材料」：專管：銘建(榮)字第1141106006號審定 院方：中榮工字第1149925289號函核定 本項解管							
10. 「不銹鋼防震接頭等」：監造：譚余中榮字第1141105007號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141107013號審定 院方：核定中							
11. 「中央監控系統設備」：監造：譚余中榮字第1141105003號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1141107012號審定 院方：核定中							
12. 「UPS不斷電系統設備」：監造：譚余中榮字第1141110001號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第11411014007號審定 院方：核定中							
13. 「外牆塗料」：監造：譚余中榮字第1141110002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第11411014009號審定 院方：核定中							
14. 「泵浦組」：(管制提送時間：12月30日)							
15. 「沉水式污水泵浦」：(管制提送時間：12月30日)							

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年12月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已 備 查	逾 期 送 審
			監 造 核 定 中	專 管 備 查 中	機 關 備 查 中		
施工圖	74	74	3	0	2	69	0

1. 「電梯(含電扶梯)施工圖」：專管：銘建(榮)字第1141027010號備查 院方：中榮工字第1149924705號函備查 本項解管
2. 「FRP水箱施工圖」：麗明：麗字第11103002785號函提送 監造：譚余中榮字第1141107004號函核定 專管：銘建(榮)字第1141114010號函備查 院方：備查中
3. 「12F機水電各系統施工圖」：監造：譚余中榮字第1141107005號函核定 專管：銘建(榮)字第1141114011號函備查 院方：備查中
4. 「13F機水電各系統施工圖」：麗明：麗字第1111002847號函提送 監造：譚余中榮字第1141117002號函審退(管制時間：12月1日)
5. 「2F樓(柱、牆、板)鋼筋施工圖」：麗明：麗字第1104002791號函提送 監造：譚余中榮字第1141107003號函審退(管制時間：11月21日)
6. 「3~5F樓(柱、牆、板)鋼筋施工圖」：麗明：麗字第1110002385號函提送 監造：譚余中榮字第1141113003號函審退(管制時間：11月27日)

請施工單位接續簡報~
謝謝

壹、本週及下週施工作業說明

本週(114年11月17日~114年11月23日)工程施工作業

1. 吊裝第八節鋼構梁柱及電焊、6F~9F鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
2. 4FL機電管路放樣及配管、鋼線網進料吊運。
3. 2F~3F鋼網牆施作及外牆施工架搭設。

下週(114年11月24日~114年11月30日)預定施工作業

1. 第八節鋼構梁電焊、塔吊升層施作、6F~9F鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
2. 4FL鋼線網鋪設、6FL~7FL鋼線網進料、6F~9F鋼承鈑鋪設及剪力釘施作。
3. 2F內外牆鋼網牆、單面模板施作及鋼筋綁紮。

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	114 / 11 ~ 114 / 11																								備註								
		預定進度			上週進度												本週進度										下週進度										
		實際進度																																			
		開始時間	完成時間		11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30												
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日												
一、地上層結構工程																																					
1	#8鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間																																		
		2025/10/23	2025/11/16	25																																	
		2025/10/25																																			
2	6F~9F鋼承板鋪設及剪力釘施作	開始時間	完成時間																																		
		2025/10/25	2025/11/24	31																																	
		2025/10/25																																			
3	2FL~5FL點焊鋼線網鋪設及混凝土澆置	開始時間	完成時間																																		
		2025/10/16	2025/11/15	31																																	
		2025/10/16	2025/11/15	31																																	
4	1F鋼網牆及鋼筋綁紮	開始時間	完成時間																																		
		2025/10/18	2025/11/15	29																																	
		2025/10/18	2025/11/14	28																																	
二、地下室裝修工程																																					
1	B2F~B1F輕隔間工程	開始時間	完成時間																																		
		2025/10/24	2025/11/30	38																																	
		2025/10/24																																			
2	B6F~B3F電力照明及插座拉線	開始時間	完成時間																																		
		2025/8/5	2025/11/12	100																																	
		2025/8/5	2025/11/12	100																																	
3	B6F~B3F複壁排水	開始時間	完成時間																																		
		2025/10/5	2025/11/14	41																																	
		2025/10/10	2025/11/14	36																																	
4	B2F~B1F複壁排水	開始時間	完成時間																																		
		2025/11/14	2025/11/29	16																																	
		2025/11/14																																			
5	B6F筏基排水吊管	開始時間	完成時間																																		
		2025/11/11	2025/12/7	27																																	
		2025/11/11																																			
6	B2F~B1F消防水主管配管 (消防栓、搬水、泡沫、採水)	開始時間	完成時間																																		
		2025/11/3	2026/1/30	89																																	
		2025/11/10																																			
7	B6F~B3F電信線槽吊子安裝	開始時間	完成時間																																		
		2025/10/20	2025/12/20	62																																	
		2025/10/21																																			
8	B6F電信線槽安裝	開始時間	完成時間																																		
		2025/11/10	2025/12/9	30																																	
		2025/11/10																																			

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

日 期		起 始 日	完 成 日	天 數	114 / 11 ~ 114 / 11																					備 註	
編 號	三週進度	預定進度			上週進度							本週進度							下週進度								
	綱圖時程				11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30		
	作業內容	實際進度			一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日		
9	B5F電信線槽安裝	開始時間 2025/11/14	完成時間 2025/12/4	21																							
		2025/11/14																									
10	B6F-B3F空調水系統配管	開始時間 2025/11/5	完成時間 2025/12/19	45																							
		2025/11/5																									
附註：																											

(2025.10-2025.12)三月施工進度表


臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

營造廠商:麗明營造股份有限公司

2025/10~2025/12鋼構、鋼承板、配管及澆置工程後續預定進度表

2025/10/29

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	一月	二月	三月						
							5/4	5/25	6/15	7/6	7/27	8/17	9/7	9/28	10/19	11/9	11/30	12/21	1/11	2/1	2/22	3/1	
1	■	鋼構工程	82 d	2025/9/25	2025/12/15								9/25										
2	■	鋼梯&雨披&修改&電焊	28 d	2025/10/15	2025/11/11																		
22	■	440	82 d	2025/9/25	2025/12/15								9/25										
23	■	# 7_8FL~9FL	43 d	2025/9/25	2025/11/6								9/25										
44	■	# 8_10FL~11FL	25 d	2025/10/29	2025/11/22										10/29								
45	■	#8 A區	7 d	2025/10/29	2025/11/4																		
46	■	校正及鎖斷	2 d	2025/11/5	2025/11/6	45																	
47	■	電銲	7 d	2025/11/7	2025/11/13	46																	
48	■	#8 B區	4 d	2025/11/5	2025/11/8	45																	
49	■	拆吊料口鋼梁8FL~9FL	1 d	2025/11/9	2025/11/9	48																	
50	■	6FL點銲鋼網及水電進料	1 d	2025/11/10	2025/11/10	49																	
51	■	7FL點銲鋼網及水電進料	1 d	2025/11/11	2025/11/11	50																	
52	■	回補8FL鋼梁及DECK	1 d	2025/11/12	2025/11/12	51																	
53	■	校正及鎖斷	2 d	2025/11/9	2025/11/10	48																	
54	■	電銲	3 d	2025/11/11	2025/11/13	53																	
55	■	爬升	4 d	2025/11/14	2025/11/17	47,52																	
56	■	DECK進料	1 d	2025/11/18	2025/11/18	55																	
57	■	8FL點銲鋼網及水電進料	1 d	2025/11/19	2025/11/19	56																	
58	■	回補9FL鋼梁及DECK	1 d	2025/11/20	2025/11/20	57																	
59	■	9FL點銲鋼網及水電進料	1 d	2025/11/21	2025/11/21	58																	
60	■	回補10FL鋼梁及DECK	1 d	2025/11/22	2025/11/22	59																	
61	■	# 9_12FL~13FL	15 d	2025/11/23	2025/12/7																		
73	■	# 10_R1FL~PRFL	8 d	2025/12/8	2025/12/15																		
80	■	600	59 d	2025/10/5	2025/12/2																		
81	■	5FL修改工程	3 d	2025/10/16	2025/10/18																		
82	■	# 7_8FL~9FL	27 d	2025/10/5	2025/10/31																		
94	■	# 8_10FL~11FL	17 d	2025/10/31	2025/11/16																		
95	■	#8 C區	6 d	2025/10/31	2025/11/5	93																	
96	■	校正及鎖斷	2 d	2025/11/6	2025/11/7	95																	
97	■	電銲	7 d	2025/11/8	2025/11/14	96																	
98	■	#8 D區	5 d	2025/11/6	2025/11/10	95																	
99	■	校正及鎖斷	2 d	2025/11/11	2025/11/12	98																	
100	■	電銲	4 d	2025/11/13	2025/11/16	99																	
101	■	爬升	4 d	2025/11/9	2025/11/12	96SS+3 d																	
102	■	DECK進料	1 d	2025/11/13	2025/11/13	101																	
103	■	# 9_12FL~13FL	14 d	2025/11/14	2025/11/27																		
111	■	# 10_R1FL~PRFL	10 d	2025/11/23	2025/12/2																		
116	■	鋼承板工程	67 d	2025/10/2	2025/12/7																		
117	■	2FL_DECK	6 d	2025/10/2	2025/10/7																		
118	■	3FL_DECK	5 d	2025/10/13	2025/10/17	120																	
119	■	4FL_DECK	7 d	2025/10/18	2025/10/24	118																	
120	■	5FL_DECK	5 d	2025/10/8	2025/10/12	117																	
121	■	5FL_DECK修改區(含開孔)	3 d	2025/10/26	2025/10/28	81,36																	
122	■	6FL_DECK	7 d	2025/10/25	2025/10/31	119																	

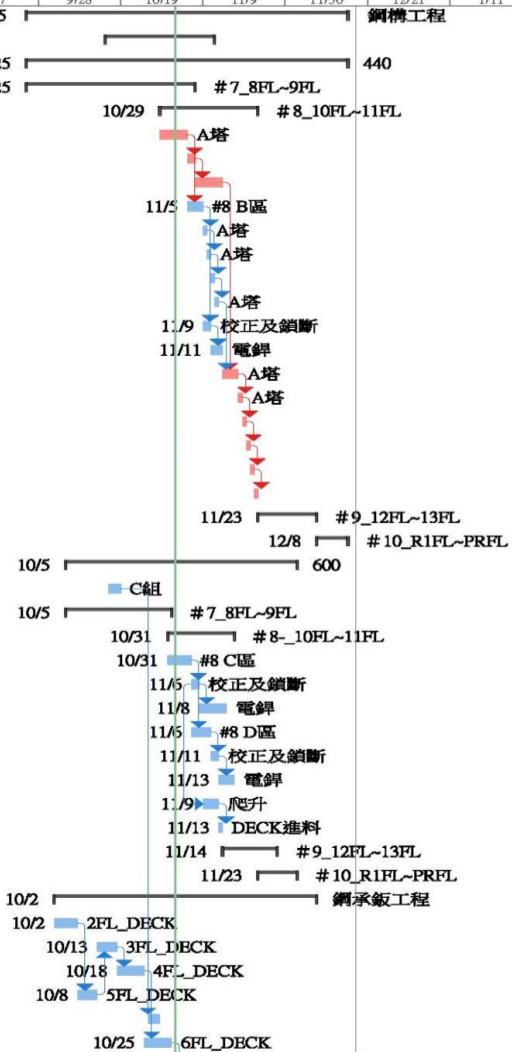

(2025.10-2025.12)三月施工進度表

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程																	2025/10/29
營造廠商:麗明營造股份有限公司			2025/10~2025/12鋼構、鋼承板、配管及澆置工程後續預定進度表														
識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	一月	二月	三月
123		7FL_DECK	7 d	2025/11/1	2025/11/7	122							11/1	7FL_DECK			
124		8FL_DECK	7 d	2025/10/30	2025/11/5								10/30	8FL_DECK			
127		9FL_DECK	4 d	2025/11/6	2025/11/9								11/6	9FL_DECK			
130		10FL_DECK	7 d	2025/11/19	2025/11/25								11/19	10FL_DECK			
133		11FL_DECK	8 d	2025/11/22	2025/11/29								11/22	11FL_DECK			
136		12FL_DECK	8 d	2025/11/23	2025/11/30								11/23	12FL_DECK			
139		13FL_DECK	9 d	2025/11/26	2025/12/4								11/26	13FL_DECK			
142		RFL_DECK	5 d	2025/12/3	2025/12/7	115							12/3	RFL_DECK			
143		剪力釘	67 d	2025/10/8	2025/12/13								10/8	剪力釘			
196		點焊鋼網鋪設	48 d	2025/10/31	2025/12/17												
197		2FL_wire mesh	1 d	2025/10/31	2025/10/31												
198		3FL_wire mesh	2 d	2025/11/11	2025/11/12												
199		4FL_wire mesh	2 d	2025/11/13	2025/11/14	198											
200		5FL_wire mesh	2 d	2025/11/1	2025/11/2	197											
201		6FL_wire mesh	2 d	2025/11/15	2025/11/16	199											
202		7FL_wire mesh	2 d	2025/11/17	2025/11/18	201											
203		8FL_wire mesh	2 d	2025/11/20	2025/11/21												
206		9FL_wire mesh	2 d	2025/11/22	2025/11/23												
209		10FL_wire mesh	2 d	2025/12/3	2025/12/4												
212		11FL_wire mesh	2 d	2025/12/5	2025/12/6												
215		12FL_wire mesh	2 d	2025/12/13	2025/12/14												
218		13FL_wire mesh	1 d	2025/12/15	2025/12/15												
221		RFL_wire mesh	1 d	2025/12/14	2025/12/14	195											
222		混凝土澆置(含標高、遮斷、開孔、預留筋)	43 d	2025/11/5	2025/12/17								11/5	混凝土澆置(含標高、遮斷、開孔、預留筋)			
223		2FL_RC	2 d	2025/11/11	2025/11/12	226FS+5 d							11/11	2FL_RC			
224		3FL_RC	1 d	2025/11/13	2025/11/13	223							11/13	3FL_RC			
225		4FL_RC	2 d	2025/11/15	2025/11/16	199							11/15	4FL_RC			
226		5FL_RC	1 d	2025/11/5	2025/11/5	200FS+2 d							11/5	5FL_RC			
227		6FL_RC	2 d	2025/11/17	2025/11/18	201							11/17	6FL_RC			
228		7FL_RC	2 d	2025/11/19	2025/11/20	202							11/19	7FL_RC			
229		8FL_RC	3 d	2025/11/21	2025/11/23								11/21	8FL_RC			
232		9FL_RC	3 d	2025/11/23	2025/11/25								11/23	9FL_RC			
235		10FL_RC	3 d	2025/12/4	2025/12/6								12/4	10FL_RC			
238		11FL_RC	3 d	2025/12/6	2025/12/8								12/6	11FL_RC			
241		12FL_RC	3 d	2025/12/14	2025/12/16								12/14	12FL_RC			
244		13FL_RC	2 d	2025/12/16	2025/12/17								12/16	13FL_RC			
247		RFLRC	2 d	2025/12/15	2025/12/16	221							12/15	RFLRC			

第 2 頁

參、上週工程施工照片



說明：工地空拍照。



說明：鋼構吊裝。



說明：3FL混凝土澆置及粉光作業。



說明：3FL樓版養護。

參、上週工程施工照片



說明：鋼承板鋪設。



說明：鋼線網鋪設。



說明：預埋套管施作。



說明：預埋管路設置。

簡報結束，謝謝

專管單位-計畫主持人請假單

請 假 單

賴銘昌建築師事務所計畫主持人賴銘昌先生，於114年11月18日因本所承攬之連江縣立中正國民中小學國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程案辦理工程施工查核，故無法出席臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程114年11月份工程月會暨第255次專業技術協調會議，特向 貴院請假，尚請諒察。

此致

臺中榮民總醫院

公 司：賴銘昌建築師事務所

負責人：賴銘昌

地 址：臺中市西區忠明南路270號15F之2



中 華 民 國 一 一 四 年 十 一 月 十 七 日

連江縣立中正國民中小學 函

地址：209005連江縣南竿鄉馬祖村4號
承辦人：事務組長 朱國樑
電話：083622196-302
傳真：083625670
電子信箱：jk85218521@hotmail.com

受文者：賴銘昌建築師事務所

發文日期：中華民國114年11月3日
發文字號：正總字第1140004683號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：來文

主旨：函轉連江縣政府工程施工查核小組訂於114年11月18日下午2時查核「連江縣立中正國民中小學國中部綜合教學樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程」品質及進度等事宜，請相關單位備妥相關資料，以利查核，請查照。

說明：

- 一、依據連江縣政府114年10月30日府工程字第1140052635號函辦理。
- 二、請統包廠商及專案管理單位依縣府函示內容，備妥相關文件及資料，並確實安排人員於查核時會同。

正本：駿富營造有限公司

副本：賴銘昌建築師事務所、本校事務組

