

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

8月月會暨第243次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：114年8月19日(星期二) 下午04時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：陳秋屏、江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至114年8月17日止，使用工期：946日曆天(不含免計工期12天)，剩餘929日曆天(展延工期25天)。
- 工程進度截至114年8月17日，預定進度13.090%，實際進度23.373%，超前進度：10.283%(約超前197天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
下構結構體工程	115/04/13			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 結構體工程：：鋼構吊裝及電焊、鋼構材料進場、B2F line:1-4, A-D 牆面打底粉刷、B3F line:1-10, H 牆面打底粉刷。
 2. 機電工程：B3F、B2F 照明及插座拉線作業、B6F 筏基套管清潔。
 3. 安全監測：數據無異常。

【公共藝術設置計畫】

1. 專管單位就本案公共藝術設置經費編列期程、填寫預繳說明表及檢附案件決標公告(紀錄)、契約經費表等資料於112/03/10發文予院方，院方於112/03/22發文向文化部申請預繳展期；文化部於112/03/28函復同意本案公共藝術經費得展延至民國115年12月31日前繳納。
2. 依113/09/26第七次臺中市政府公共藝術審議委員會決議，本案未通過。目前進度：第五次執行小組會議已於113/11/14(四)召開，專管單位將依會議決議修正後再行提請

院方召開執行小組會議供委員審查。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為吊裝南、北側第六節鋼構梁柱及鋼樓梯及地下室 B2、B3 泥作施工、地下室車道天花板批土油漆，工程進度超前中。
2. 其他：
 - (1) 建照變更：
 - A. 設計單位已初步規劃本案建照變更期程表(詳後簡報 P.11-P.12)，經說明，本案後續將拆分為兩次程序，第三次建照變更以全院區樓地板面積確認為主，第四次建照變更則針對本案內容辦理，第四次建照變更預計於 115/07/31 前完成建照變更取得。
 - B. 經主席裁示，考量院方規劃目標為 115/07/01 開放六樓以下部分使用，請設計單位儘量提早取得時程以利工進。
 - (2) 第三次變更設計圖說：經施工單位說明，考量現場施作進度及院方部分使用之目標，需請設計單位儘速提供相關圖說以利施工單位進行圖說檢討及繪製施工圖；經主席裁示，本案雖第二次變更程序尚未完成，惟為使本案目標順利推進，同意先行提送最新修正之圖說供審查核定施作，請各單位配合程序並於 114/12/31 前完成本案六樓以下之完整施工圖核定。
 - (3) 一般氣送系統：
 - A. 本次會議決議將本案 B1F X 光護理站點取消，並修正第 242 次專技會議紀錄，病檢部備援路線為第一醫療大樓 B1F 至第三醫療大樓 2F~4F 心導管室/開刀房。
 - B. 經主席裁示，請設計單位及施工單位儘速完成圖說套繪，以確認管線路徑，且氣送系統於第二次變更設計程序先不變更，維持原契約項目，俟本院變更需求確認後納入第三次變更設計辦理。
 - (4) 溫溼度監控系統：護理部於第 239 次專技會議時提供本案大樓需裝設溫濕度、噪音等監控功能之空間，經本次會議主席裁示，請設計單位與使用單位盤點並請長官簽認，於 114/08/27 前完成。
 - (5) 護理站透視圖：設計單位於本次會議提供新增電子白板之護理站透視圖(詳後簡報 P.13-P.15)，經主席裁示，請將 6F 至 10F 護理站之 65 吋電子白板位置適度上移，並將轉角處之圓弧調整得更為圓潤；另請設計單位將護理站出風口形式調整為圓形

風管樣式(外框架為正方形)。

(6) 電梯：經彙整，本案電梯修正之處如後簡報 P.8 之內容，惟第三次變更圖說尚未核定，考量施工單位備料時程，經主席裁示，同意施工單位先行以最新修正之樣式/規格送審，惟電梯內部細節(如彩繪樣式)等選色選樣請先行提報予院部長官裁示；另經工務室(修護保養組)提醒，本案電梯需具備智能電梯功能。

(7) B2F 空間變更：經第 237 次專技會議確認 B2F 原規劃之病檢部辦公室空間調整為毒物科及感管中心使用(剩餘面積 267m^2)，經主席裁示，後續配合實地會勘，依各搬遷單位實際需求規模，再行研議本案 B2F 剩餘空間之分配。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核。

伍、散會(上午 10 時 00 分)

陸、會議照片










臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
114年8月份工程月會報暨第243次專業技術協調會
會議簽到表

壹、會議時間：114年8月19日(星期二) 下午4時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李副院長 政鴻

肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院			
副院長			
主任秘書			
醫企部		醫工部	
護理部			
工務室			
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司			
   			
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所			
  			
施工廠商-麗明營造股份有限公司			
  			

請 假 單

賴銘昌建築師事務所計畫主持人賴銘昌先生，於114年8月19日因家庭因素休假在美國，故無法出席臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程114年8月份工程月會暨第243次專業技術協調會議，特向 貴院請假，尚請諒察。

此致

臺中榮民總醫院

公 司：賴銘昌建築師事務所

負責人：賴銘昌

地 址：臺中市西區忠明南路270號15F之2



中 華 民 國 一 一 四 年 八 月 十 九 日

第三醫療大樓新建工程

114年8月月會暨第243次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明

工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.08	目標第一階段開放	115年7月31日
		目標整體完工日期	116年3月19日
使用工期 (截至114.08.17止)	946日曆天(不含免計工期12天)，剩餘 <u>929</u> 日曆天(展延工期25天)		
工程進度 (截至114.08.17止)	預計：13.090% 實際：23.373%	進度差	+10.283% (約超前197天)
目前工程施作項目	① 結構體工程：鋼構吊裝及電焊、鋼構材料進場、B2F line:1-4,A-D牆面打底粉刷、B3F line:1-10,H牆面打底粉刷 ② 機電工程：B3F、B2F照明及插座拉線作業、B6F筏基套管清潔 ③ 安全監測：數據無異常		



本案三週進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	114 / 8 ~ 114 / 8																					備註
		預定進度 	實際進度 		上週進度							本週進度							下週進度							
					8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
一、地上層鋼構工程	開始時間	完成時間	249																							
	114/3/27	114/11/30																								
1 東側#4、#5鋼構梁柱吊裝	開始時間	完成時間	49																						8/10已完成。	
	114/6/24	114/8/11																								
	114/7/5	114/8/10																								
2 南側#6鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間	43																							
	114/7/25	114/9/5																								
	114/7/26																									
3 北側#6鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間	39																							
	114/8/18	114/9/25																								
	114/8/6																									
4 南側#7鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間	34																							
	114/8/17	114/9/19																								
5 北側#7鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間	37																							
	114/9/12	114/10/18																								
二、地下室裝修工程	開始時間	完成時間	168																							
	114/7/16	114/12/30																								
1 B3F~B6F牆面泥作粉刷批土油漆、天花板平頂批土油漆	開始時間	完成時間	63																							
	114/7/5	114/9/5																								
	114/7/5																									
2 B2F~B1F牆面泥作粉刷批土油漆、天花板平頂批土油漆	開始時間	完成時間	62																							
	114/8/5	114/10/5																								
	114/8/5																									
附註：																										

進度追蹤

事項	辦況說明
建照變更	1. 為避免工程進度延宕，請設計單位及施工單位就現場進度考量，提供建照變更期程表。 2. 設計單位已初步規劃期程。
部分空間先行開放	1. 經與都發局詢問後，需先依《建築物部分使用執照核發辦法》第三條第一項第三點：「高度超過三十六公尺或十二層樓以上，或建築面積超過八〇〇〇平方公尺以上之建築物，其中任一樓層至基地地面間各層業經施工完竣。」檢討本案狀況。 2. 院方已於114/03/04發文請示中央機關(內政部國土署)解釋法律定義。 3. 依都發局於114/03/13之公文說明，本案涉及個案事實認定，仍須請建築師依規檢討辦理。 4. 依第221次專技會議，本案將於完成建照變更後依規申請B6F至1F各樓層經施工完竣之部分使用執照。
氣送系統	1. 依第242次專技會議，施工單位已繪製新增路徑之完整路線圖，並於院部晨會提報。 2. 目前辦況：待廠商報價。
第三次變更設計圖說	1. 依第241次專技會議紀錄，請設計單位儘速提送第三次變更設計圖說供院方核定，以利施工單位按圖施作。 2. 目前辦況：設計單位於114/08/11提送B3F-12F建築平面圖說及使用單位簽認資料，專管單位於114/08/14轉呈至院方。
溫溼度監控系統	1. 依第239次專技會議，需請護理部重新盤點各空間所需功能。
護理站3D透視圖	1. 經檢討，原設計規劃較不符合後續使用需求，經設計單位與使用單位確認需求後重新調整。 2. 設計單位已重新繪製3D透視圖，請詳後簡報。

職安衛安全管理

職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	請施工團隊落實要求塔吊操作人員於攀爬上塔吊作業時應確實使用安全帶及安全帽，避免因重心失穩墜落造成重大職業災害。
4	工地在進行電氣設備安裝、銜接或維修作業時，必須先將總電源關閉，才能確保施工人員的作業安全；另(地下室)工區內之臨時接電箱及延長線等，應架高設置，避免地面積水衍生感電危害。

議題追蹤-院部會議紀錄

教學大樓旁

教學大樓旁綠化區便道請
採用柏油路面，搭配活動
柵欄管制車輛進出。

※經確認，將延至8/21(四)
始得開放通行。

氣送系統

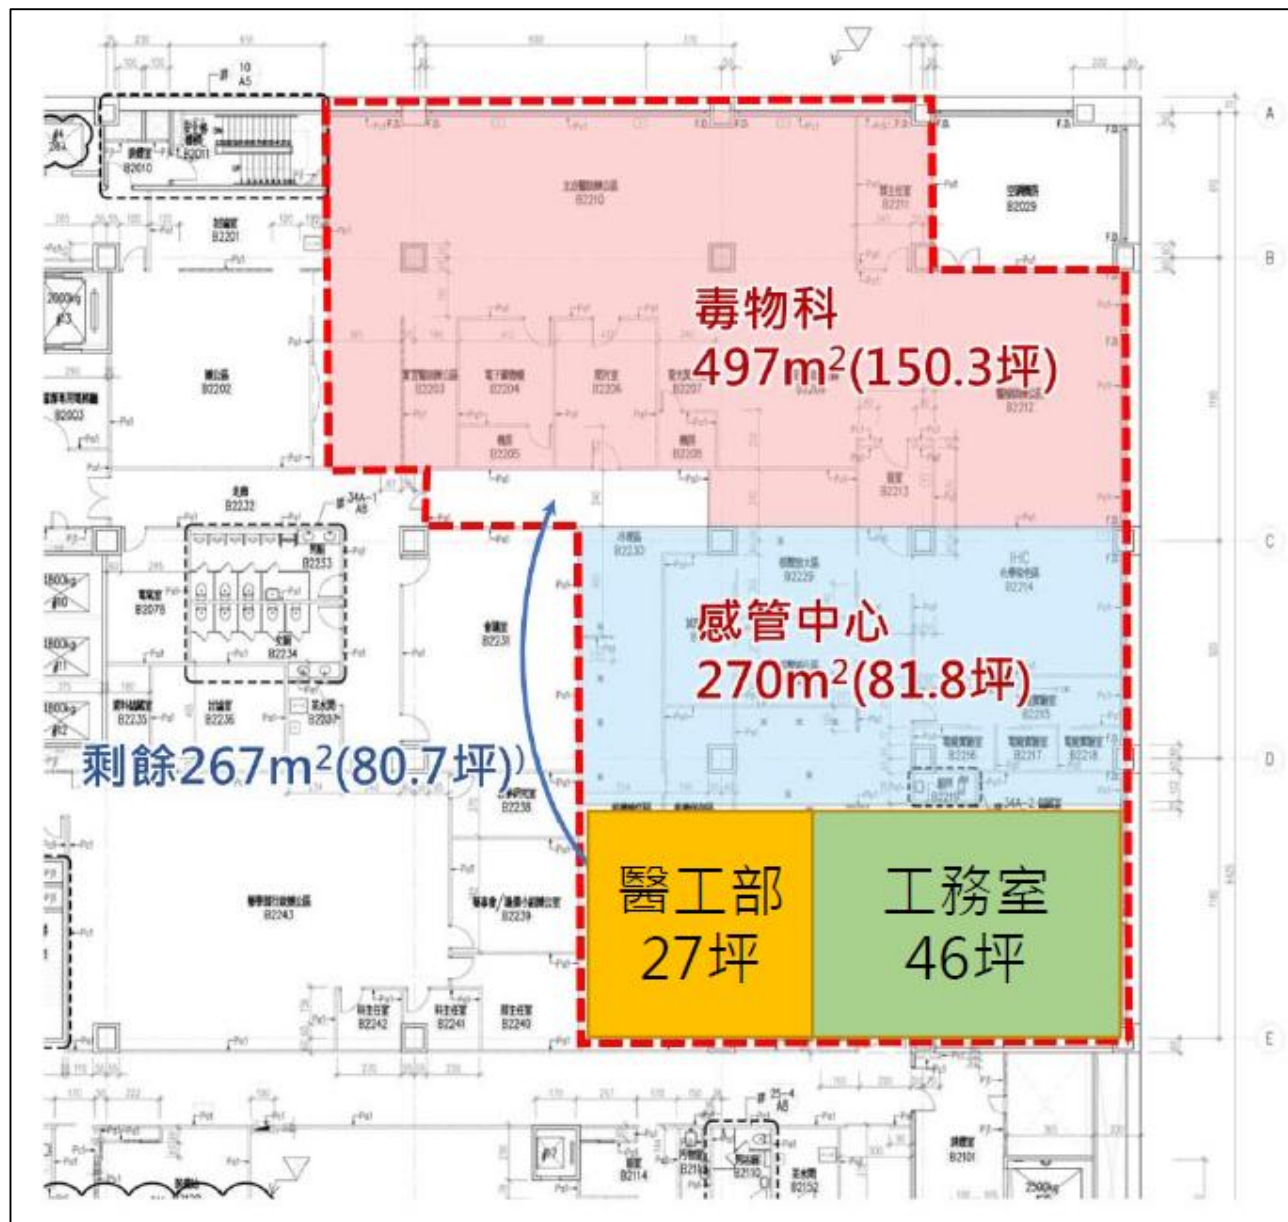
同意氣送系統規劃，並
設計備援機制。

總裁套房

請評估總裁套房動線，
並取消護理站直通門，
以確保進出安全性。

議題請示-B2F空間變更

經第237次專技會議確認B2F
原規劃之病檢部辦公室空間調
整為毒物科及感管中心使用 (
剩餘面積267m²) 。
請示主席是否得依右圖方案進
行後續細部規劃事宜。



議題請示-電梯變更彙整

- 經彙整，本案電梯修正之處如下，惟第三次變更圖說尚未核定(內容與二變差異甚大)，考量施工單位備料時程，請示是否得依最新修正資料為準。

項目	決議事項	備註
材質	① 客用電梯外門扇及幕板材質為不銹鋼毛絲面，內部為不銹鋼鏡面及不銹鋼毛絲面、地坪採用PVC材質 ② #5-#6(停車場)、#7-#12(病床)外門扇-不銹鋼毛絲面 / 內部-不銹鋼鏡面及不銹鋼毛絲面 ③ 其餘編號電梯按圖施作	• 第238次、240次、241次專技會議紀錄
其餘設置	① 機器人電梯：編號#16、#17、#19、#20 ② 考量機器人(含貨架)重量共390公斤且電梯下沉幅度不得超過2公分，故將#16、#17電梯操作面板改至側面、用途改為客貨梯、鋼纜線變更及門片需變更為3片式或4片式以符合車廂寬度擴增為100公分、車廂深度至少115公分之需求 ③ 殘障電梯乘場面板請做嵌入式 ④ 3D ToF距離感測器取消、車廂內紫外線殺菌燈改為簡易型殺菌燈 ⑤ 機房內無須額外增設地震感知器 ⑥ 中央監控(車控)需求為單接點，原則預留至機房，俟後續AI廠商連結至中央監控至辦理 ⑦ 機器人行經處門扇改為自動門(訊號設定為後續設備廠商自行設置)、護理部之協作型機器人得不設置自動感應門；另B1F、1F機器人路線取消	• 114/06/02協調會議 • 第232次、234次、237次、238次專技會議紀錄

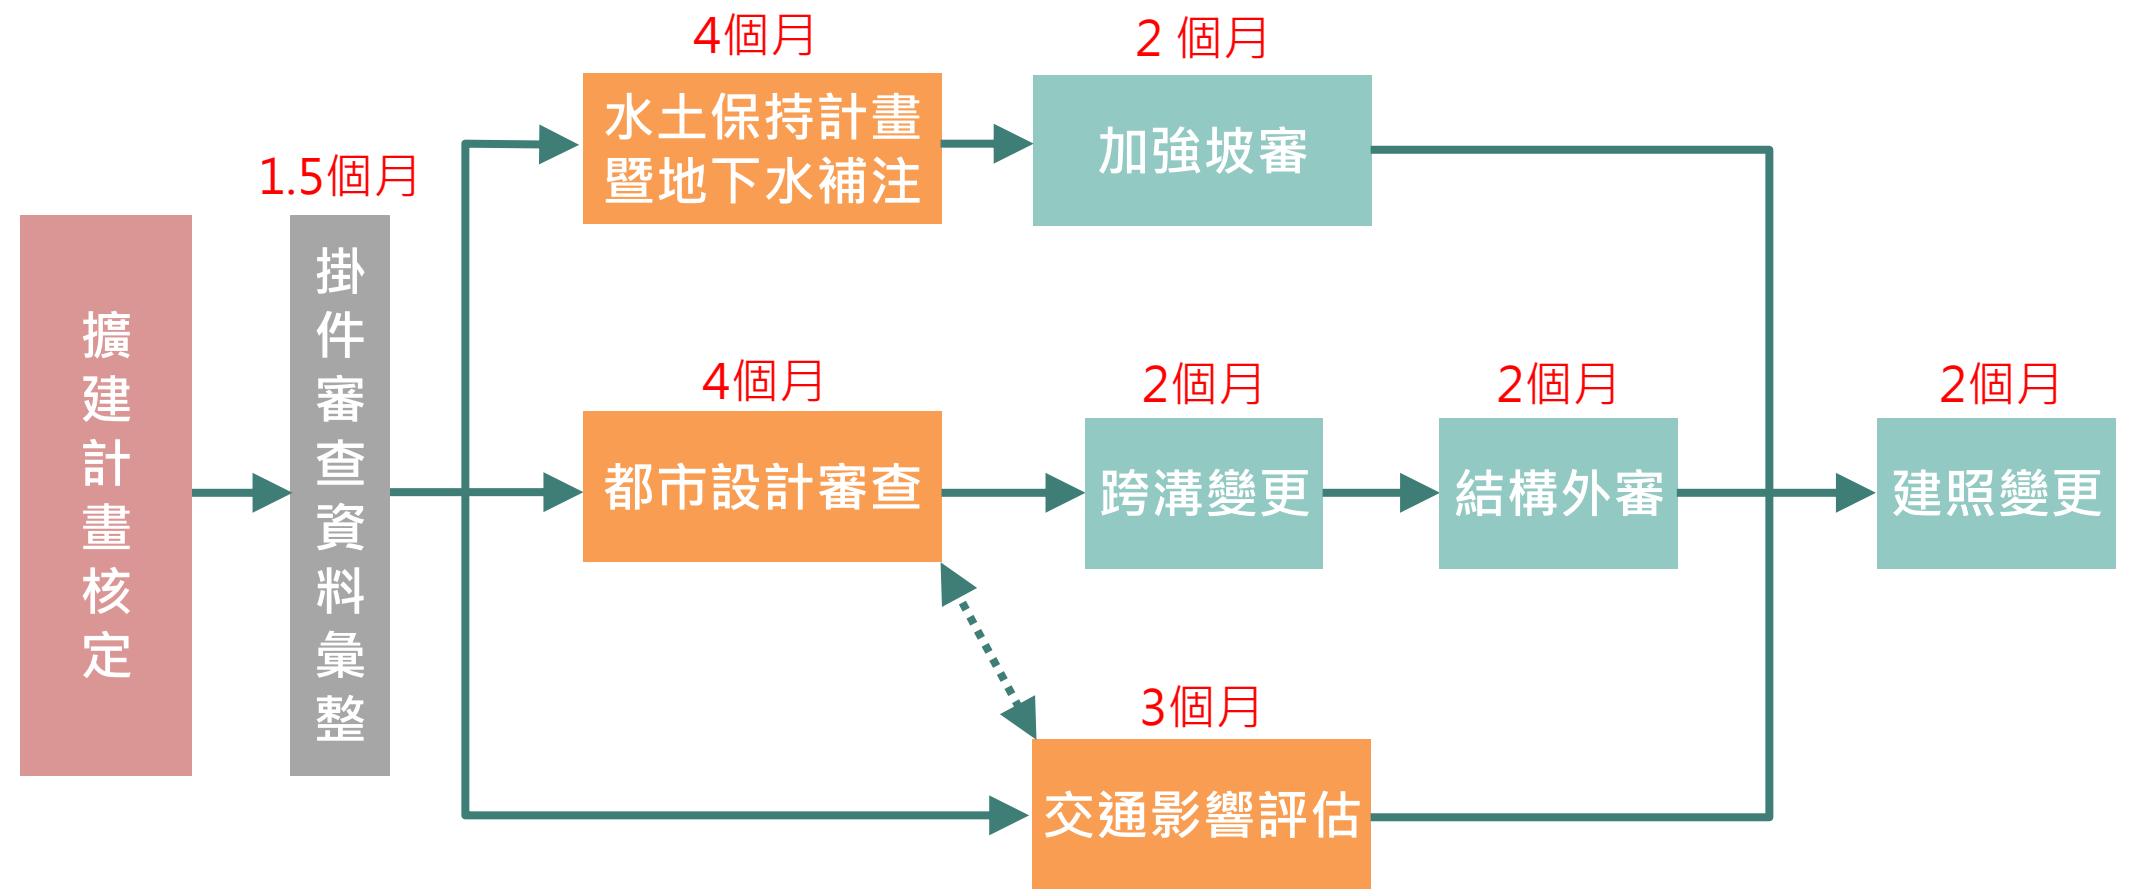
請設計監造單位接續簡報~
謝謝

第三醫療大樓變更建照流程

護理站透視圖

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形


第三醫療大樓變更建照流程



建照變更完成預估至少8個月

過程中如有變更，則審查程序亦須延長，相關時程以實際為主

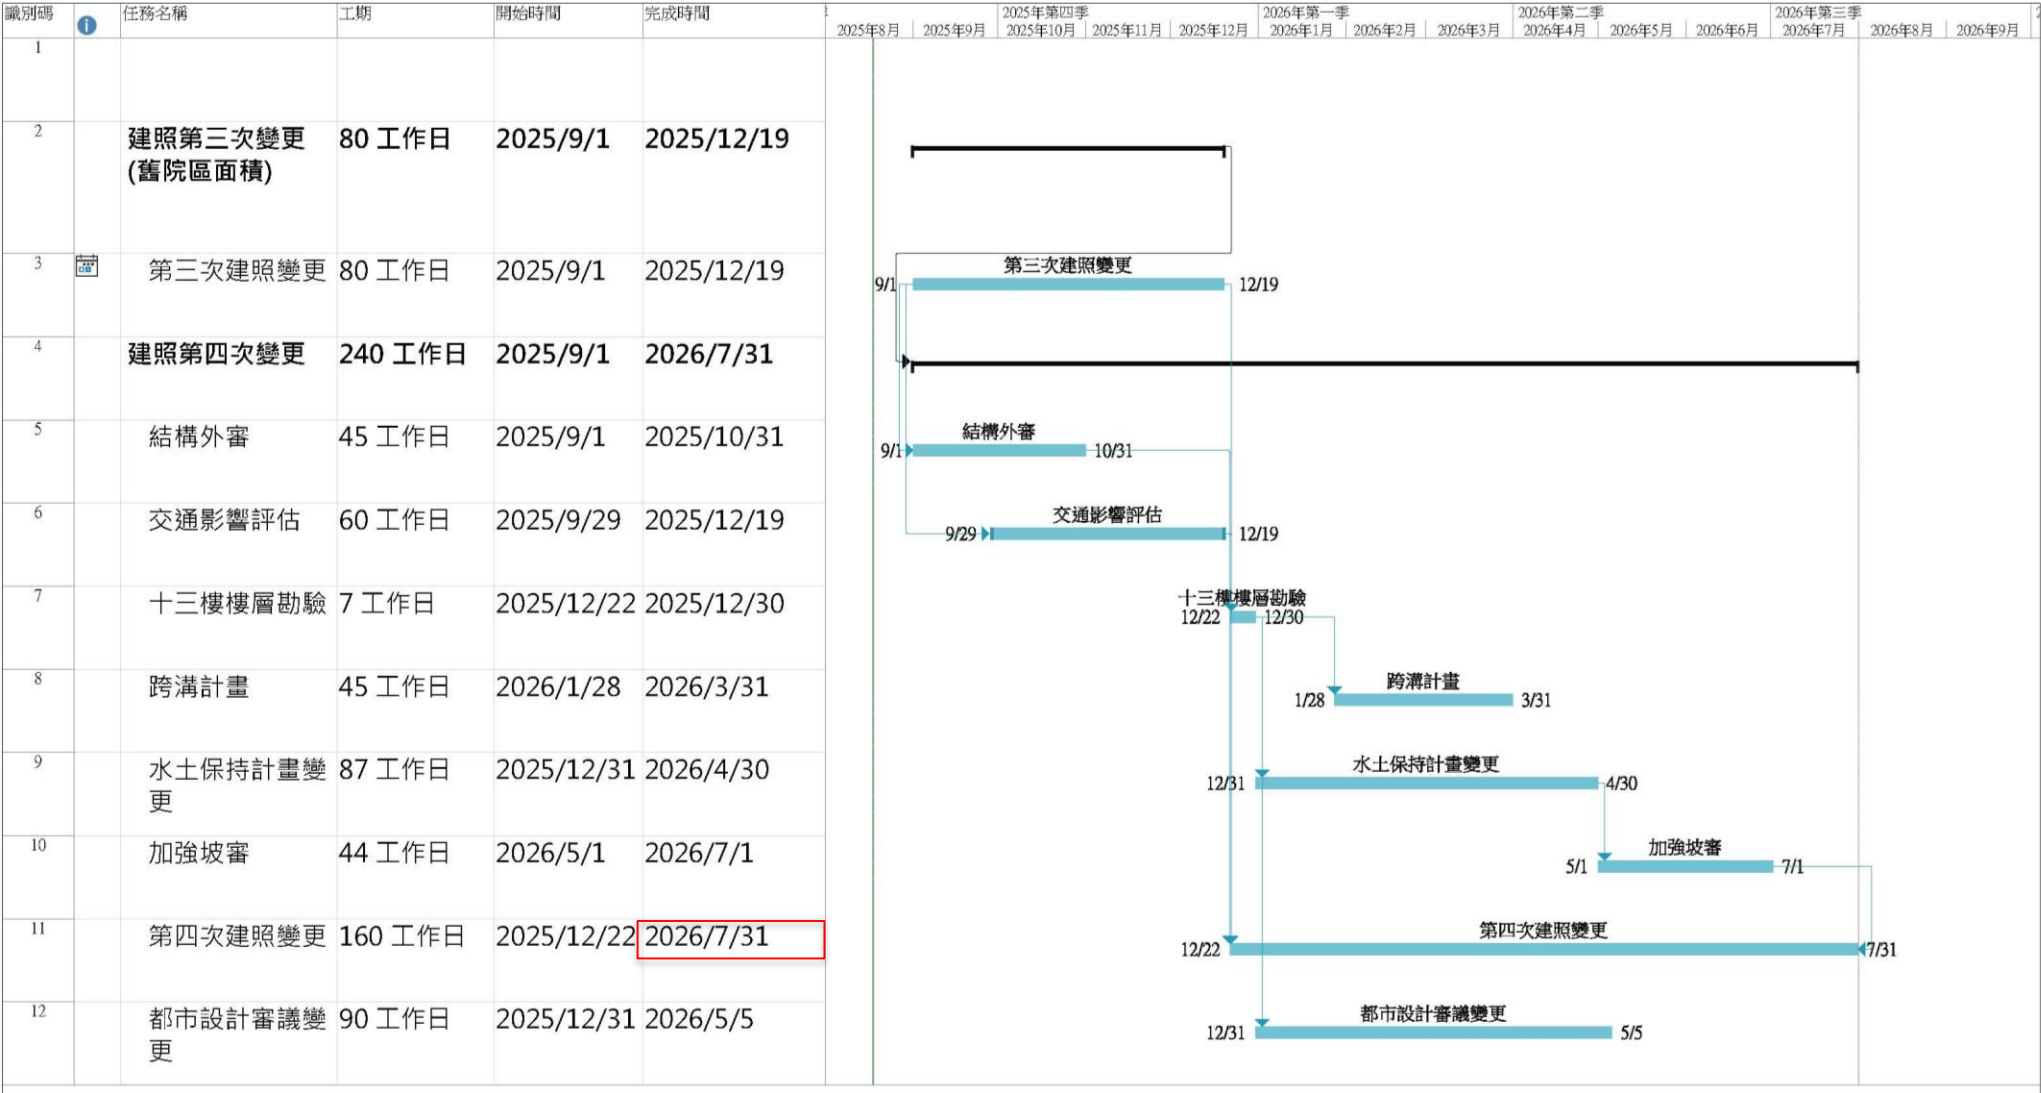第三醫療大樓變更建照流程



6F~10F護理站

工程內項目：護理站櫃檯、護理站櫥櫃

護理站電子白板原設計55吋，依照使用單位需求調整為65吋
取消護理站吊櫃。

護理站
櫃檯



明架矽酸
鈣天花板

漆乳膠漆

防撞扶手
防撞壁板

聚氯乙
烯同質
捲狀地
磚

6F~10F護理站

工程內項目：護理站櫃檯、護理站櫥櫃

護理站電子白板原設計55吋，依照使用單位需求調整為65吋
取消護理站吊櫃。

護理站
櫃檯



明架矽酸
鈣天花板

漆乳膠漆

防撞扶手

防撞壁板

聚氯乙烯
同質捲狀
地磚

11F~12F護理站

工程內項目：護理站櫃檯、護理站櫥櫃

護理站電子白板原設計55吋，依照使用單位需求調整為65吋
取消吊櫃並調整水槽位置至靠牆側。

護理站
櫥櫃
護理站
櫃檯



明架矽酸
鈣天花板

實木化妝
複合板

漆乳膠漆

防撞扶手
防撞壁板

聚氯乙
烯同質
捲狀
地磚

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年9月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 審 查 中	專管 核 定 中	機關 備 查 中		
分項施工計畫	100	96	6	4	6	80	0
1. 「外牆磁磚工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140811002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140814003號函核定 院方：備查中 2. 「鋁包版及鋁格柵工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0808002093號函提送 監造：銘建(榮)字第1140814005號函核定 院方：備查中 3. 「鋁門及鋁窗工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140804006號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140813003號函核定 院方：備查中 4. 「電梯(含電扶梯)工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0724001918號函提送 監造：譚余中榮字第1140728002號函審退(管制時間：8月25日) 5. 「業務廣播系統設備工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140811004號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140814004號函核定 院方：備查中 6. 「會議系統設備工程分項施工計畫」：監造：譚余中榮字第1140811005號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140814006號函核定 院方：備查中 7. 「電話交換機系統設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0808002079號函提送 監造：譚余中榮字第1140813006號函審退(管制時間：8月27日) 8. 「共同電視系統設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0808002078號函提送 監造：譚余中榮字第1140813005號函審退(管制時間：8月27日) 9. 「電話配管線設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0808002080號函提送 監造：譚余中榮字第1140814001號函審查合宜 專管：核定中 10. 「施工架施工計畫(上部結構室內外架及高度5公尺以上室內架)」：監造：譚余中榮字第1140806005號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140808011號函核定 院方：備查中 11. 「鋁帷幕工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0806002061號函提送 監造：譚余中榮字第1140811003號函審退(管制時間：8月25日) 12. 「污被服垂直收集系統工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0808002087號函提送 監造：譚余中榮字第1140814005號函審退(管制時間：8月28日) 13. 「輕隔間工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0813002121號函提送 監造：譚余中榮字第1140815004號函審查合宜 專管：核定中 14. 「庫板牆工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0813002120號函提送 監造：譚余中榮字第1140815003號函審查合宜 專管：核定中 15. 「對講保全系統設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0811002101號函提送 監造：譚余中榮字第1140815001號函審退(管制時間：8月29日) 16. 「避難梯設備工程分項施工計畫」：麗明：麗字第0814002147號函提送 監造：譚余中榮字第1140818001號函審查合宜 專管：核定中 17. 「資通訊系統設備工程分項施工計畫」(管制提送時間：114年9月1日) 18. 「無線AP設備工程分項施工計畫」(管制提送時間：114年9月1日) 19. 「緊急求救影音對講系統分項施工計畫」(管制提送時間：114年9月22日) 20. 「門禁管制系統設備工程分項施工計畫」(管制提送時間：114年9月22日)							

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年9月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已核定	逾期送審
			監造 審 查 中	專管 審 定 中	機 關 核 定 中		
材料/設備送審	109	101	5	3	6	87	0
1. 「塑膠(木蕊)踢腳板」：監造：譚余中榮字第1140807003號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140811008號函審定 院方：核定中							
2. 「鋁帷幕」：麗明：麗字第0812002118號函提送 監造：譚余中榮字第1140814002號函審查合宜 專管：審定中							
3. 「纖維水泥板隔間牆」：監造：譚余中榮字第11407184005號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140806006號函審定 院方：中榮工字第1149920795號函核定 本項解管							
4. 「防火遮煙捲簾」：麗明：麗字第0723001904號函提送 監造：譚余中榮字第1140729002號函審退(管制時間：8月25日)							
5. 「車道防水閘門」：麗明：麗字第0728001945號函提送 監造：譚余中榮字第1140804003號函審退(管制時間：8月25日)							
6. 「手術室裝修及設備-1」：麗明：麗字第0708001741號函提送 監造：譚余中榮字第1140718002號函審退(管制時間：9月15日)							
7. 「手術室裝修及設備-2」：麗明：麗字第0811002099號函提送 監造：審查中							
8. 「阻熱兼遮煙型防火捲門等」：麗明：麗字第0716001843號函提送 監造：譚余中榮字第1140721002號函審退(管制時間：8月25日)							
9. 「鉛屏蔽隔牆及鉛板」：麗明：麗字第0806002063號函提送 監造：譚余中榮字第1140807003號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140811009號函審定 院方：核定中							
10. 「NOVEC氣體自動滅火設備」：(管制提送時間：8月30日)							
11. 「木紋美耐板」：監造：譚余中榮字第1140807002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140811007號函審定 院方：核定中							
12. 「資通訊系統設備工程、無線AP設備工程」：監造：譚余中榮字第1140808001號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140814011號函審定 院方：核定中							
13. 「污被服垂直收集系統」：監造：譚余中榮字第1140808002號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140814010號函審定 院方：核定中							
14. 「一級實木化妝複合板」：監造：譚余中榮字第114080800號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1140813008號函審定 院方：核定中							
15. 「防爆門」：麗明：麗字第0813002122號函提送 監造：譚余中榮字第1140814003號函審查合宜 專管：審定中							
16. 「弱電電線材料」：麗明：麗字第0811002100號函提送 監造：譚余中榮字第1140813004號函審查合宜 專管：審定中							
17. 「牆面防火吸音材」：(管制提送時間：9月1日)							
18. 「防焰壁布」：(管制提送時間：9月15日)							
19. 「共同電視系統設備工程、電話配管線系統工程」：(管制提送時間：9月29日)							
20. 「變風量終端箱」：(管制提送時間：9月15日)							
21. 「定風量終端箱」：(管制提送時間：9月15日)							
22. 「變風量風閥」：(管制提送時間：9月15日)							
23. 「定風量風閥」：(管制提送時間：9月15日)							

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至114年9月30日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 核定中	專管 備查中	機關 備查中		
施工圖	63	62	1	2	4	55	0
1. 「8F機水電各系統」：專管：銘建(榮)字第1140808014號備查 院方：中榮工字第11409920960號同意備查 本項解管							
2. 「9F機水電各系統」：麗明：麗字第0804002005號函提送 監造：譚余中榮字第1140808008號函審退(管制時間：8月22日)							
3. 「開關箱設備配電盤承認圖」：監造：譚余中榮字第1140808005號核定 專管：銘建(榮)字第1140814008號備查 院方：備查中							
4. 「變電站設備配電盤承認圖」：監造：譚余中榮字第1140808004號核定 專管：銘建(榮)字第1140814009號備查 院方：備查中							
5. 「電梯(含電扶梯)施工圖」：麗明：麗字第0814002148號函提送 監造：譚余中榮字第1140818002號函核定 專管：備查中							
6. 「8-9F鋼承鈑施工圖」：專管：銘建(榮)字第1140806004號備查 院方：中榮工字第11409920800號同意備查 本項解管							
7. 「1F柱牆暨外擴區鋼筋施工圖」：專管：銘建(榮)字第1140806003號備查 院方：中榮工字第11409920797號同意備查 本項解管							
8. 「2F~R2F焊接鋼線網施工圖」：監造：譚余中榮字第1140806004號核定 專管：銘建(榮)字第1140808013號備查 院方：備查中							
9. 「10F機水電各系統施工圖」：(管制提送時間：9月29日)							
10. 「1F~RF塑膠地坪施工圖」：麗明：麗字第0808002081號函提送 監造：譚余中榮字第1140812002號核定 專管：銘建(榮)字第1140814002號備查 院方：備查中							
11. 「1F~RF金屬防火門自動(鉛板)門固定窗施工圖」：麗明：麗字第0813002199號函提送 監造：譚余中榮字第1140815002號函核定 專管：備查中							

請施工單位接續簡報~
謝謝

壹、本週及下週施工作業說明

本週(114年8月18日~114年8月24日)工程施工作業

1. 吊裝南、北側第六節鋼構梁柱及鋼樓梯。
2. 地下室B2、B3泥作施工、地下室車道天花板批土油漆。

下週(114年8月25日~114年8月31日)預定施工作業

1. 吊裝南、北側第六節鋼構梁柱及鋼樓梯。
2. 地下室B2、B3泥作施工、地下室車道天花板批土油漆。

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程 三週進度表

編號	日期 三週進度 網圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	114 / 8 ~ 114 / 8																					備註
		預定進度			上週進度							本週進度							下週進度							
					8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
一、地上層鋼構工程	實際進度																									
	開始時間	完成時間																								
	114/3/27	114/11/30	249																							
1東側#4、#5鋼構梁柱吊裝	開始時間	完成時間																								
	114/6/24	114/8/11	49																							
	114/7/5	114/8/10	37																							
2南側#6鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間																								
	114/7/25	114/9/5	43																							
	114/7/26																									
3北側#6鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間																								
	114/8/18	114/9/25	39																							
	114/8/6																									
4南側#7鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間																								
	114/8/17	114/9/19	34																							
5北側#7鋼構梁柱吊裝及電焊	開始時間	完成時間																								
	114/9/12	114/10/18	37																							
二、地下室裝修工程	開始時間	完成時間																								
	114/7/16	114/12/30	168																							
1B3F~B6F牆面泥作粉刷批土油漆、天花板平頂批土油漆	開始時間	完成時間																								
	114/7/5	114/9/5	63																							
	114/7/5																									
2B2F~B1F牆面泥作粉刷批土油漆、天花板平頂批土油漆	開始時間	完成時間																								
	114/8/5	114/10/5	62																							
	114/8/5																									
附註：																										

(2025.08-2025.10)三月施工進度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

**臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程
(2025/08~2025/10)工期整體預定進度表**

2025/07/27

識別碼	任務名稱	任務模式	工期	開始時間	完成時間	前置任務
1	結構體工期		1007 d	2024/1/15	2026/10/29	
2	地下室工程		537 d	2024/1/15	2025/7/12	
213	上部鋼構吊裝作業		184 d	2025/6/11	2025/12/11	
214	第一區1~5line鋼構吊裝440塔吊		159 d	2025/6/11	2025/11/16	
215	塔吊安檢及核發(6/27取得合格證)		17 d	2025/6/11	2025/6/27	
216	#4 1~5/D~G line		9 d	2025/6/28	2025/7/6	215
217	校正及鎖斷		2 d	2025/7/7	2025/7/8	216
218	電鉗		14 d	2025/7/9	2025/7/22	217
219	#5 1~5/D~G line (遇雨延後5天)		14 d	2025/7/9	2025/7/22	217
220	校正及鎖斷		2 d	2025/7/23	2025/7/24	219
221	電鉗		14 d	2025/7/25	2025/8/7	220
222	#6 1~5/A~G line		21 d	2025/7/25	2025/8/14	220
223	校正及鎖斷		2 d	2025/8/15	2025/8/16	222
224	電鉗		14 d	2025/8/17	2025/8/30	223
225	#7 1~5/A~G line		18 d	2025/8/17	2025/9/3	223
226	校正及鎖斷		2 d	2025/9/4	2025/9/5	225
227	電鉗		14 d	2025/9/6	2025/9/19	226
228	#8 1~5/A~G line		23 d	2025/9/6	2025/9/28	226
229	校正及鎖斷		2 d	2025/9/29	2025/9/30	228
230	電鉗		14 d	2025/10/1	2025/10/14	229
231	#9 1~5/A~G line		21 d	2025/10/1	2025/10/21	229
232	校正及鎖斷		2 d	2025/10/22	2025/10/23	231
233	電鉗		14 d	2025/10/24	2025/11/6	232
234	#10 1~5/A~G line		8 d	2025/10/24	2025/10/31	232
235	校正及鎖斷		2 d	2025/11/1	2025/11/2	234
236	電鉗		14 d	2025/11/3	2025/11/16	235
237	第二區6~10line鋼構吊裝600塔吊		168 d	2025/6/27	2025/12/11	
238	塔吊安檢及核發(7/18取得合格證)		22 d	2025/6/27	2025/7/18	
239	#4 5~10/D~G line		13 d	2025/7/19	2025/7/31	238
240	校正及鎖斷		2 d	2025/8/1	2025/8/2	239
241	電鉗		14 d	2025/8/3	2025/8/16	240
242	#5 5~10/D~G line		13 d	2025/8/3	2025/8/15	240
243	校正及鎖斷		2 d	2025/8/16	2025/8/17	242
244	電鉗		14 d	2025/8/18	2025/8/31	243
245	#6 5~10/D~G line		23 d	2025/8/18	2025/9/9	243
246	校正及鎖斷		2 d	2025/9/10	2025/9/11	245
247	電鉗		14 d	2025/9/12	2025/9/25	246
248	#7 5~10/D~G line		21 d	2025/9/12	2025/10/2	246
249	校正及鎖斷		2 d	2025/10/3	2025/10/4	248
250	電鉗		14 d	2025/10/5	2025/10/18	249
251	#8 5~10/D~G line		20 d	2025/10/5	2025/10/24	249
252	校正及鎖斷		2 d	2025/10/25	2025/10/26	251

(2025.07-2025.09)三月施工進度表

營造廠商:麗明營造股份有限公司

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2025/07/27

(2025/08~2025/10)工期整體預定進度表

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	2025年8月			2025年9月			2025年10月			2025年11月			2025年12月		
							上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
253		電銲	14 d	2025/10/27	2025/11/9	252										10/27	電銲	11/9			
254		#9 5~10/D~G line	20 d	2025/10/27	2025/11/15	252										10/27	#9 5~10/D~G line	11/15			
255		校正及鎖斷	2 d	2025/11/16	2025/11/17	254											11/16	校正及鎖斷	11/17		
256		電銲	14 d	2025/11/18	2025/12/1	255											11/18	電銲	12/1		
257		#10 5~10/D~G line	8 d	2025/11/18	2025/11/25	255											11/18	#10 5~10/D~G line	11/25		
258		校正及鎖斷	2 d	2025/11/26	2025/11/27	257											11/26	校正及鎖斷	11/27		
259		電銲	14 d	2025/11/28	2025/12/11	258											11/28	電銲	12/11		
260		上部結構工程	434 d	2025/8/18	2026/10/29																

參、上週工程施工照片



說明：工地空拍照。



說明：鋼構焊接作業。



說明：1F line H,6-7車道梁版鋼筋綁紮。



說明：地下室牆面打底粉刷。

參、上週工程施工照片



說明：1F line H,6-7車道預埋配管施作。



說明：1F line H,6-7車道預埋配管施作。



說明：院區動線施。



說明：地下室拉線作業。

簡報結束，謝謝
