

臺中榮民總醫院

第三醫療大樓新建工程

07月月會暨第286次專業技術協調會

會議紀錄

壹、會議時間：115 年 07 月 7 日(星期二) 下午 03 時 00 分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李政鴻 副院長

紀錄：江意萱

肆、出(列)席單位及人員：詳簽到表

壹、專案管理單位報告：略(請參考專管單位簡報內容)

貳、施工單位報告：略(請參考施工單位簡報內容)

參、會議紀錄 討論事項

【工程進度】

- 截至 115 年 7 月 5 日止，使用工期：1264 日曆天(不含免計工期 16 天)，剩餘 617 日曆天(展延工期 31 天)。
- 工程進度截至 115 年 7 月 5 日，預定進度 24.061%，實際進度 37.836%，超前進度：13.775%(約超前 131 天)。
- 期程規劃：

結構主要徑	網圖預定完成日期	實際趕進日期	差異天數	備註
結構體工程	115/11/20			承商趕趕中

依據施工網圖要徑預定施作項目：結構體工程。

- 施工現況報告：
 1. 土建工程：13F 外牆包柱、R1F 梯廳頂板鋼筋綁紮、10F 西南側外牆立模、9FL 鋼梁防火披覆噴塗、輕隔間 B1F 診間岩棉填塞及雙面封版。
 2. 機電工程：13F 外牆包柱、R1F 梯廳頂板鋼筋綁紮、10F 西南側外牆立模、9FL 鋼梁防火披覆噴塗、輕隔間 B1F 診間岩棉填塞及雙面封版。
 3. 安全監測：數據無異常。

【討論事項】

1. 工程進度：經施工單位說明，目前施工進度主要為 B2F~B1F 配合變更設計修改隔間；1F、3F(含夾層)、5F 輕隔間施作、9F 防火被覆噴塗、1F 北側外擴區土方開挖及外運，工程進度超前中。

2. 其他：

(1) 院部會議紀錄：

115/06/25：請依規劃期程賡續辦理。

(2) 建照變更/都審變更等相關流程：臺中市政府已於 115/06/10 召開都審會議(本案為第一次變更)，本案審查結果為修正後通過，經設計單位說明，已依本案最新樓層平面圖提出交通影響評估變更設計申請，後續變更內容將合併於都審報告書修正版提送。

另第四次建照變更須待都審通過後始得接續辦理。

(3) ICU 電控玻璃：已於 115/07/02 邀集院部長官及使用單位共同研討，院部長官已協調護理部與相關科室，並指示依此辦理(決議詳後簡報 P.4)，經主席同意辦理。

(4) 鉛玻璃膠合方式：

A. 依銘建(榮)字第 1150630002 號，專管單位同意審定施工單位提出之「5mmPb 鉛玻璃(2mmPb+3mmPb 膠合鉛玻璃)膠合方式建議案」(經設計監造單位審查同意)。

本次會議由設計監造單位再次說明，本案原設計採用單片式 5mmPb 鉛玻璃，惟考量目前市面多數廠商未生產該規格產品，為確保後續材料供應穩定性及維持產品規格標準化，且採用 2mmPb+3mmPb 膠合鉛玻璃方式經檢核仍符合原設計鉛屏蔽性能要求，故建議同意採用該替代方式辦理。

B. 經主席裁示，本案既經設計監造單位完成專業審查確認無誤，原則同意採用上述方式辦理；惟仍請施工單位於後續施作過程中，確保材料性能符合要求，並確實達成輻射屏蔽效果，以維護使用人員安全。

(5) 空橋範圍內管線遷移：施工單位已於 115/07/05 完成光纖管線遷移所需預留空間之相關前置施工作業，後續作業如下說明。

A. 經資訊室說明，已於 115/07/02 會同各電信業者至現場辦理會勘，後續將持續協調各業者於 115/07/20 前完成管線遷移作業，以利本案後續施工推進。

B. 經主席裁示，請資訊室協助與各電信業者溝通協調，相關遷移作業儘量安排於周日辦理，以降低對院方門診及資訊系統運作之影響；另請資訊室同步將最新辦理進度回報工務室，以利後續施工期程安排。

(6) 福順路打通：

A. 經總務室說明，因應福順路開闢工程辦理會勘事宜，目前研議於本案周邊設置

紅綠燈號誌，惟考量該設置方案可能影響周邊交通動線及道路通行效率，恐造成交通壅塞情形。

- B. 經主席裁示，請各相關單位共同研議、進行分析及因應改善建議方案，並彙整相關意見後函送交通局研議，以確保後續交通規劃之妥適性。

肆、會議結論：

請施工單位依契約規定及相關圖說如期如質施作，請監造單位督促施工單位如期完成應辦事項，另請設計單位盡速辦理變更設計相關事項；請專管單位管控各項進度並落實審核，並針對第三次變更設計之預算進行控管與審視。

伍、散會(下午 03 時 40 分)

陸、會議照片








臺中榮民總醫院
第三醫療大樓新建工程
115年7月份工程月會報暨第286次專業技術協調會
會議簽到表

壹、會議時間：115年7月7日(星期二) 下午3時00分

貳、會議地點：行政大樓 七樓會議室

參、主持人：李副院長 政鴻

肆、出(列)席單位及人員：

臺中榮民總醫院			
副院長			
主任秘書		總務室	
醫工部		醫企部	
資訊室		工務室	
專案管理單位-賴銘昌建築師事務所/亞新工程顧問公司			
			
規劃設計監造單位-譚俊彥建築師事務所/余曉嵐建築師事務所			
			
施工廠商-麗明營造股份有限公司			
			

第三醫療大樓新建工程

115年7月月會暨第286次專業技術協調會

主 辦 單 位 | 臺中榮民總醫院(工務室)

專案管理單位 | 亞新工程顧問公司
賴銘昌建築師事務所

設計監造單位 | 譚俊彥建築師事務所
余曉嵐建築師事務所

施工承攬單位 | 麗明營造股份有限公司

工進說明


工程開工日	112.01.03		
契約規定工期	1850日曆天(依據112年6月19日中榮工字第129917378號函，縮減30天)		
契約完工日期	117.03.21 (含展延工期)		
使用工期 (截至115.07.05止)	1264日曆天(不含免計工期16天)，剩餘 <u>617</u> 日曆天(展延工期31天)		
工程進度 (截至115.07.05止)	預計：24.061% 實際：37.836%	進度差	+13.775% (約超前131天)
目前工程施作項目	① 土建工程：13F外牆包柱、R1F梯廳頂板鋼筋綁紮、10F西南側外牆立模、9FL鋼梁防火披覆噴塗、輕隔間B1F診間岩棉填塞及雙面封版 ② 機電工程：水電B2F lineA-E/2-8 照明、插座拉線、空調B2風管安裝、消防12F頂版 Line A-D/5-6火警探測器預埋配管、弱電R1F line A-D/5-6預埋配管 ③ 安全監測：數據無異常		



工程進度檢討


臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程-施工進度網圖(第二次進版)

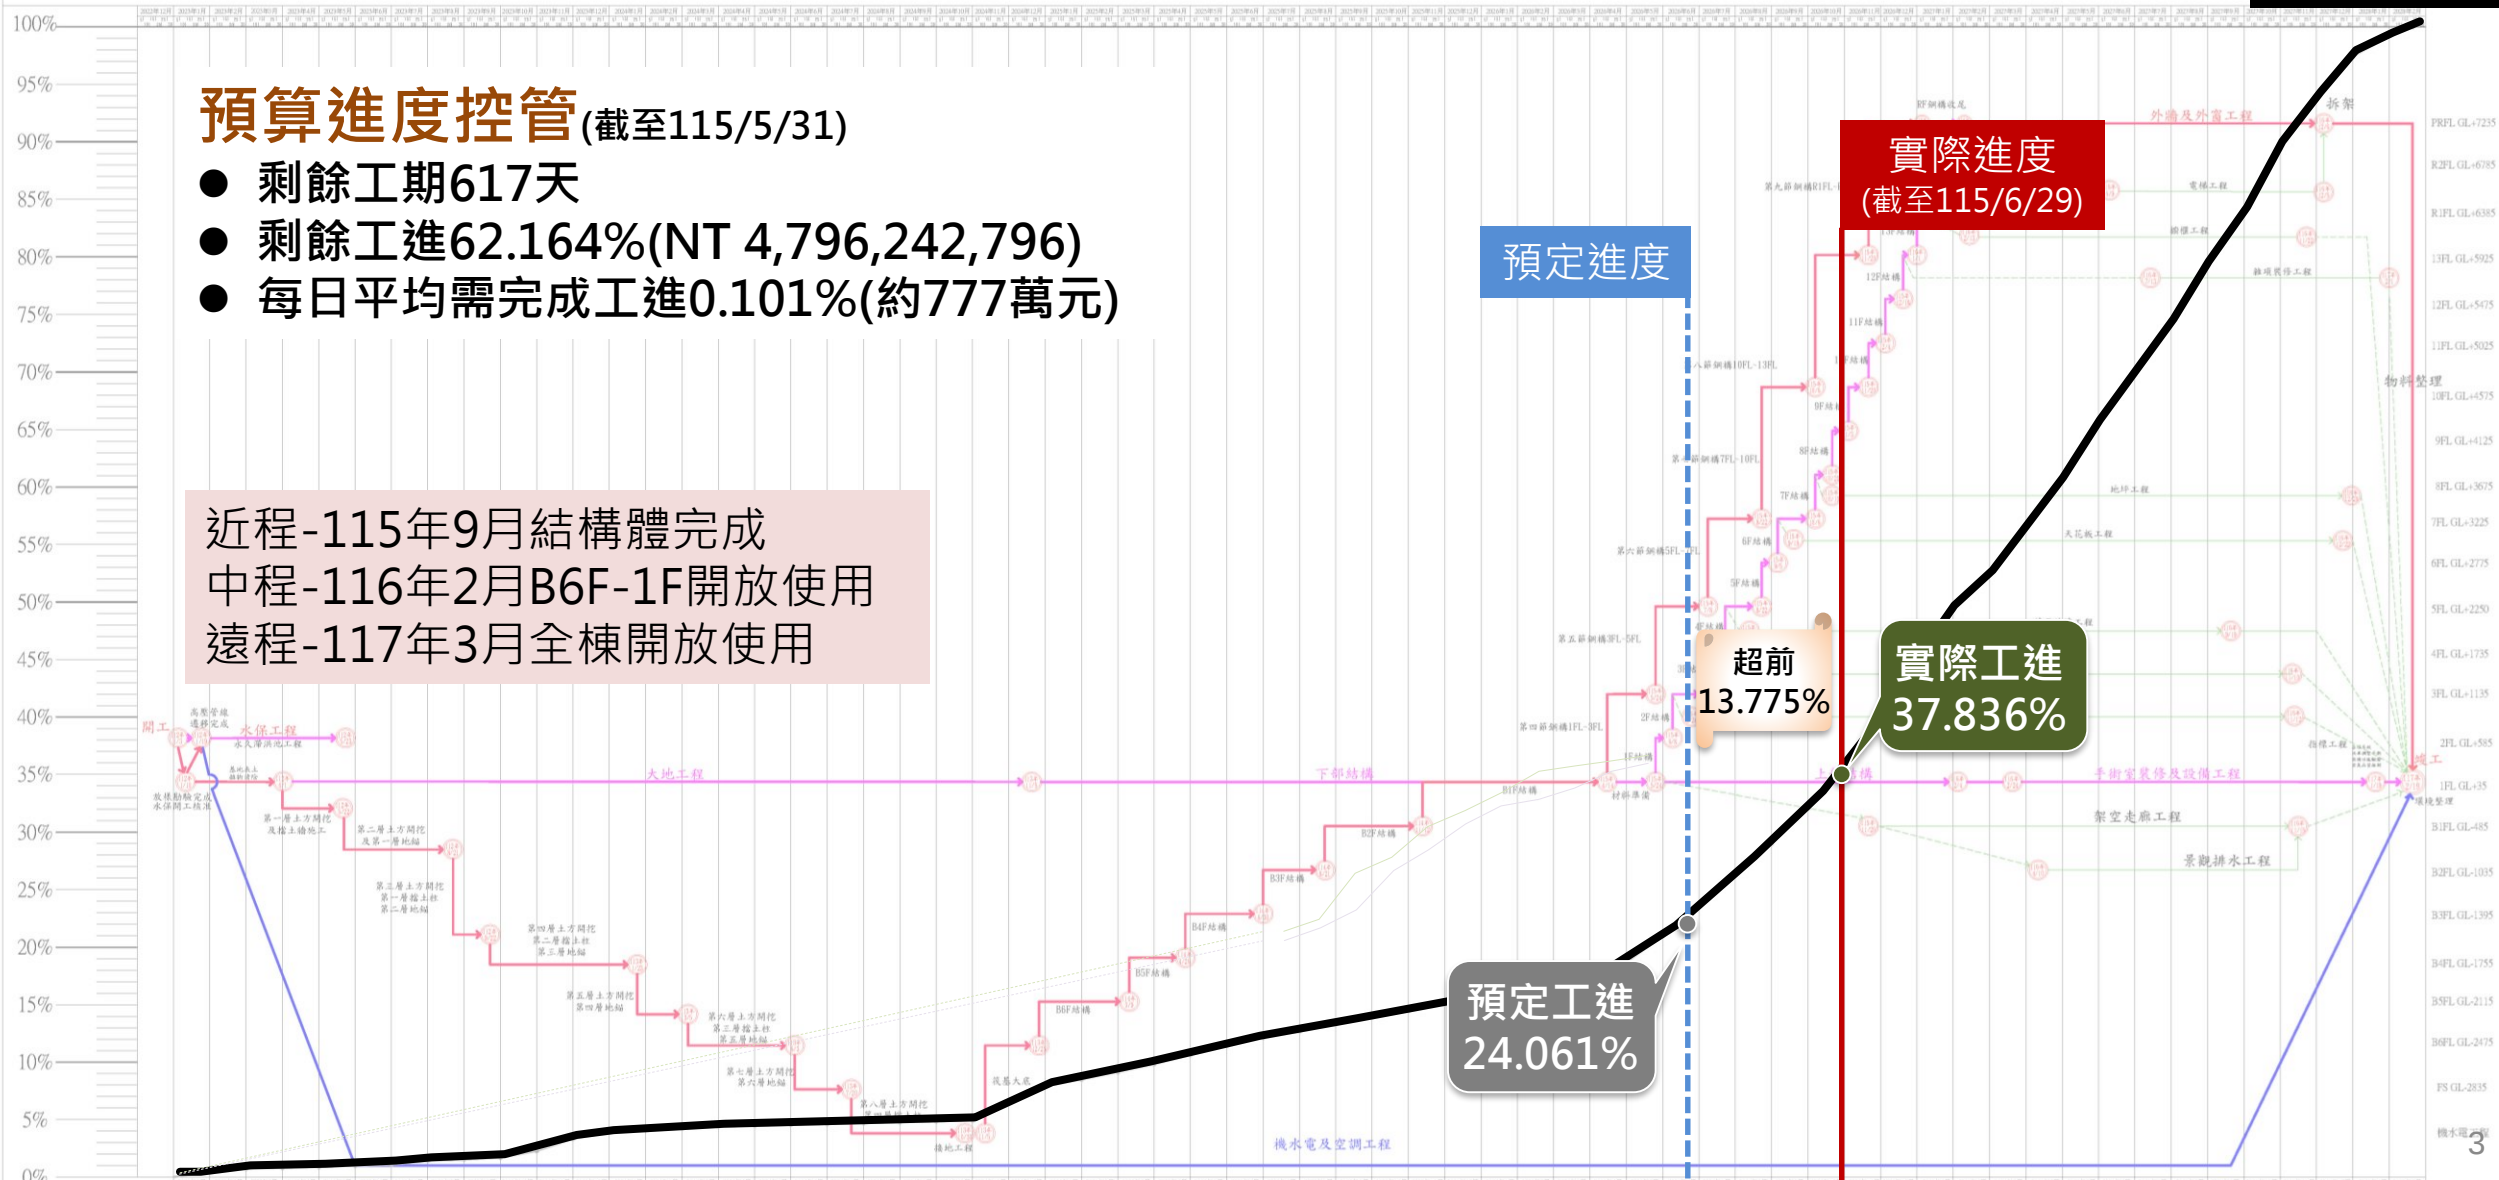預定竣工日
 117.03.21



進度追蹤

事項	辦況說明
建照變更 都審變更	1. 設計單位已著手準備第四次建照變更相關文件。 2. 第四次建照變更作業資料，院方已用印完成，待施工單位結構體勘驗完成後即可啟動程序。 3. 衛生局要求隔間及面積只要有任何變更，都需要辦理擴建計畫變更，否則不會同意建照變更。 4. 於115/06/10參與臺中市政府都市設計審議委員會(本案為都審第一次變更)，本案為「修正後通過」：目前設計單位正依配合最新平面圖，申請交通影響評估變更設計，預計115/07/06掛件；待都審通過後接續辦理第四次建照變更。
樓層配置 變更	■ 管制設計單位於115/07/07(二)前提送各樓層相關細部圖說(含裝修、機電、空調)。
工程查核 缺失改善報告	1. 本案於115/06/16進行第四次工程查核。 2. 請施工/設計監造單位於115/07/10前提送至專管單位審查，專管將於115/07/14前發文提送至院方。
ICU電控玻璃	■ 已於115/07/02邀集院部長官及使用單位共同研討，決議如下： 1. 編號IW7觀察窗保留，並改為電控玻璃且適當縮減觀察窗尺寸；另主席建議得評估採用不同色系之電控玻璃，以提升與周邊牆面之辨識度及整體視覺效果。 2. 編號IW28觀察窗取消設置電控玻璃及複層內嵌百葉，並於病房內增設隔簾，以兼顧醫療照護需求及病人隱私維護。 3. 病房拉門採局部霧面貼膜方式辦理。
院部會議紀錄	■ 115/06/25 1. 請依規劃期程廣續辦理。

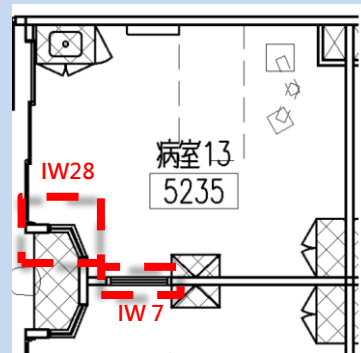

議題討論①-空橋範圍內光纖管線遷移



- 施工單位已於115/07/05完成光纖管線遷移所需預留空間之相關前置施工作業，以利後續業者辦理管線遷移。
- 請資訊室協助說明業者管線遷移作業之預定期程。

職安衛安全管理

職安衛安全管理

1	請施工團隊持續落實施工人員安全防護措施(安全帽、背負式安全帶、反光背心等)之配戴使用，維持施工紀律確保施工安全。
2	本工程契約規定，工程期間涉及施工安全性與結構工程作業，辦理施工抽查時應有駐地技師會同並共同監督按圖施工、解決專業技術問題、檢視是否有公共危險之虞。
3	請施工團隊落實要求高空作業車作業時應確實使用安全帶及安全帽，避免因重心失穩墜落造成重大職業災害。
4	民國115年7月1日起，正式施行最新修正之《職業安全衛生法》部分條文，包含營造工程源頭防災、擴大承攬管理/設備/場所出租出借危害告知等，請施工團隊嚴格遵守法規。
5	受日前降雨影響工區內仍有部分區域較為潮濕或有積水現象，請加強用電安全檢查及感電預防作業，落實電動手工機具之漏電檢測及使用延長線之安全管理，避免危害。

請設計監造單位接續簡報~
謝謝

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年8月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 審查中	專管 核定中	機關 備查中		
分項施工計畫	127	123	0	2	0	121	0
1. 「施工架計畫(外牆架及高度5公尺以上室內架)(進版)」：專管：銘建(榮)字第1150617004號函核定 院方：中榮工字第1159918756號函備查 本項解管							
2. 「UPS不斷電系統工程」：麗明：麗字第1150629002號函提送 監造：譚余中榮字第1150600214號函審查合宜 專管：核定中							
3. 「純水系統工程分項施工計畫」：(管制提送時間：7月10日)							
4. 「太陽能光電工程工程分項施工計畫」：(管制提送時間：7月20日)							
5. 「NOVEC氣體自動滅火設備工程分項施工計畫」：(管制提送時間：8月10日)							
6. 「防火阻絕工程分項施工計畫」：(管制提送時間：8月10日)							
項 目	應提送	已提送	審 查 中			已核定	逾期送審
			監造 審查中	專管 審定中	機關 核定中		
材料/設備送審	173	170	1	2	1	166	0
1. 「弱電材料(資訊插座、收容箱)」：院方：中榮工字第1150301590號函審退(管制7月7日前重新提送)							
2. 「廚房設備」：院方：中榮工字第1159917506號函核還(重新提送)							
3. 「防撞護牆板」：麗明：麗字第1150300258號函提送 監造：譚余中榮字第1150331002號函審退(申請7月31日前重新提送)							
4. 「抗菌工業地坪」：監造：譚余中榮字第1150629005號函審查合宜 專管：銘建(榮)字第1150701007號審定 院方：：核定中							
5. 「空調-自動控制工程」：專管：銘建(榮)字第1150622005號審定 院方：中榮工字第1159918920號函核定 本項解管							
6. 「負壓污水坑前處理系統」：專管：銘建(榮)字第1150623003號審定 院方：中榮工字第1159918926號函核定 本項解管							
7. 「純水設備及配管工程」：麗明：麗字第1150600224號函提送 監造：譚余中榮字第1150629001號函審查合宜 專管：審定中							
8. 「刮泥地墊」：麗明：麗字第1150700038號函提送 監造：譚余中榮字第1150703001號函審查合宜 專管：審定中							
9. 「空調-防火阻絕材料」：(管制提送時間：8月10日)							

分項計畫/材料設備送審/施工圖提送辦理情形

資料統計時間：自112年1月3日起，管制至115年8月31日止

項 目	應提送	已提送	審 查 中			已備查	逾期送審
			監造 核定中	專管 備查中	機關 備查中		
施工圖	96	96	0	0	0	96	0
無管制項目。							

請施工單位接續簡報~
謝謝

壹、本週及下週施工作業說明

本週(115年7月6日~115年7月12日)工程施工作業

1. 10F~R1F內、外牆鋼筋綁紮及模板組立。
2. B2F~B1F配合變更設計修改隔間；1F、3F(含夾層)、5F輕隔間施作。
3. 9F防火被覆噴塗。
4. 4F~5F外牆泥作吊線工程、1F花台泥作打底、樓梯批土油漆工程。
5. 1F北側外擴區土方開挖及外運、空橋基礎開挖工程。

下週(115年7月13日~115年7月19日)預定施工作業

1. 10F~R1F內、外牆鋼筋綁紮及模板組立。
2. B2F~B1F配合變更設計修改隔間；1F、3F(含夾層)、5F輕隔間施作。
3. 9F防火被覆噴塗。
4. 6F~7F外牆泥作吊線工程、樓梯批土油漆工程。
5. 1F北側外擴區土方開挖及外運、空橋基礎開挖工程。
6. 電扶梯安裝工程。

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 6 ~ 115 / 7																			備註		
		預定進度 	實際進度 		上週進度							本週進度							下週進度							
					6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17		7/18	7/19
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五		六	日
一、	地上層裝修及結構工程	開始時間 114/3/27	完成時間 114/11/30	249																					B2F~4F及6F~7F裝修變更設計中	
1	B2F~4F輕隔間立骨架	115/2/13 115/3/6	115/3/9	25																					B2F雙面封版、岩棉填塞、B1F診間岩棉填塞及雙面封版、1F批土、3F夾層區域雙面封版及單面封版	
2	5F~9F輕隔間立骨架	115/5/18 115/5/18	115/7/31	75																					5F止水墩施工中	
3	9F~RF內外牆鋼筋綁紮及混凝土澆置。	115/4/20 115/4/20	115/8/18	121																					10F~R1F鋼筋及模板組立作業	
4	B6F~7F室內牆面打底粉刷	115/4/20 115/4/20	115/6/18	60																					5F~1F地下室B樓梯油漆批土，1F~5FA梯研磨整平	
5	1F~RF外牆泥作及貼磚	115/5/22 115/5/22	115/12/31	224																					1F西南側花台外部泥作打底、東側1F~10F泥作吊線	
6	空橋基樁開挖	115/3/21 115/3/21	115/12/31	286																					空橋工程-基礎開挖X3-1~X3-2, Y1~Y2	
7	1F北側外擴區擋土鋼樁、開挖及地錨施作	115/6/23 115/6/23	115/8/31	70																					6/29已完成打樁工程，目前開挖中	
8	外牆防水工程	115/4/17 115/4/17	115/8/31	137																					4F~5F外窗框及地下室腹壁等水溝防水已完成，待外牆吊線完成後繼續施工	
9	8F~RF防火被覆工程	115/6/11 115/6/11	115/9/30	112																					9F防火被覆施作	

貳、三週施工進度表

業主:臺中榮民總醫院
專案管理:賴銘昌建築師事務所、亞新工程顧問(股)公司
設計監造:譚俊彥、余曉嵐建築師事務所
承包商:麗明營造股份有限公司

臺中榮總第三醫療大樓新建工程
三週進度表

編號	日期 三週進度 綱圖時程 作業內容	起始日	完成日	天數	115 / 6 ~ 115 / 7																			備註			
		預定進度			上週進度							本週進度							下週進度								
					6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17		7/18	7/19	
					一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五		六	日	
二、	地上層至5層機電工程	開始時間	完成時間																						B2F、B1F部分變更設計中		
	地下室機電工程(B2F-B1F)	115/3/1	116/4/30	426																							
		115/5/1	115/8/15	107																							
1	3F-4F消防水管、排煙配管	115/5/11	115/7/17	68																							
		115/5/11																									
2	B2F-1F照明管路拉線	115/6/22	115/7/17	26																							
		115/6/22																									
3	5F空調配管施作(風管、水管)	115/6/22	115/8/8	48																					風管吊架施作		
		115/6/22																									
4	B3F-B2F排水管路調整	115/6/18	115/7/17	30																					B2F、B1F變更修改(Line 6-10)		
		115/6/18																									
5	2F-4F隔間配管 (水電、弱電、消防、空調、氣體)	115/6/18	115/8/7	51																							
		115/6/18																									
6	5F消防水、排煙風管施作	115/6/29	115/8/15	48																							
		115/6/29																									
7	B2F~1F空調、消防管路銜接	115/7/6	115/9/4	61																					輕隔間雙面封板後施作		
		115/7/6																									
7	B2F~1F電氣、弱電、給水管路銜接	115/7/13	115/9/11	61																					輕隔間雙面封板後施作		
6	B1F排水管路調整	115/7/13	115/7/28	16																							
附註：																											

(2026.07-2026.10)三月施工進度表

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程

2026/07~2026/10預定進度表

製表日期:2026/06/25

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	實際完成時間	資源名稱	2026年									
									一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
1	1	結構體	142 d?	2026/2/27	2026/7/18		NA											
2		南區3F外牆	12 d	2026/3/14	2026/3/25		NA											
10		12FL_版RC	1 d	2026/3/18	2026/3/18		NA											
14		13FL_5塊板	32 d	2026/2/27	2026/3/30		NA											
21		14FL	71 d	2026/3/31	2026/6/9		NA											
30		水箱	21 d	2026/6/10	2026/6/30		NA											
40		外牆	15 d	2026/7/1	2026/7/15		NA											
48		內牆	36 d	2026/5/14	2026/6/18		NA											
49		11F	15 d	2026/5/14	2026/5/28		NA											
50	2	12F	12 d	2026/5/29	2026/6/18	49	2026/6/18											
51		西邊	120 d	2026/2/27	2026/6/26		NA	A 組										
52		3F RC	1 d	2026/2/27	2026/2/27		NA											
53		4F	10 d	2026/3/15	2026/3/24		NA											
58		5F	13 d	2026/3/25	2026/4/6		NA											
63		6F	12 d	2026/4/7	2026/4/18		NA											
68		7F	19 d	2026/4/17	2026/5/5		NA											
73		8F	10 d	2026/4/30	2026/5/9		NA											
78		9F	14 d	2026/5/10	2026/5/23		NA											
83		10F	14 d	2026/5/24	2026/6/6		NA											
88		11F	28 d	2026/5/27	2026/6/23		NA											
93		12F	31 d	2026/5/27	2026/6/26		NA											
98		東邊	100 d	2026/3/11	2026/6/18		NA											
99		5F	22 d	2026/3/11	2026/4/1		NA											
104		6F	15 d	2026/3/20	2026/4/3		NA											
109		7F	12 d	2026/4/4	2026/4/15		NA											
114		8F	12 d	2026/4/16	2026/4/27		NA											
119		9F	12 d	2026/4/28	2026/5/9		NA											
124		10F	12 d	2026/5/10	2026/5/21		NA											
129		11F	12 d	2026/5/22	2026/6/2		NA											
134		12F	16 d	2026/6/3	2026/6/18		NA											
139		東南邊	87 d	2026/4/23	2026/7/18		NA											
140		5F	34 d	2026/4/23	2026/5/26		2026/5/26											
141		6F	9 d	2026/5/27	2026/6/4	140	2026/6/4											
142		7F	13 d	2026/6/5	2026/6/17	141	2026/6/17											
143		8F	7 d	2026/6/18	2026/6/24	142	2026/6/24											
144		9F	6 d	2026/6/25	2026/6/30	143	NA											
145		10F	6 d	2026/7/1	2026/7/6	144	NA											
146		11F	6 d	2026/7/7	2026/7/12	145	NA											
147		12F	6 d	2026/7/13	2026/7/18	146	NA											
148		北邊結構體	123 d?	2026/2/27	2026/6/29		NA											
149		H型鋼打設	10 d	2026/6/20	2026/6/29		NA											
150		土方第1次降挖	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA											
151		地錨	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA											
152		土方第2次降挖GL-2.3	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA											
153		基礎及地梁	1 d?	2026/6/20	2026/6/20		NA											
156		1F結構	0 d	2026/2/27	2026/2/27		NA											
167		外牆工程	88 d	2026/6/13	2026/9/8		NA											
168		東邊6F~10F	66 d	2026/6/13	2026/8/17		NA											
169		打石及樓層接縫	5 d	2026/6/13	2026/6/17		NA											
170		吊線	1 d	2026/6/18	2026/6/18	169	NA											
171		窗框組立及坎縫	10 d	2026/6/19	2026/6/28	170	NA											
172		窗框防水	10 d	2026/6/29	2026/7/8	171	NA											
173		防水布施作	3 d	2026/7/9	2026/7/11	172	NA											
174		彈泥	1 d	2026/7/12	2026/7/12	173	NA											
175		吊線及安灰誌	3 d	2026/7/13	2026/7/15	174	NA											
176		益膠泥	1 d	2026/7/16	2026/7/16	175	NA											
177		泥作打底	12 d	2026/7/17	2026/7/28	176	NA											

(2026.07-2026.10)三月施工進度表

臺中榮民總醫院第三醫療大樓新建工程
2026/07~2026/10預定進度表

製表日期:2026/06/25

識別碼	任務模式	任務名稱	工期	開始時間	完成時間	前置任務	實際完成時 間	資源名稱	2026年上半年 一月 二月 三月 四月 五月 六月 2026年下半年 七月 八月 九月 十月									
178		外牆防水	8 d	2026/7/31	2026/8/7	177	NA											
179		外牆貼磚	10 d	2026/8/8	2026/8/17	178	NA											
180		西邊外牆1F~10F	83 d	2026/6/18	2026/9/8		NA											
181		打石及樓層接縫	10 d	2026/6/18	2026/6/27	169	NA											
182		吊線	2 d	2026/6/28	2026/6/29	181	NA											
183		窗框組立及坎縫	21 d	2026/6/30	2026/7/20	182	NA											
184		窗框防水	10 d	2026/7/21	2026/7/30	183	NA											
185		防水布施作	3 d	2026/7/31	2026/8/2	184	NA											
186		彈泥	1 d	2026/8/3	2026/8/3	185	NA											
187		吊線及安灰誌	3 d	2026/8/4	2026/8/6	186	NA											
188		益膠泥	1 d	2026/8/7	2026/8/7	187	NA											
189		泥作打底	12 d	2026/8/8	2026/8/19	188	NA											
190		外牆防水	10 d	2026/8/20	2026/8/29	189	NA											
191		外牆貼磚	10 d	2026/8/30	2026/9/8	190	NA											
192		電梯工程	0 d	2026/2/27	2026/2/27		NA											
193		#5					NA											
194		電扶梯安裝	17 d	2026/7/15	2026/7/31		NA											
195																		
196		3F&3FM整合工程	19 d?	2026/6/17	2026/7/5		NA											
197		圖面檢討完成	1 d	2026/6/17	2026/6/17		NA											
198		空調淨空	1 d	2026/6/17	2026/6/17	197FF	NA											
199		輕隔間施作	3 d	2026/6/18	2026/6/20	198	NA											
200		機電排水	7 d	2026/6/21	2026/6/27	199	NA											
201		空調風管	1 d	2026/6/28	2026/6/28	200	NA											
202		電管配管	1 d	2026/6/29	2026/6/29	201	NA											
203		弱電線槽	1 d	2026/6/30	2026/6/30	202	NA											
204		隔音棉施作	1 d	2026/7/1	2026/7/1	203	NA											
205		空調設備安裝	1 d	2026/7/2	2026/7/2	204	NA											
206		貓道消防撒水及排水	1 d	2026/7/3	2026/7/3	205	NA											
207		電管、AD	1 d	2026/7/4	2026/7/4	206	NA											
208		隔間	1 d	2026/7/5	2026/7/5	207	NA											
209							NA											
210		4F&4FM整合工程	19 d?	2026/7/6	2026/7/24		NA											
211		圖面檢討完成	1 d	2026/7/6	2026/7/6		NA											
212		空調淨空	1 d	2026/7/6	2026/7/6	211FF	NA											
213		輕隔間施作	3 d	2026/7/7	2026/7/9	212	NA											
214		機電排水	7 d	2026/7/10	2026/7/16	213	NA											
215		空調風管	1 d	2026/7/17	2026/7/17	214	NA											
216		電管配管	1 d	2026/7/18	2026/7/18	215	NA											
217		弱電線槽	1 d	2026/7/19	2026/7/19	216	NA											
218		隔音棉施作	1 d	2026/7/20	2026/7/20	217	NA											
219		空調設備安裝	1 d	2026/7/21	2026/7/21	218	NA											
220		消防撒水及排水	1 d	2026/7/22	2026/7/22	219	NA											
221		電管、AD	1 d	2026/7/23	2026/7/23	220	NA											
222		隔間	1 d	2026/7/24	2026/7/24	221	NA											
223							NA											

備註：現階段預定進度排程至9月份，待後續變更設計圖說頒佈核定再行研擬更新進度表。

參、上週工程施工照片



說明：鋼柱清洗。



說明：鋼筋綁紮。



說明：輕隔間封板作業。



說明：空橋基礎開挖X3-1~X3-2,Y1~Y2。

參、上週工程施工照片



說明：擋土設施-北側擋土鋼樁施作。



說明：第一次土方開挖之原面層破碎掘除。



說明：預埋配管設置。



說明：排水配管。

簡報結束，謝謝
